



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Tomáš Škaryd			
Schváleno:	RK	Datum:	3. 7. 2012	Č.usnesení: 1202/26/2012/RK
Dokument uložen u:	OPKŽU			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	A.M.O.S. DESIGN s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	35516397.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu			
Podpis zajistit do:	26.9.2012			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OKPPCR/Prokešová	20. 9. 2012	<i>Prokešová</i>
Projednáno s:	OKPPCR/Lisá	21. 9. 2012	<i>Lisá</i>
Právní kontrola:	OKPPCR/Jiráková	20. 9. 2012	<i>Jiráková</i>
Předkládá:	OKPPCR/Prokešová	20. 9. 2012	<i>Prokešová</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OKPPCR/Lisá	21. 9. 2012	<i>Lisá</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OKPPCR/Lisá	21. 9. 2012
	Správce rozpočtu:	OE/Zemanová	21. 9. 2012

Poznámka:

Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč. Jedná se o dílo prováděné v rámci realizace projektu "Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic".

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.


3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP00X9DYR



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysočina

8490/12

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,
na provedení díla

**KOMPLEXNÍ REALIZACE A DODÁVKA STÁLÉ EXPOZICE
VČETNĚ NÁPLNÍ AV TECHNIKY A VEŘEJNÉHO INTERIÉRU
NA ZÁMKU TŘEBÍČ**

I. Smluvní strany

Objednatel:

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Volksbank CZ a.s.
číslo účtu 4200160699/6800
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Tomáš Škaryd, člen rady kraje


(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

A.M.O.S. DESIGN s.r.o.
se sídlem Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
IČO: 63479982
DIČ: CZ63479982
zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Krajským soudem oddíl C, vl. 20782
bankovní spojení: KB Brno-venkov
číslo účtu 1118930267/0100
zastoupený Ing. Arch. Vladimírem Ambrozem

(dále jen „zhotovitel“)



uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

OBSAH

I.	Smluvní strany	1
II.	Předmět smlouvy	3
III.	Doba plnění	4
IV.	Cena díla	5
V.	Platební podmínky, fakturace	6
VI.	Pojištění	7
VII.	Pracoviště – prostor expozice a veřejného interiéru	8
VIII.	Způsob provádění díla	9
IX.	Pokyny objednatele k provedení díla	11
X.	Technický dozor	12
XI.	Kontrola provádění díla	13
XII.	Deník provádění díla	14
XIII.	Předání a převzetí díla	15
XIV.	Ochrana nehmotných statků	17
XV.	Nebezpečí škody na díle	17
XVI.	Smluvní pokuty	17
XVII.	Záruky	18
XVIII.	Povinnost mlčenlivosti	19
XIX.	Bezpečnost a ochrana zdraví	20
XX.	Zkoušky	20
XXI.	Odstoupení od smlouvy	21
XXII.	Vyšší moc	22
XXIII.	Oprávněné osoby, doručování, formy právních úkonů	23
XXIV.	Platnost a účinnost smlouvy	24
XXV.	Závěrečná ustanovení	24



Článek II. Předmět smlouvy

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky v otevřeném zadávacím řízení vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 30. 3. 2012, evidenční číslo zakázky 7202011012074.
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč**“ tak, jak je specifikováno v této smlouvě včetně jejich příloh.
Dílo bude realizováno na základě projektu společnosti G.L.ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem 5. máje 562/26, 155 00 Praha, IČO: 267 46 999, jež je kolektivním autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. V plnění předmětu veřejné zakázky je zahrnuta veškerá koordinační činnost zhotovitele při uvedení díla do provozu. Zhotovitel je povinen své práce a dodávky koordinovat s objednatelem, jež již realizuje v současné době rekonstrukci komplexu zámeckého areálu v Třebíči, případně s dalšími subjekty určenými objednatelem.
3. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění akustické analýzy prostoru.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit autorská a provozovací práva k obsahu AV programu včetně oprávnění upravovat objednatelem obsah.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.
6. Zhotovitel bere na vědomí informaci, že dílo je součástí realizace projektu objednatele s názvem „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a tím i specifika uvolňování finančních prostředků při proplácení výdajů.
7. V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi projektu provedení díla - platí, že :
 - a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.
8. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.




Článek III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2, přičemž zhotovitel musí dodržet zejména tyto termíny:
 - termín zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy
 - termín převzetí prostoru expozic a veřejných interiérů podle časového harmonogramu: nejpozději 1. 4. 2013 (za účelem instalace prvků potřebných pro finální dokončení stavby a zahájení kolaudačního řízení stavby objednatel zhotoviteli umožní vstup na staveniště v období od 15. 1. 2013 do 31. 3. 2013)
 - zahájení zkušebního provozu: nejpozději od 2. 9. 2013
 - termín ukončení díla: nejpozději 30. 9. 2013, s výjimkou částí expozic a veřejných interiérů (především s označením VEM 1.19/1, VEM 1.19/3, VEM 1.08/1), které musí být ukončeny nejpozději 31. 1. 2013, tj. před zahájením kolaudačního řízení
 - termín předání ukončeného díla: nejpozději 30. 9. 2013

Tyto termíny mohou být upřesněny na základě postupu stavby a aktualizace jejího časového harmonogramu. Uchazeč je povinen akceptovat tyto upravené termíny.

2. Nesplnění každého termínu stanoveného dle odst. 1. tohoto článku je postiženo smluvními pokutami dle článku XVI. smlouvy.
3. Jestliže z důvodů zaviněných objednatelem nebude objektivně možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1, je zhotovitel povinen zahájit práce do 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým harmonogramem postupu provedení díla, prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, na základě kterého bude poté smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlouží.
5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po písemném odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.




Článek IV. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 35 516 397,- Kč včetně DPH 20 % (slovy: třicet pět milionů pět set šestnáct tisíc tři sta devadesát sedm korun českých) při splnění podmínek uvedených v tomto článku jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době vystavení daňového dokladu.

Cena celkem bez DPH:	29 596 997,55 Kč
DPH 14 %:	
DPH 20 %:	5 919 399,50 Kč
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH:	35 516 397,00 Kč


2. Celková smluvní cena díla je stanovena obsahem zadávací dokumentace, která je označena jako příloha č. 3 smlouvy a oceněním dle výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je označen jako příloha č. 1 smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady dle předmětu smlouvy a vyplývající ze zadávací dokumentace.
4. Celková cena díla je cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně zadáním veřejné zakázky. Objednatel připouští zvýšení nabídkové ceny pouze v případě, pokud po dobu platnosti smlouvy dojde ke zvýšení sazby DPH.
5. Smluvní cena je pevná a nepřekročitelná po celou dobu platnosti smlouvy.
6. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, vyčištění a závěrečný úklid celého prostoru expozice,
 - b) veškeré náklady na dopravu, stěhování, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - c) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - d) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
 - e) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla,
 - f) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
 - h) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,



- i) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
 - j) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - k) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - l) veškeré náklady na ostrahu díla.
7. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu s touto smlouvou neprovádět. Omezení rozsahu díla a následné úpravy předmětu smlouvy je možné pouze v souladu s § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy, viz článek XXV. odst. 7 smlouvy.

Článek V. Platební podmínky, fakturace


1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky vyplývající z této smlouvy a ze zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.
3. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje z hlediska projektu dle požadavků objednatele. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny osobou objednatele uvedenou v čl. XXIII. na zjišťovacím protokolu – soupis skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě ve formátu .xls. Při fakturování bude zhotovitel používat systém tabulek obsahujících kromě oceněného rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítaná za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat. Stejně budou připravovány i fakturace případných méněprací a víceprací. V případě více a méněprací bude zhotovitel zpracovávat přehledové tabulky s rozpočty a výkazy výměr pro jednotlivé více a méněpráce prokazujícími oprávněnost požadavku. Faktury budou vystaveny do 14 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednavatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.
4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává maximálně na 90 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.



5. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ a registrační číslo projektu CZ.1.11/2.1.00/08.01115.
6. Objednatel jako plátcе daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající též v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy v souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátcе, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek VI. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající předmět plnění jako takový včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo včetně prostor, v nichž je dílo realizováno, v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.
2. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. Pojištění bude uzavřeno společně ve prospěch objednatele i zhotovitele a bude pokrývat případnou škodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv příčiny, a to počínaje zahájením provádění díla a konče převzetím díla a vyklizením a předáním místa plnění.
3. Zhotovitel je dále povinen odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:
 - a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo,
 - b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla (předmětu plnění), která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků.
4. Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch objednatele i zhotovitele, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo škodu způsobenou na životním prostředí činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen doložit objednateli před zahájením plnění předmětu plnění, že byly uzavřeny pojistné smlouvy požadované výše a rozsahu (návrh pojistné smlouvy potvrzený pojišťovnou, předběžné krytí apod.), a do 14 kalendářních dnů ode dne podepsání smlouvy o dílo předložit objednateli plné znění pojistných smluv. Zhotovitel




musí uzavřít všechny pojistné smlouvy, které je povinen uzavřít za podmínek schválených objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojištění krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
8. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
9. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

Článek VII.

Pracoviště - prostor expozic a veřejného interiéru

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostor expozic a veřejného interiéru (dále také „pracoviště“) v termínu dle článku III. odst. 1. smlouvy. O předání bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí pracoviště.
2. Zápis o předání a převzetí pracoviště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - vymezení prostoru stavby, včetně přesného určení tras přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - napojovací body energetických vstupů a inženýrských sítí,
3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na pracovišti a na všech přístupových komunikacích. Je povinen na své náklady neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit pracoviště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na pracoviště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle bodu 4 tohoto článku nebo po předchozím písemném svolení objednatele.




Článek VIII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí dle objednatelům předané zadávací dokumentace, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - c) vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, je povinen zajistit asistenční hlídku,
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provedení díla,
 - g) v případě změny subdodavatele, v dostatečném předstihu předat objednateli k projednání a odsouhlasení seznam všech subdodavatelů, objednatel má právo s uvedenými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na místě realizace jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
3. Závazný harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem bude respektovat veškeré požadavky objednatele týkající se konečného termínu dokončení díla.
4. Vybrané činnosti při realizaci expozice je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
5. Při provedení díla nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti smlouvě, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí písemnými pokyny objednatele.
7. Zhotovitel je povinen při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena a denně čistotu a pořádek na předmětných místech kontrolovat. Zhotovitel nese plnou



odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

8. Zhotovitel je povinen spolehlivě zabezpečit pracoviště a zabezpečit místo provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Všechna tato opatření je zhotovitel povinen předem konzultovat s objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a případně třetích osob. Zhotovitel bude práci těchto třetích osob (dále jen „subdodavatelé“), kteří se budou podílet na provedení díla, řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli.
10. Zhotovitel zodpovídá za bezúhonnost svých zaměstnanců včetně zaměstnanců subdodavatelů. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu objednatele viditelně označen (označen názvem či znakem zhotovitele).
11. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito podle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
13. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k duševnímu vlastnictví v souvislosti s realizací expozice.
14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky platnými v době provedení díla, jakož i dotčenými ČSN, které si smluvní strany stanovují tímto jako závazné.
15. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
16. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení instalovaných v expozici a dodaných zhotovitelem, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
17. Jestliže kterákoliv smluvní strana zjistí v průběhu realizace smlouvy o dílo nové skutečnosti, které nebyly zjistitelné z podkladů předaných objednatelem pro nabídku, především rozdíly mezi prováděcím projektem a projektem, který byl podkladem pro výběrové řízení, informuje smluvní strana druhou stranu neprodleně o zjištění těchto



skutečností. Zhotovitel je pak povinen neprodleně zpracovat "změnový list", ve kterém budou změny popsány.

18. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn.

Článek IX. Pokyny objednatele k provedení díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Jestliže objednatel tyto pokyny nedá, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.
2. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit rozsah díla, změna díla může spočívat v omezení jeho rozsahu. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tato omezení budou sjednána písemnými dodatky jako změny smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.
3. Zhotovitel je povinen komunikovat s objednatelem a osobami jím pověřenými v souvislosti s postupným upřesňováním všech podkladů pro náplň AV médií, které budou vznikat v průběhu tvorby expozice. Zhotovitel musí akceptovat upřesňování zakázky od objednatele.
4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu nebo nesprávnost pokynů k provedení díla, jestliže tuto nevhodnou povahu nebo nesprávnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel musí v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением díla z důvodu nevhodných pokynů objednatele.
5. Pokud objednatel i přes upozornění zhotovitele trvá na provedení díla podle nevhodných nebo nesprávných pokynů podle odstavce 1 tohoto článku, zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými nebo nesprávnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla.
6. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá v celém rozsahu za vady díla, případně nemožnost dokončení díla nebo jiné následky, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
7. Jestliže zhotovitel při provedení díla zjistí velmi závažné skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem dle této smlouvy, je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu



objednateli a navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel je oprávněn provedení díla přerušit do dosažení dohody o změně díla. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

8. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provedení díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci 5 tohoto článku, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. Jestliže zhotovitel porušil svou povinnost zjistit před započatím provedení díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci 5 tohoto článku, odpovídá za škodu tím způsobenou.
9. Zhotovitel je povinen předložit na vyzvání objednatele k odsouhlasení:
 - vzorky jednotlivých typů světél uvedených v části F přílohy č. 1 a přílohy č. 3 této smlouvy;
 - finální verzi dílenské dokumentace pro části B a C uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 3 této smlouvy;
 - finální verze náplní AV medií uvedených v příloze č. 1 a příloze č. 3 této smlouvy;
 - finální verze expoziční a venkovní a orientační grafiky v části D uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 3 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn vznést připomínky k výše uvedeným předloženým částem, a to do 5 dnů od předložení. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a znovu předložit jako celek objednateli k odsouhlasení. Tento proces se opakuje do úplné akceptace předložených částí. Osoba oprávněná k akceptaci za objednatele je uvedena v čl. XXIII. této smlouvy.

Článek X. Technický dozor

1. Objednatel může během provádění díla delegovat část svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami obrátit do 24 hodin přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.



3. Technický dozor na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní zápisem v deníku provádění díla a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
4. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě. V nutném případě, zejména při nebezpečí prodlení, technický dozor může vydat pokyny i ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.
5. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoli pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu technického dozoru. Osoba vyloučená technickým dozorem z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším možném termínu.

Článek XI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola objednatele bude zejména formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Ke stanovení kontrolního dne může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne musí být podán nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou, za kterou se považuje i zápis do deníku. U věcí jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí návrh kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen a zápis do deníku není dostačující. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. Objednatel je povinen vypracovat zápis o průběhu a závěrech kontrolního dne. Zápis podepíše oprávněný zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. Neshodnou-li se smluvní strany, zapíše každá svá stanoviska k průběhu a závěrům kontrolního dne a podepíše je oprávněný zástupci obou stran. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
3. Objednatel může kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Objednatel je oprávněn vstupovat na stavbu a do všech prostor, kde se provádí dílo nebo činnosti s prováděním díla souvisící. Zhotovitel je povinen objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.



4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
5. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, stanoví k jejich odstranění zhotoviteli v rámci nejbližšího kontrolního dne přiměřenou lhůtu. Délka této lhůty spolu s popisem vady či vad se zapisuje do zápisu z kontrolního dne. Neodstraní-li zhotovitel vadu či vady v této lhůtě, objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v souladu s článkem XV. této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XXI. smlouvy odstoupit.
6. U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotýčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.
7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam v deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu v deníku místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím.

Článek XII. Deník provádění díla


1. Zhotovitel se zavazuje vést deník provádění díla (dále jen „deník“) ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Deník bude uložen u odpovědného pracovníka zhotovitele stále přítomného na pracovišti.
2. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje deník chránit. Deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.



3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy v deníku, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta pěti dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

Článek XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Zhotovitel se zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla minimálně 10 pracovních dní před dokončením díla. Objednatel je povinen na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou ve výše uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla a součástí této prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 4 tohoto článku (ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace).
2. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky (tj. všechny technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení).
3. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.
4. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - c) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN,
 - d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - e) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy,
 - f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních vždy v českém jazyce,
 - g) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
 - h) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
 - i) deník provádění díla,
 - j) deník změn (měn a víceprací) oproti schválené projektové dokumentaci,
 - k) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 4 tohoto článku nebo některý doklad, jež má být její součástí.
6. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak, důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
7. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.
8. O předání a převzetí předávaného díla je zhotovitel povinen sepsat protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - popis předávaného díla,
 - zhodnocení kvality předávaného díla,
 - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - způsoby a lhůty odstranění případných vad a nedodělků,
 - výsledek přejímacího řízení dle bodu 3 a následujících tohoto článku,
 - podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
9. Kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
10. Jestliže objednatel odmítne převzít předávané dílo, pořídí se protokol, v němž se uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal. Dále zde musí být uvedeny důvody odmítnutí převzetí díla. Opakované přejímací řízení lze na základě dohody obou smluvních stran provést pouze v nezbytném rozsahu vymezeném důvody odmítnutí převzetí díla uvedenými v protokolu. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. Jestliže ani v opakovaném přejímacím řízení, objednatel oprávněně nepřevezme předávané dílo, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady.
12. Zhotovitel je povinen provést pro pracovníky určené objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení, nejpozději však do převzetí díla objednatelem.



Článek XIV. Ochrana nehmotných statků


1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných.
2. Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla.
3. Objednatel je oprávněn dílo užit všemi způsoby. Za tímto účelem je objednatel oprávněn dílo dále zpracovávat a upravovat.
4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. V případě, že o udělení podlicence bude požádáno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bude podlicence poskytnuta za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 000 Kč.
5. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo.
6. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.
7. Objednatel není povinen licenci využít.

Článek XV. Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla do doby předání objednateli, nese zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2, zejména zabezpečit střežení místa provedení díla.

Článek XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku.
2. Při prodlení s termínem dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení po dobu prvních 15 kalendářních dnů a 10 000 Kč za každý další kalendářní den prodlení.
3. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit smluvní



pokutu ve výši 2 000 Kč za každou jednotlivou vadu, případně nedodělek a kalendářní den prodlení.

4. Při prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000, Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
6. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny za dílo.
7. Pro uložení smluvních pokut není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla, subdodavatelé.
8. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.
9. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuta se do výše náhrady případně vzniklé škody nezapočítává.

Článek XVII. Záruky


1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách:
 - a) 60 měsíců na stavbu expozice,
 - b) 60 měsíců na strojní a elektrotechnické zařízení nebo jeho části,
 - c) 24 měsíců na ostatní zabudované výrobky a části díla jiných výrobců.
2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci.
3. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po konečném převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamovanou vadu,



- b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě následujícího pracovního dne od uplatnění reklamace vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady.
 8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem. Zhotovitel je povinen přijetí uplatněné vady potvrdit bezodkladně nejdéle do 2 hodin od uplatnění.
 9. Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu a případně výši náhrady škody vzniklé do okamžiku sepsání zápisu.
 10. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce, kterého strany společně vyberou. V případě, že se strany neshodnou na výběru znalce je znalec oprávněn vybrat objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém či obdobném poměru k žádné ze smluvních stran.

Článek XVIII. Povinnost mlčenlivosti

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které jim druhá strana sdělila nebo o nichž se jinak dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi ve smyslu § 271 obchodního zákoníku.



3. Důvěrnými informacemi ve smyslu § 271 obchodního zákoníku nejsou informace, které se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou a informace, které smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní strany.
4. Jestliže jedna smluvní strana udělí předem písemný souhlas druhá smluvní strana je oprávněna obsah smlouvy nebo její části sdělit třetím osobám. Obsah smlouvy může být sdělen pouze v rozsahu tohoto souhlasu.

Článek XIX. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost subdodavatelů.
2. Zhotovitel je povinen zajistit vybavení všech osob vykonávajících činnosti související s provedením díla ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti. Zhotovitel odpovídá za porušení této povinnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob, podílejících se na provedení díla jako subdodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele resp. subdodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit s riziky na místě provedení díla, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
5. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho subdodavatele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.

Článek XX. Zkoušky


1. Zhotovitel je povinen kontrolovat v průběhu provádění díla jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále musí prověřovat doklady



- o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků dle hygienických předpisů, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.
2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
 3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí částí. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. O výsledku zkoušky se sepiše zápis respektive protokol.
 4. Objednatel je oprávněn za úhradu požadovat provedení dodatečných zkoušek potvrzujících kvalitu provedeného díla. V případě, že výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

Článek XXI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, v případě že zhotovitel:
 - a) nezahájí provádění díla do 15 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání pracoviště stanoveným odsouhlaseným harmonogramem uvedeným v příloze č. 2. Rozhodujícím termínem je termín, který nastane dříve,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem v souladu s ustanovením článku XI. odst. 5. smlouvy,
 - c) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této smlouvy neopravňuje,
 - d) je v prodlení delší než 30 kalendářních dnů s dokončením díla,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.



4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany.
5. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost neodvratitelná a nepředvídatelná v době uzavření této smlouvy (okolnost vyšší moci), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 kalendářních dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.
6. Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující smluvní strana.
7. Jestliže zhotovitel odstoupí od této smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 4 tohoto článku nebo kterákoliv ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4 a 5 tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem tohoto protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

Článek XXII. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují překážky, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, je objektivně nepřekonatelná a brání v plnění závazků z této smlouvy.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.




4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

Článek XXIII. Oprávněné osoby, doručování, formy právních úkonů

1. Právní úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v odstavci 2 tohoto článku, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou zmocněné na základě písemné plné moci. Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány jinak rozhodnutím orgánu, který jmenoval či zvolil nové statutární orgány.
2. Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
 - na straně objednatele: koordinátor, jehož jméno sdělí objednatel zhotoviteli ihned po uzavření příslušné smlouvy.
 - na straně zhotovitele: Ing. Arch. Vladimír Ambroz
3. Oznámení o úkonu, jiné oznámení nebo úkon vyžadující písemnou formu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je úkon učiněn faxem, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou.
4. Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresována objednateli bude doručována na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
5. Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresovaná zhotoviteli bude doručována na adresu: A.M.O.S. DESIGN s.r.o., Beethovenova 641/9, 602 00 Brno.
6. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese uvedené v odstavci 4 či 5 tohoto článku s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.
7. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.
8. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání času podle § 122 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysočina

Článek XXIV.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Účinnosti nabývá tato smlouva ke dni platnosti, není-li uvedeno jinak.
2. Pokud rozsah provedení není v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, dohodnou smluvní strany rovněž úpravu příslušných termínů, jež jsou v časovém harmonogramu postupu provedení díla označeny jako závazné a termínu dokončení díla. Vymezení rozsahu provedení, není-li totožný s rozsahem uvedeným v časovém harmonogramu postupu provedení díla, jakož i úprava termínů provedení díla, vyžaduje písemnou formu a bude zpracována jako číslovaný dodatek smlouvy.

XXV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a nahrazuje v plném rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednání nebo úmluvy ve vztahu k předmětu smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě.
2. Jakékoli vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za vzdání se práva vyplývajícího z jakéhokoli následného porušení nebo nedodržení podmínek smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Smluvní strany prohlašují, že neuzavírají smlouvu na základě zastoupení, záruk nebo jiných odměn ze strany jakýchkoli třetích osob, vyjma výslovně stanovených v této smlouvě.
5. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí obchodním zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
6. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
7. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, postupně vzestupně číslovaných, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran. Výjimkou je jednostranné omezení předmětu díla pouze na některou z etap, které může učinit objednatel jednostranně písemným oznámením doručeným druhé straně. Jakékoliv změny v rozsahu díla a následné úpravy předmětu smlouvy jsou možné pouze v souladu s § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysočina

8. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z ustanovení této smlouvy, včetně jejích případných dodatků podle odstavce 7 tohoto článku smlouvy, částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné, anebo ztratí-li tato smlouva nebo kterékoli z ustanovení této smlouvy, včetně jejích případných dodatků podle odstavce 7 tohoto článku smlouvy, následně svou platnost nebo účinnost, ať již tato neplatnost nebo neúčinnost byla prohlášena soudním či jiným úředním rozhodnutím nebo je obecně zjevná pro rozpor se současným či budoucím právem, zavazují se strany neprodleně zahájit jednání a sjednat smlouvu novou nebo tuto smlouvu změnit anebo doplnit tak, aby výsledná nová smlouva nebo tato změněná anebo doplněná smlouva odpovídaly původnímu záměru stran.
9. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
10. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi smlouvy se smluvní strany zavazují postupovat podle odstavců 7 a 8 tohoto článku smlouvy.
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou volné přílohy č. 1 až 3:
 - 1) Zhotovitelem oceněný výkaz výměr, jenž byl součástí jeho nabídky
 - 2) Časový harmonogram postupu provedení díla a platební kalendář
 - 3) Příloha č. 4 a č. 5 Zadávací dokumentace

za objednatele:

za zhotovitele:

V Jihlavě dne 25-09-2012

V Brně dne 26-09-2012

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Tomáš Škaryd
člen Rady Kraje Vysočina

A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.
Beethovenova 641/9, 601 05 Brno
TEL.: 542 212 898, 542 216 618
FAX: 542 214 439, DIČ: CZ63479982

Ing. arch. Vladimír Ambroz
jednatel společnosti
A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ

DZS		
	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně DPH
B / STAVBA		
	7 173 528,00 Kč	8 608 233,60 Kč
C / SKLENĚNÉ KONSTRUKCE		
	6 644 860,00 Kč	7 973 832,00 Kč
	1 912 519,55 Kč	2 295 023,46 Kč
E / AV		
	2 493 100,00 Kč	2 991 720,00 Kč
F / OSVĚTLENÍ		
	4 042 782,00 Kč	4 851 338,40 Kč
CELKEM	22 266 789,55 Kč	26 720 147,46 Kč

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ

DZS

B / STAVBA

pořad. číslo	označení	číslo místnosti	popis položky	vnější rozměry (mm)	měrná jednotka	počet mj	technická poznámka	cena bez DPH/mj	cena včetně DPH/mj	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně DPH
B/1	005, 009	0.11	stínicí systém	1700x3000	m²	10,2	vnitřní screenové rolety, mechanické ovládání, materiál - kombinace plastu a polyesteru, odolné vůči UV záření, nehořlavé, barva šedá	1 955,00 Kč	2 346,00 Kč	19 941,00 Kč	23 929,20 Kč
B/2	002,017	0.12, 0.05	soliterní vitrína 1 - vnitřní sokl	530x275x530	ks	2	MDF sokl, nosná kce dřevěné hranolky, broušený, tmelený, nástřik RAL	3 680,00 Kč	4 416,00 Kč	7 360,00 Kč	8 832,00 Kč
B/3	006	0.11	mostová vitrína 1 - vnitřní sokl	6085x270x535	ks	1	MDF sokl, nosná kce dřevěné hranolky, broušený, tmelený, nástřik RAL	32 500,00 Kč	39 000,00 Kč	32 500,00 Kč	39 000,00 Kč
B/4	012	0.12	mostová vitrína 2 - vnitřní sokl	4680x270x535	ks	1	MDF sokl, nosná kce dřevěné hranolky, broušený, tmelený, nástřik RAL	27 500,00 Kč	33 000,00 Kč	27 500,00 Kč	33 000,00 Kč
B/5	026	0.16	projekční plocha 1	8140x2350	ks	1	ohýbaná MDF na dřevěné kci, broušená, tmelená se zpevňující tkaninou	58 500,00 Kč	70 200,00 Kč	58 500,00 Kč	70 200,00 Kč
B/6	027	0.16	sezení 1	sezení A 2000x400x400	ks	3	segmentová dřevěná deska z ohýbaných dubových profilů kotvená pomocí ocelových svorníků do dřevěných hranolů	32 500,00 Kč	39 000,00 Kč	97 500,00 Kč	117 000,00 Kč
				sezení B 770x400x400	ks	1	segmentová dřevěná deska z ohýbaných dubových profilů kotvená pomocí ocelových svorníků do dřevěných hranolů	14 500,00 Kč	17 400,00 Kč	14 500,00 Kč	17 400,00 Kč
B/7	028, 029	0.16	stínicí systém	1000x1100	m²	2,2	vnitřní screenové rolety, mechanické ovládání, materiál - kombinace plastu a polyesteru, odolné vůči UV záření, nehořlavé, barva šedá	1 955,00 Kč	2 346,00 Kč	4 301,00 Kč	5 161,20 Kč
B/8	034	0.18	podstavec pro náhrobky	2600x2350x520	ks	1	nosná kce z ocelových profilů, opláštěná MDF a patinovaným olověným plechem	54 500,00 Kč	65 400,00 Kč	54 500,00 Kč	65 400,00 Kč
B/9	036, 037	0.19	podstavec pro náhrobek	1250x2350x520	ks	2	nosná kce z ocelových profilů, opláštěná MDF a patinovaným olověným plechem	28 500,00 Kč	34 200,00 Kč	57 000,00 Kč	68 400,00 Kč
B/10	033, 038, 039	0.19, 0.21	stínicí systém	1600x2600	m²	12,5	vnitřní screenové rolety, mechanické ovládání, materiál - kombinace plastu a polyesteru, odolné vůči UV záření, nehořlavé, barva šedá	1 955,00 Kč	2 346,00 Kč	24 437,50 Kč	29 325,00 Kč
B/11	040	0.22	stínicí systém	1600x2320	m²	3,7	vnitřní screenové rolety, mechanické ovládání, materiál - kombinace plastu a polyesteru, odolné vůči UV záření, nehořlavé, barva šedá	1 955,00 Kč	2 346,00 Kč	7 233,50 Kč	8 680,20 Kč

B/12	043, 047, 064	0.22	stínící systém	1600x3500	m²	16,8	vnitřní screenové rolety, mechanické ovládání, materiál - kombinace plastu a polyesteru, odolné vůči UV záření, nehořlavé, barva šedá	1 955,00 Kč	2 346,00 Kč	32 844,00 Kč	39 412,80 Kč
B/13	071, 069, 070	0.19	stínící systém	1600x2800	m²	13,5	vnitřní screenové rolety, mechanické ovládání, materiál - kombinace plastu a polyesteru, odolné vůči UV záření, nehořlavé, barva šedá	1 955,00 Kč	2 346,00 Kč	26 392,50 Kč	31 671,00 Kč
B/14	044	0.22	instalační panel 1	2000x2250x200	ks	1	nosná dřevěná kce opláštěná 2x DTD a plastem tl. 5 mm (podklad pro grafiku)	8 500,00 Kč	10 200,00 Kč	8 500,00 Kč	10 200,00 Kč
B/15	046	0.22	instalační panel 2	4300x2250x200	ks	1	nosná dřevěná kce opláštěná 2x DTD a plastem tl. 5 mm (podklad pro grafiku)	17 500,00 Kč	21 000,00 Kč	17 500,00 Kč	21 000,00 Kč
B/16	068	0.22	instalační panel se soklem 1	panel:1690x2370x18, sokl:650x700x650	ks	1	ocelová konstrukce soklu opláštěná MDF, na pozadí MDF panel	19 800,00 Kč	23 760,00 Kč	19 800,00 Kč	23 760,00 Kč
B/17	048	0.22	solitérní vitrina se soklem 1 - sokl	400x730x400	ks	1	MDF sokl, nosná ocelová kce, broušený, tmelený, nástřik RAL	6 000,00 Kč	7 200,00 Kč	6 000,00 Kč	7 200,00 Kč
B/18	073	0.22	solitérní vitrina se soklem 2 - sokl	500x840x450	ks	1	MDF sokl, nosná ocelová kce, broušený, tmelený, nástřik RAL	6 850,00 Kč	8 220,00 Kč	6 850,00 Kč	8 220,00 Kč
B/19	052	0.23c	panel s grafikou 1	2915x3220(2340)	m²	12,5	nosná dřevěná kce opláštěná 2x DTD a plastem tl. 5 mm (podklad pro grafiku)	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	37 250,00 Kč	44 700,00 Kč
B/20	054	0.23b	panel s grafikou 2	2530x3210(2370)	m²	7,5	nosná dřevěná kce opláštěná 2x DTD a plastem tl. 5 mm (podklad pro grafiku)	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	22 350,00 Kč	26 820,00 Kč
B/21	062	0.23	panel s grafikou 3	1810x3610(2480)	m²	6	nosná dřevěná kce opláštěná 2x DTD a plastem tl. 5 mm (podklad pro grafiku)	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	17 880,00 Kč	21 456,00 Kč
B/22	063	0.23	vitřinový panel 1	3540x3815(2235)x1580	m²	19	nosná dřevěná kce opláštěná 2x DTD a plastem tl. 5 mm (podklad pro grafiku), otvory pro vitřiny	2 890,00 Kč	3 468,00 Kč	54 910,00 Kč	65 892,00 Kč
B/23	061	0.23	segmentový vitřinový panel 1	vnitřní oblouk 6000 x 2300	ks	1	roznášecí ocelová konstrukce na ocel. plechu, s nosnými horizontálními žebry z laťovky, opláštěná MDF a plastem tl. 5 mm (podklad pro grafiku), otvory pro vitřiny	115 000,00 Kč	138 000,00 Kč	115 000,00 Kč	138 000,00 Kč
B/24	055	0.23b	segmentový vitřinový panel s projekcí 1	vnitřní oblouk 5710 x 2300	ks	1	roznášecí ocelová konstrukce na ocel. plechu, s nosnými horizontálními žebry z laťovky, opláštěná MDF a plastem tl. 5 mm (podklad pro grafiku), otvory pro vitřiny	107 500,00 Kč	129 000,00 Kč	107 500,00 Kč	129 000,00 Kč
B/25	058	0.23a	segmentový panel s projekcí 2	vnitřní oblouk 5860 x 2300	ks	1	roznášecí ocelová konstrukce na ocel. plechu, s nosnými horizontálními žebry z laťovky, opláštěná MDF a plastem tl. 5 mm (podklad pro grafiku), otvory pro vitřiny	108 600,00 Kč	130 320,00 Kč	108 600,00 Kč	130 320,00 Kč
			segmentový panel s projekcí 2 - sokl do niky	250x1000x400	ks	2	MDF sokl, nosná kce dřevěné hranolky, broušený, tmelený, nástřik RAL	7 600,00 Kč	9 120,00 Kč	15 200,00 Kč	18 240,00 Kč

B/26	065, 066, 067	0.23	stínící systém	1200x2300	m²	8,3	vnitřní screenové rolety, mechanické ovládání, materiál - kombinace plastu a polyesteru, odolné vůči UV záření, nehořlavé, barva šedá	1 955,00 Kč	2 346,00 Kč	16 226,50 Kč	19 471,80 Kč
B/27	102	2.42	otočný panel s grafikou	panel:1700x4335, sokl:1826x150x406	ks	1	ocelový rám kotvený do soklu, opláštěný 2x DTD, povrch dýhovaný, broušený, tmelený, nátěr RAL	47 800,00 Kč	57 360,00 Kč	47 800,00 Kč	57 360,00 Kč
B/28	105	2.42	panel s vitrinou	1640x2180	m²	2,8	oplaštění 2xDTD, povrch dýhovaný, tmelený, broušený, nátěr RAL	2 890,00 Kč	3 468,00 Kč	8 092,00 Kč	9 710,40 Kč
B/29	106	2.42	soliterní vitrina - vnitřní sokl	400x400x2000	ks	1	MDF sokl s nikami, podpůrná dřevěná kce, broušený, tmelený, bílý nástřik RAL, lesk	18 500,00 Kč	22 200,00 Kč	18 500,00 Kč	22 200,00 Kč
B/30	109	2.41	instalační panel s podstavci a vitrinou	panel:3995x4450, podstavec: 300x106x300	m²	14,5	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), podstavce-dřevěná kce opláštěná MDF, otvor pro vitrinu	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	43 210,00 Kč	51 852,00 Kč
B/31	115	2.40	instalační panel	3700x4450	m²	13,5	dřevěná kce opláštěná 2xDTD, povrch dýhovaný, tmelený, broušený, nátěr RAL, otvor pro vitrinu	2 450,00 Kč	2 940,00 Kč	33 075,00 Kč	39 690,00 Kč
B/32	119	2.39	instalační panel	3700x4450	m²	9,5	dřevěná kce opláštěná 2xDTD, povrch dýhovaný, tmelený, broušený, nátěr RAL, otvor pro vitrinu	2 450,00 Kč	2 940,00 Kč	23 275,00 Kč	27 930,00 Kč
B/33	124	2.35	instalační panel	3760x4450	m²	10,8	dřevěná kce opláštěná 2xDTD, povrch dýhovaný, tmelený, broušený, nátěr RAL, otvor pro vitrinu	2 450,00 Kč	2 940,00 Kč	26 460,00 Kč	31 752,00 Kč
B/34	126	2.35	instalační panel	3780x4450	m²	13,2	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), otvor pro vitrinu	2 450,00 Kč	2 940,00 Kč	32 340,00 Kč	38 808,00 Kč
B/35	132	2.34	instalační panel s vitrinou	3660x4450	m²	15	dřevěná kce opláštěná 2xDTD, povrch dýhovaný, tmelený, broušený, nátěr RAL, otvor pro vitrinu	2 760,00 Kč	3 312,00 Kč	41 400,00 Kč	49 680,00 Kč
B/36	110, 111	2.41	podstavec	300x106x300	ks	2	dřevěná kce opláštěná MDF	3 800,00 Kč	4 560,00 Kč	7 600,00 Kč	9 120,00 Kč
B/37	121	2.39	podstavec	400x106x300	ks	1	dřevěná kce opláštěná MDF	3 800,00 Kč	4 560,00 Kč	3 800,00 Kč	4 560,00 Kč
B/38	108, 113, 118, 123, 128, 131	2.42, 2.41, 2.40, 2.39, 2.35, 2.36, 2.37	stínící systém	1600x3200	m²	31	vnitřní screenové rolety, mechanické ovládání, materiál - kombinace plastu a polyesteru, odolné vůči UV záření, nehořlavé, barva šedá	1 955,00 Kč	2 346,00 Kč	60 605,00 Kč	72 726,00 Kč
B/39	133	2.34	vitrina se soklem - vnitřní sokl	2200x800x550	ks	1	MDF sokl, nosná kce dřevěné hranolky, broušený, tmelený, nástřik RAL	8 400,00 Kč	10 080,00 Kč	8 400,00 Kč	10 080,00 Kč
B/40	149	2.31	instalační paneláž	rozvinutá délka 10000x3650	m²	36,5	systémová kce z CW a UW profilů opláštěná 2xDTD, povrch dýhovaný, tmelený, broušený, nátěr RAL, lamelový provětrávaný sokl	1 190,00 Kč	1 428,00 Kč	43 435,00 Kč	52 122,00 Kč
B/41	150	2.31	panel s bezpečnostní vitrinou	1640x2180	m²	3,6	oplaštění panelu 2xDTD, povrch dýhovaný, tmelený, broušený, nátěr RAL	2 700,00 Kč	3 240,00 Kč	9 720,00 Kč	11 664,00 Kč
B/42	151	2.31	pohled	2950x2850	m²	8,5	SDK pohled na ocelových táhlech, pohledové hrany zaklopeny, nátěr RAL	1 200,00 Kč	1 440,00 Kč	10 200,00 Kč	12 240,00 Kč

B/43	154	2.30	instalační paneláž	rozvinutá délka 12500x3650	m²	45,7	systémová kce z CW a UW profilů opláštěná 2xDTD, povrch dýhovaný, tmelený, broušený, nátěr RAL, lamelový provětrávaný sokl	1 100,00 Kč	1 320,00 Kč	50 270,00 Kč	60 324,00 Kč
B/44	159	2.30	podhled	3700x3600	m²	13,5	SDK podhled na ocelových táhlech, pohledové hrany zaklopy, nátěr RAL	1 200,00 Kč	1 440,00 Kč	16 200,00 Kč	19 440,00 Kč
B/45	163	2.29	instalační paneláž	rozvinutá délka 10400x3650	m²	38	systémová kce z CW a UW profilů opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	1 100,00 Kč	1 320,00 Kč	41 800,00 Kč	50 160,00 Kč
B/46	172	2.29	podhled	3700x5600	m²	21	SDK podhled na ocelových táhlech, pohledové hrany zaklopy, nátěr RAL	1 200,00 Kč	1 440,00 Kč	25 200,00 Kč	30 240,00 Kč
B/47	173	2.29	vitrínový panel 4	3560x 3650	m²	13	systémová kce z CW a UW profilů opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	1 900,00 Kč	2 280,00 Kč	24 700,00 Kč	29 640,00 Kč
B/48	170	2.29	interaktivní pult	700x700x1000	ks	1	ocelový nosný rám, rektifikovatelný, opláštěný MDF, broušený, tmelený, nátěr RAL	19 800,00 Kč	23 760,00 Kč	19 800,00 Kč	23 760,00 Kč
B/49	171	2.29	vitrína s instalačním soklem - vnitřní sokl	600x600x600	ks	1	MDF sokl, nosná kce dřevěné hranolky, broušený, tmelený, nátěr RAL, sokl nutno přitížit	4 200,00 Kč	5 040,00 Kč	4 200,00 Kč	5 040,00 Kč
B/50	186	2.28	vitrínový panel 5	1660x 3650	m²	6,1	systémová kce z CW a UW profilů opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	1 900,00 Kč	2 280,00 Kč	11 590,00 Kč	13 908,00 Kč
B/51	191	2.28	podhled	2900x3900	m²	11,5	SDK podhled na ocelových táhlech, pohledové hrany zaklopy, nátěr RAL	1 200,00 Kč	1 440,00 Kč	13 800,00 Kč	16 560,00 Kč
B/52	193	2.28	instalační paneláž s audiem	rozvinutá délka 12600x3650	m²	46	systémová kce z CW a UW profilů opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku)/ povrch dýhovaný, tmelený, broušený, nátěr RAL, lamelový provětrávaný sokl	1 100,00 Kč	1 320,00 Kč	50 600,00 Kč	60 720,00 Kč
B/53	190	2.28	pódium	1640x150x2705	ks	1	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s kobercem	12 000,00 Kč	14 400,00 Kč	12 000,00 Kč	14 400,00 Kč
B/54	196	2.27	panelová vestavba	4000x3200x2300	ks	1	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s patinovanou stěrkou na stěnách/s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), na podlaze 2xDTD a přírodní linoleum	98 500,00 Kč	118 200,00 Kč	98 500,00 Kč	118 200,00 Kč
B/55	139	2.21	panely s grafikou	rozvinutá délka 12600x3580	m²	42,5	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	126 650,00 Kč	151 980,00 Kč
B/56	137	2.21	podhled	8770x2565	m²	22,5	SDK podhled na ocelových táhlech, pohledové hrany zaklopy, nátěr RAL	1 200,00 Kč	1 440,00 Kč	27 000,00 Kč	32 400,00 Kč
B/57 ³	142	2.21	závěsný expoziční systém		ks	1	závěsný expoziční systém - košatina balónu, v rámci dílenské dokumentace nutný statický posudek, viz výkres č.85	72 500,00 Kč	87 000,00 Kč	72 500,00 Kč	87 000,00 Kč
B/58	145	2.21	panely s grafikou	rozvinutá délka 9400x3580	m²	34	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	101 320,00 Kč	121 584,00 Kč
B/59	144	2.21	podhled	4300x2565	m²	11	SDK podhled na ocelových táhlech, pohledové hrany zaklopy, nátěr RAL	1 200,00 Kč	1 440,00 Kč	13 200,00 Kč	15 840,00 Kč

B/60	188	2.26	stínící systém	1400x3100	m²	4,4	vnitřní screenové rolety, mechanické ovládání, materiál - kombinace plastu a polyesteru, odolné vůči UV záření, nehořlavé, barva šedá	1 955,00 Kč	2 346,00 Kč	8 602,00 Kč	10 322,40 Kč
B/61	179	2.26	prkenný panel	3300x3500	m²	11,6	dřevěná kce opláštěná patinovanými dřevěnými prkny tl. 25, otvor pro vitrínu	3 950,00 Kč	4 740,00 Kč	45 820,00 Kč	54 984,00 Kč
B/62	178	2.26	velkoprostorová vitrína - vnitřní sokly	500x400x800	ks	2	MDF sokl, nosná kce dřevěné hranolky, broušený, tmelený, nástřik RAL	4 500,00 Kč	5 400,00 Kč	9 000,00 Kč	10 800,00 Kč
B/63	180	2.26	prkenný panel s vitrínou	3300x3500	m²	11,6	dřevěná kce opláštěná patinovanými dřevěnými prkny tl. 25, otvor pro vitrínu	3 950,00 Kč	4 740,00 Kč	45 820,00 Kč	54 984,00 Kč
B/64	181	2.26	podhled	3800x3300	m²	12,6	dřevěná kce opláštěná patinovanými dřevěnými prkny tl. 25	1 200,00 Kč	1 440,00 Kč	15 120,00 Kč	18 144,00 Kč
B/65	182	2.26	pódium	3300x3000	m²	9,9	dřevěná kce opláštěná patinovanými dřevěnými prkny tl. 25	2 200,00 Kč	2 640,00 Kč	21 780,00 Kč	26 136,00 Kč
B/66	184	2.26	panel s grafikou	3160x3600	m²	11,4	obvodový kovový rám s celoplošnou grafikou na textílii	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	33 972,00 Kč	40 766,40 Kč
B/67	209	2.20	sezení 2	880x400x1270	ks	3	DTD deska na ohýbaném ocelovém pásu, čalounění, kožený potah	29 800,00 Kč	35 760,00 Kč	89 400,00 Kč	107 280,00 Kč
B/68	199	2.20	panel s grafikou	3550x3715	m²	13,2	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	39 336,00 Kč	47 203,20 Kč
B/69	197	2.20	panel s grafikou	2045x3715	m²	7,6	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	22 648,00 Kč	27 177,60 Kč
B/70	201	2.20	panel s grafikou	5645x3715	m²	21	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	62 580,00 Kč	75 096,00 Kč
B/71	202	2.20	panel s vitrínou a zásuvkami	2045x3715	m²	7,6	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl, otvor na vitrínu	3 300,00 Kč	3 960,00 Kč	25 080,00 Kč	30 096,00 Kč
			panel s vitrínou a zásuvkami-zásuvky	700x150x500	ks	8	MDF kce, broušený, tmelený, nástřik RAL	4 950,00 Kč	5 940,00 Kč	39 600,00 Kč	47 520,00 Kč
B/72	203	2.20	pódium	5645x95x4090	ks	1	dřevěná kce opláštěná 2xDTD, nátěr RAL	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč
B/73	200	2.20	interaktivní strom		ks	1	nosná ocelová konstrukce a DTD konstrukce, viz výkres č. 84	135 000,00 Kč	162 000,00 Kč	135 000,00 Kč	162 000,00 Kč
B/74	211,210,204	2.20	stínící systém	1500x3200	m²	14,5	vnitřní screenové rolety, mechanické ovládání, materiál - kombinace plastu a polyesteru, odolné vůči UV záření, nehořlavé, barva šedá	1 955,00 Kč	2 346,00 Kč	28 347,50 Kč	34 017,00 Kč
B/75	216	2.19	panel s grafikou	8135x3600	m²	29,3	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	2 890,00 Kč	3 468,00 Kč	84 677,00 Kč	101 612,40 Kč
B/76	319	2.19	podhled	7500x6300	m²	47,3	SDK podhled na ocelových táhlech, pohledové hrany zaklopeny, nátěr RAL	1 200,00 Kč	1 440,00 Kč	56 760,00 Kč	68 112,00 Kč
B/77	221	2.19	strukturovaný podstavec	1300x1140x350	m³	0,32	nakaširovaný polystyren, výtvarně dotvořený	5 200,00 Kč	6 240,00 Kč	1 664,00 Kč	1 996,80 Kč

B/78	215	2.19	solitérní vitrina - vnitřní sokl	150x1720x150	ks	1	MDF sokl, nosná kce dřevěné hranolky, broušený, tmelený, nástřik RAL	7 500,00 Kč	9 000,00 Kč	7 500,00 Kč	9 000,00 Kč
B/79	229	2.19	strukturovaný podstavec	7300x2000x700	m³	10,3	nakaširovaný polystyren, výtvarně dotvořený	5 200,00 Kč	6 240,00 Kč	53 560,00 Kč	64 272,00 Kč
B/80	232	2.19	panel s grafikou - část 1	4430x3600	m²	16	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	47 680,00 Kč	57 216,00 Kč
			panel s grafikou - část 2	7685x3600	m²	27,7	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	82 546,00 Kč	99 056,20 Kč
			panel s grafikou - část 3	4355x3600	m²	15,7	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	46 786,00 Kč	56 143,20 Kč
B/81	235, 248, 249	2.18, 2.15	stínicí systém	1600x3500	m²	16,8	vnitřní screenové rolety, mechanické ovládání, materiál - kombinace plástu a polyesteru, odolné vůči UV záření, nehořlavé, barva šedá	1 955,00 Kč	2 346,00 Kč	32 844,00 Kč	39 412,80 Kč
B/82	234	2.18	instalační paneláž s grafikou	rozvinutá délka 7360x3600	m²	26,5	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	2 900,00 Kč	3 480,00 Kč	76 850,00 Kč	92 220,00 Kč
B/83	241	2.18	podlaha	6990x95x4050	ks	1	dřevěná kce opláštěná 2xDTD, polovina patinovaný nátěr RAL, polovina patinovaný TiZn, nýtovaný, výtvarně dotvořený	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč
B/84	316	2.18	podhled	6980x5820	m²	40,7	dřevěný podhled na ocelových táhlech, pohledové hrany zaklopeny, polovina patinovaný nátěr RAL, polovina patinovaný TiZn, výtvarně dotvořený	1 200,00 Kč	1 440,00 Kč	48 840,00 Kč	58 608,00 Kč
B/85	243	2.18	panel s vitrinou	3950x3600	m²	14,3	dřevěná kce opláštěná 2xDTD, patinovaný TiZn, výtvarně dotvořený, lamelový provětrávaný sokl, otvor na vitrínu	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	42 614,00 Kč	51 136,80 Kč
B/86	246	2.18	panel s vitrinou	3950x3600	m²	14,3	dřevěná kce opláštěná 2xDTD, patinovaný nátěr, lamelový provětrávaný sokl, otvor na vitrínu	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	42 614,00 Kč	51 136,80 Kč
B/87	247	2.18	panel s vitrinou	7280x3600	m²	26,2	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl, otvor na vitrínu	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	78 076,00 Kč	93 691,20 Kč
B/88	250	2.15	panel s grafikou - část 1	6305x2650	m²	16,8	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	50 064,00 Kč	60 076,80 Kč
			panel s grafikou - část 2	870x2650	m²	2,3	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku), lamelový provětrávaný sokl	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	6 854,00 Kč	8 224,80 Kč

B/89	255, 257, 259, 261, 263, 271, 274, 281, 282, 289, 291, 295, 297, 304, 315	2.03, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14	stínicí systém	rolety:1500x3000	m²	67,5	vnitřní screenové rolety, mechanické ovládání, materiál - kombinace plastu a polyesteru, odolné vůči UV záření, nehořlavé, barva šedá	1 955,00 Kč	2 346,00 Kč	131 962,50 Kč	158 355,00 Kč
				závěsy: 3000x3000	m²	306	závěsy s kanýry (drapérie)	1 890,00 Kč	2 268,00 Kč	578 340,00 Kč	694 008,00 Kč
B/90	272	2.05	historizující tapety	rozvinutá délka 19200x4750:	m²	88,2	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%	1 950,00 Kč	2 340,00 Kč	171 990,00 Kč	206 388,00 Kč
B/91	278	2.06	historizující tapety	rozvinutá délka 17700x4750	m²	81,1	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%	1 950,00 Kč	2 340,00 Kč	158 145,00 Kč	189 774,00 Kč
B/92	279	2.07	historizující tapety	rozvinutá délka 16700x4750	m²	76,5	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%	1 950,00 Kč	2 340,00 Kč	149 175,00 Kč	179 010,00 Kč
B/93	284	2.08	historizující tapety	rozvinutá délka 20500x4750	m²	94,5	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%	1 950,00 Kč	2 340,00 Kč	184 275,00 Kč	221 130,00 Kč
B/94	288	2.09	vložená dobová koupelna	rozvinutá délka 8725x1500	ks	1	SDK panely s bělinovým obkladem	142 500,00 Kč	171 000,00 Kč	142 500,00 Kč	171 000,00 Kč
B/95	253	2.09	historizující tapety	rozvinutá délka 12700x4750	m²	60,1	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%	1 950,00 Kč	2 340,00 Kč	117 195,00 Kč	140 634,00 Kč
B/96	292	2.11	historizující tapety	rozvinutá délka 20400x4750	m²	94	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%	1 950,00 Kč	2 340,00 Kč	183 300,00 Kč	219 960,00 Kč
B/97	296	2.11	historizující prolamované dveře	1300x2250	ks	1	replika dobových křidel	36 800,00 Kč	44 160,00 Kč	36 800,00 Kč	44 160,00 Kč
B/98	298	2.12	historizující tapety	rozvinutá délka 16100x4750	m²	73,5	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%	1 950,00 Kč	2 340,00 Kč	143 325,00 Kč	171 990,00 Kč
B/99	301	2.13	historizující dvoukřídle dveře 1	1300x2250	ks	1	replika dobových křidel	36 800,00 Kč	44 160,00 Kč	36 800,00 Kč	44 160,00 Kč
B/100	302	2.13	historizující tapety	rozvinutá délka 18300x4750	m²	84	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%	1 950,00 Kč	2 340,00 Kč	163 800,00 Kč	196 560,00 Kč
B/101	306	2.13	historizující dvoukřídle dveře 2	1300x2250	ks	1	replika dobových křidel	36 800,00 Kč	44 160,00 Kč	36 800,00 Kč	44 160,00 Kč
B/102	309	2.14	historizující tapety	rozvinutá délka 19200x4750	m²	88,2	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%	1 950,00 Kč	2 340,00 Kč	171 990,00 Kč	206 388,00 Kč
B/103	313	2.14	panel s grafikou	1200x2350	m²	2,9	DTD na dřevěném rámu, povrch s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku)	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	8 642,00 Kč	10 370,40 Kč
B/104	308	2.14	panel s grafikou	2000x1600	m²	3,2	DTD na dřevěném rámu, povrch s plastem tl.5 mm (podklad pro grafiku)	2 980,00 Kč	3 576,00 Kč	9 536,00 Kč	11 443,20 Kč
B/105	310	2.14	projekční plátno	2600x2000	m²	5,2	DTD na dřevěném rámu, nátěr bílá reflexní barva	3 000,00 Kč	3 600,00 Kč	15 600,00 Kč	18 720,00 Kč
B/106 ⁶			instalační doplňky		soubor	1	mosazné háčky na tercích, plexi stojánky, molitanové klíny, zarážky, závěsné systémy	215 000,00 Kč	258 000,00 Kč	215 000,00 Kč	258 000,00 Kč
	265	2.03	instalační systém		soubor	1	mosazný kruhový profil o průměru 15 - 20 mm, na konzolách, doplněný závěsnými lanky, cena zahrnuta do instalačních doplňků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
B/107			dílenská dokumentace stavby		soubor	1		125 000,00 Kč	150 000,00 Kč	125 000,00 Kč	150 000,00 Kč

B/108 ⁴			výtvarné dotvoření		soubor	1	provádění skica, barevné a materiálové dotvoření interaktivního stromu, mechanické interaktivní prvky (prvek 200), patinování vybraných částí expozice včetně materiálu (viz výkresová část - místnost 0.23, 2.27, 2.26, 2.21, 2.19, 2.18), součinnost kvalifikovaného výtvarníka během celé stavby expozice (cca 450 hodin)	525 000,00 Kč	630 000,00 Kč	525 000,00 Kč	630 000,00 Kč
B/109 ⁵			zakrytí a ochrana památky proti poškození po dobu instalace expozic		kmplt	1	stavba expozice probíhá v nově zrekonstruovaných prostorech NKP, je nutná ochrana veškerých konstrukcí a částí interiéru, kde hrozí jejich poškození, po celou dobu realizace, předpokládaný rozsah viz stanovená částka	98 500,00 Kč	118 200,00 Kč	98 500,00 Kč	118 200,00 Kč
B/110			doprava		kmplt	1		165 000,00 Kč	198 000,00 Kč	165 000,00 Kč	198 000,00 Kč
CELKEM	CELKOVÁ CENA ZAHRNÚJE CENU ZA MONTÁŽ, LIKVIDACI OBALŮ A CELKOVÝ ÚKLID PŘED PŘEDÁNÍM A PŘEVZETÍM DÍLA!!!									7 173 528,00 Kč	8 608 233,60 Kč

³ předpokládaný rozsah nákladů nezbytných pro realizaci činí 70 000,-Kč bez DPH

⁴ předpokládaný rozsah prací zkušeného výtvarníka je v hodnotě 530 000,-Kč bez DPH

⁵ předpokládaný rozsah těchto prací činí 250 000,-Kč bez DPH

⁶ předpokládaný rozsah nákladů nezbytných pro realizaci činí 150 000,-Kč bez DPH

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ

DZS

C / SKLENĚNÉ KONSTRUKCE

pořad. číslo	označení	číslo místnosti	popis položky	vnější rozměry (mm)	měrná jednotka	počet mj	technická poznámka	cena bez DPH/mj	cena včetně DPH/mj	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně DPH
C/1	006	0.11	mostová vitrína 1	rozměry vitríny (šxvxh): 6200x860x650, rozměry soklu: 800x295x650	ks	1	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, vynášena roznášecím roštem a dvěma sokly viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.01, cena zahrnuje osvětlení vitríny	297 500,00 Kč	357 000,00 Kč	297 500,00 Kč	357 000,00 Kč
C/2	012	0.12	mostová vitrína 2	rozměry vitríny (šxvxh): 4800x860x650, rozměry soklu: 800x295x650	ks	1	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, vynášena roznášecím roštem a dvěma sokly viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.02, cena zahrnuje osvětlení vitríny	228 300,00 Kč	273 960,00 Kč	228 300,00 Kč	273 960,00 Kč
C/3	002, 017	0.05, 0.12	soliterní vitrína 1	rozměry vitríny (šxvxh): 650x860x650, rozměry soklu: 650x295x650	ks	2	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.03, cena zahrnuje osvětlení vitríny	49 800,00 Kč	59 760,00 Kč	99 600,00 Kč	119 520,00 Kč
C/4	004, 008, 016	0.11, 0.12	panel s vitrinou	rozměry celku (šxvxh): 1300x2350x300 rozměry soklu (šxvxh): 1100x150x300 rozměry vitríny (šxvxh): 800x1200x250	ks	3	otevíratelný skleněný panel na pomocné ocelové konstrukci s vloženou vitrinou a roznášecím soklem, ve vitrině 2 skleněné police viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.04, cena zahrnuje osvětlení vitríny	64 500,00 Kč	77 400,00 Kč	193 500,00 Kč	232 200,00 Kč
C/5	007, 011,	0.11, 0.12	panel s vitrinou	rozměry celku (šxvxh): 1300x2350x300 rozměry soklu (šxvxh): 1100x150x300 rozměry vitríny (šxvxh): 800x1200x250	ks	2	otevíratelný skleněný panel na pomocné ocelové konstrukci s vloženou vitrinou a roznášecím soklem, ve vitrině 3 skleněné police viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.05, cena zahrnuje osvětlení vitríny	78 400,00 Kč	94 080,00 Kč	156 800,00 Kč	188 160,00 Kč
C/6	010, 013	0.11, 0.12	panel s vitrinou	rozměry celku (šxvxh): 1300x2350x300 rozměry soklu (šxvxh): 1100x150x300 rozměry vitríny (šxvxh): 800x800x250	ks	2	otevíratelný skleněný panel na pomocné ocelové konstrukci s vloženou vitrinou a roznášecím soklem, ve vitrině 1 skleněná police viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.06, cena zahrnuje osvětlení vitríny	64 500,00 Kč	77 400,00 Kč	129 000,00 Kč	154 800,00 Kč
C/7	018, 015	0.12	panel s bezpečnostní vitrinou	rozměry celku (šxvxh): 1300x2350x300 rozměry soklu (šxvxh): 1100x150x300 rozměry vitríny (šxvxh): 800x1200x250	ks	2	otevíratelný skleněný panel na pomocné ocelové konstrukci s vloženou bezpečnostní vitrinou a roznášecím soklem, ve vitrině 3 skleněné police viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.07, cena zahrnuje osvětlení vitríny	84 500,00 Kč	101 400,00 Kč	169 000,00 Kč	202 800,00 Kč

C/8	014	0.15	panel s bezpečnostní vitrínou v nice	rozměry celku (šxvxh): 1300x2350x300 rozměry soklu (šxvxh): 1100x150x300 rozměry vitríny (šxvxh): 800x1200x450	ks	1	otevíratelný skleněný panel na pomocné ocelové konstrukci s vloženou bezpečnostní vitrínou a roznášecím soklem, ve vitrině 3 skleněné police viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.08, cena zahrnuje osvětlení vitríny	85 800,00 Kč	102 960,00 Kč	85 800,00 Kč	102 960,00 Kč
C/9	022, 025	0.15, 0.16	bezpečnostní vitrina 1	rozměry vitríny (šxvxh): 900x300x900, rozměry soklu: 900x900x900	ks	2	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu, bezpečnostní sklo viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.09, cena zahrnuje osvětlení vitríny	69 800,00 Kč	83 760,00 Kč	139 600,00 Kč	167 520,00 Kč
C/10	049	0.22	soklová vitrina	rozměry vitríny (šxvxh): 400x1020x300, rozměry soklu:400x930x300	ks	1	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu, vitrina - lepený skleněný korpus s odnímatelným sklem viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.10	28 900,00 Kč	34 680,00 Kč	28 900,00 Kč	34 680,00 Kč
C/11	050, 072	0.22	soklová vitrina	rozměry vitríny (šxvxh): 500x1020x350, rozměry soklu:500x930x350	ks	2	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu, vitrina - lepený skleněný korpus s odnímatelným sklem viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.10	28 900,00 Kč	34 680,00 Kč	57 800,00 Kč	69 360,00 Kč
C/12	074	0.22	soklová vitrina	rozměry vitríny (šxvxh): 400x850x300, rozměry soklu:400x1100x300	ks	1	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu, vitrina - lepený skleněný korpus s odnímatelným sklem viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.10	26 500,00 Kč	31 800,00 Kč	26 500,00 Kč	31 800,00 Kč
C/13	044, 046	0.22	instalační panel 1 a 2	rozměry (šxv): 800x2100	ks	2	sklo float tl. 8 mm kotvené pomocí Z profilu ke konstrukci panelu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.10	22 500,00 Kč	27 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 000,00 Kč
C/14	063	0.23	vitřinový panel - vitrina 1	rozměry vitríny (šxvxh): 1100x500x400	ks	1	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.11, cena zahrnuje osvětlení vitríny	36 500,00 Kč	43 800,00 Kč	36 500,00 Kč	43 800,00 Kč
			vitřinový panel - vitrina 2	rozměry vitríny (šxvxh): 700x1700x400	ks	1	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.11, cena zahrnuje osvětlení vitríny	33 500,00 Kč	40 200,00 Kč	33 500,00 Kč	40 200,00 Kč
			vitřinový panel - zábradlí	rozměry (šxv): 880x900	ks	1	bezpečnostní kalené sklo kotvené do DTD viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.11	17 800,00 Kč	21 360,00 Kč	17 800,00 Kč	21 360,00 Kč
			vitřinový panel - zasklení okna	rozměry (šxv): 390x500	ks	1	sklo float tl. 6 mm s mléčnou fólií viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.11	4 400,00 Kč	5 280,00 Kč	4 400,00 Kč	5 280,00 Kč
C/15	061	0.23	segmentový vitřinový panel 1 - vitrina 1	rozměry vitríny (šxvxh): 700x1700x400	ks	1	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do segmentového panelu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.12, cena zahrnuje osvětlení vitríny	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč

			segmentový vitrinový panel 1 - vitrina 2	rozměry vitríny (šxvxh): 800x500x300	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do segmentového panelu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.12, cena zahrnuje osvětlení vitríny	34 500,00 Kč	41 400,00 Kč	34 500,00 Kč	41 400,00 Kč
			segmentový vitrinový panel 1 - vitrina 3	rozměry vitříny (šxvxh): 800x1350x150	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do segmentového panelu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.12, cena zahrnuje osvětlení vitríny	44 500,00 Kč	53 400,00 Kč	44 500,00 Kč	53 400,00 Kč
C/16	055	0.23b	segmentový vitrinový panel s projekcí 1 - vitrina 1	rozměry vitříny (šxvxh): 1300x400x300	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do segmentového panelu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.13, cena zahrnuje osvětlení vitríny	29 800,00 Kč	35 760,00 Kč	29 800,00 Kč	35 760,00 Kč
			segmentový vitrinový panel s projekcí 1 - vitrina 2	rozměry vitříny (šxvxh): 300x975x300	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do segmentového panelu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.13, cena zahrnuje osvětlení vitríny	29 600,00 Kč	35 520,00 Kč	29 600,00 Kč	35 520,00 Kč
			segmentový vitrinový panel s projekcí 1 - vitrina 3	rozměry vitříny (šxvxh): 800x400x150	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do segmentového panelu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.13, cena zahrnuje osvětlení vitríny	24 500,00 Kč	29 400,00 Kč	24 500,00 Kč	29 400,00 Kč
C/17	059	0.23a	vitřina 1	rozměry vitříny (šxvxh): 1450x750x1700, rozměry soklu: 1050x450x1300	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.14	62 500,00 Kč	75 000,00 Kč	62 500,00 Kč	75 000,00 Kč
C/18	045, 048, 073	0.22	solitérní vitřina , solitérní vitřina s instalačním soklem 1, solitérní vitřina s instalačním soklem 2	rozměry vitříny (šxvxh): 650x2100x650, rozměry soklu: 850x150x850	ks	3	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.15, 16,17, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	74 500,00 Kč	89 400,00 Kč	223 500,00 Kč	268 200,00 Kč
C/19	001	0.05	posuvný panel 1	rozměry celku(šxv): 1800x2350, rozměry otevíravého křídla: 1350x2350	ks	1	sklo float tl. 8 mm na pomocné ocelové konstrukci s posuvnou otevíratelnou částí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.18	43 500,00 Kč	52 200,00 Kč	43 500,00 Kč	52 200,00 Kč
C/20	051	0.22	posuvný panel 2	rozměry celku(šxv): 1900x2700, rozměry otevíravého křídla: 1450x2350	ks	1	sklo float tl. 8 mm na pomocné ocelové konstrukci s posuvnou otevíratelnou částí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.19	44 890,00 Kč	53 868,00 Kč	44 890,00 Kč	53 868,00 Kč
C/21	106	2.42	solitérní vitřina	rozměry vitříny(šxvxh): 600x2200x600, rozměry soklu: 800x150x800	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.20	49 800,00 Kč	59 760,00 Kč	49 800,00 Kč	59 760,00 Kč
C/22	105	2.42	panel s vitřinou	rozměry vitříny (šxvxh): 900x700x300	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.21, cena zahrnuje osvětlení vitříny	45 600,00 Kč	54 720,00 Kč	45 600,00 Kč	54 720,00 Kč

C/23	109	2.41	instalační panel s podstavci a vitrinou	rozměry vitríny (šxvxh): 1000x2200x600	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.22, cena zahrnuje osvětlení vitríny	59 800,00 Kč	71 760,00 Kč	59 800,00 Kč	71 760,00 Kč
C/24	114,120,125	2.40, 2.39, 2.38	posuvná vitřina	rozměry vitříny (šxvxh): 1200x1750x600	ks	3	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí opatřenou pojezdem pro posun celé vitříny viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.24, cena zahrnuje osvětlení vitříny, cena zahrnuje osvětlení vitříny	68 500,00 Kč	82 200,00 Kč	205 500,00 Kč	246 600,00 Kč
C/25	129	2.37	posuvná vitřina	rozměry vitříny (šxvxh): 750x1750x600	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí opatřenou pojezdem pro posun celé vitříny, ve vitřině 2 skleněné police viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.23, cena zahrnuje osvětlení vitříny	57 600,00 Kč	69 120,00 Kč	57 600,00 Kč	69 120,00 Kč
C/26	318	2.36	posuvná vitřina	rozměry vitříny (šxvxh): 800x1750x600	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí opatřenou pojezdem pro posun celé vitříny, ve vitřině 3 skleněné police viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.23, cena zahrnuje osvětlení vitříny	61 520,00 Kč	73 824,00 Kč	61 520,00 Kč	73 824,00 Kč
C/27	132	2.34	instalační panel s vitrinou	rozměry vitříny (šxvxh): 2800x1350x750	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.25, cena zahrnuje osvětlení vitříny	121 500,00 Kč	145 800,00 Kč	121 500,00 Kč	145 800,00 Kč
C/28	133	2.34	vitřina se soklem	rozměry vitříny(šxvxh): 2400x2200x750, rozměry soklu: 2400x150x750	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.26, cena zahrnuje osvětlení vitříny	104 500,00 Kč	125 400,00 Kč	104 500,00 Kč	125 400,00 Kč
C/29	150	2.31	panel s bezpečnostní vitrinou	rozměry vitříny(šxvxh): 600x800x150, rozměry panelu(šxv): 1440x3500	ks	1	ocelová konstrukce panelu s vloženou bezpečnostní vitrinou viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.27	63 500,00 Kč	76 200,00 Kč	63 500,00 Kč	76 200,00 Kč
C/30	152, 160	2.30, 2.31	infopanel	rozměry (šxv): 600x2100	ks	2	sklo float tl. 8 mm kotvené pomocí Z profilu ke konstrukci panelu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.28	9 950,00 Kč	11 940,00 Kč	19 900,00 Kč	23 880,00 Kč
C/31	171	2.29	vitřina s instalačním soklem	rozměry vitříny(šxvxh): 700x2300x700, rozměry soklu:900x150x900	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.29	44 500,00 Kč	53 400,00 Kč	44 500,00 Kč	53 400,00 Kč
C/32	173	2.29	vitřinový panel 4	rozměry vitříny (šxvxh): 1600x700x250	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.30, cena zahrnuje osvětlení vitříny	48 500,00 Kč	58 200,00 Kč	48 500,00 Kč	58 200,00 Kč

C/33	141, 147, 206	2.21, 2.20	AV infopoint	rozměry skla(šxv): 800x2200, rozměry soklu: 600x150x250	ks	3	sklo na ocelové konstrukci s vloženou LCD obrazovkou viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.52	33 980,00 Kč	40 776,00 Kč	101 940,00 Kč	122 328,00 Kč
C/34	020, 053, 198, 238	0.15, 023.c, 2.20, 2.18	AV infopoint	rozměry skla(šxv): 800x2200, rozměry soklu: 600x150x250	ks	4	sklo na ocelové konstrukci s vloženou LCD obrazovkou a trnem pro osazení sluchátek viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.52	34 500,00 Kč	41 400,00 Kč	138 000,00 Kč	165 600,00 Kč
C/35	268, 269	2.05	vitřina	rozměry vitřiny(šxvxh): 1200x2050x450, rozměry soklu:1400x150x650	ks	2	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu, 4 police viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.40, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	71 500,00 Kč	85 800,00 Kč	143 000,00 Kč	171 600,00 Kč
C/36	273	2.06	vitřina	rozměry vitřiny(šxvxh): 1400x2050x450, rozměry soklu:1600x150x650	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.41, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	59 800,00 Kč	71 760,00 Kč	59 800,00 Kč	71 760,00 Kč
C/37	275	2.06	vitřina	rozměry vitřiny(šxvxh): 450x2050x450, rozměry soklu:650x150x650	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.42, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	54 500,00 Kč	65 400,00 Kč	54 500,00 Kč	65 400,00 Kč
C/38	276	2.07	vitřina	rozměry vitřiny(šxvxh): 1200x2050x450, rozměry soklu:1400x150x650	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu, 3 police viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.43, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	67 400,00 Kč	80 880,00 Kč	67 400,00 Kč	80 880,00 Kč
C/39	285	2.09	vitřina	rozměry vitřiny(šxvxh): 450x2050x450, rozměry soklu:650x150x650	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu, 4 police viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.44, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	54 500,00 Kč	65 400,00 Kč	54 500,00 Kč	65 400,00 Kč
C/40	293, 299, 305	2.11, 2.12,	vitřina	rozměry vitřiny(šxvxh): 1050x2050x450, rozměry soklu:1250x150x650	ks	3	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu, 4 police viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.45, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	69 800,00 Kč	83 760,00 Kč	209 400,00 Kč	251 280,00 Kč
C/41	317	2.14	vitřina	rozměry vitřiny(šxvxh): 450x2050x450, rozměry soklu:650x150x650	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu, 2 police viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.46, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	54 500,00 Kč	65 400,00 Kč	54 500,00 Kč	65 400,00 Kč
C/42	003, 101, 104	0.05, 2.01, 2.42	infopanel 1	rozměry skla(šxv): 1300x2200, rozměry soklu:1100x150x200	ks	3	sklo float tl. 8 mm kotvené k ocelové konstrukci a soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.47	27 500,00 Kč	33 000,00 Kč	82 500,00 Kč	99 000,00 Kč
C/43	019, 021	0.15	infopanel 2	rozměry skla(šxv): 1200x2200, rozměry soklu:1000x150x200	ks	2	sklo float tl. 8 mm kotvené k ocelové konstrukci a soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.47	27 500,00 Kč	33 000,00 Kč	55 000,00 Kč	66 000,00 Kč
C/44	023, 024	0.16	infopanel 3	rozměry skla(šxv): 1200x1850, rozměry soklu:1000x150x200	ks	2	sklo float tl. 8 mm kotvené k ocelové konstrukci a soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.48	27 500,00 Kč	33 000,00 Kč	55 000,00 Kč	66 000,00 Kč
C/45	030, 031, 041, 042, 056, 057, 060, 252	0.18, 0.23c, 2.16	infopanel 4	rozměry skla(šxv): 800x2200, rozměry soklu:600x150x200	ks	8	sklo float tl. 8 mm kotvené k ocelové konstrukci a soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.49	24 200,00 Kč	29 040,00 Kč	193 600,00 Kč	232 320,00 Kč

C/46	032	0.18	infopanel 5	rozměry skla(šxv): 1500x2200, rozměry soklu:1300x150x200	ks	1	sklo float tl. 8 mm kotvené k ocelové konstrukci a soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.49	33 560,00 Kč	40 272,00 Kč	33 560,00 Kč	40 272,00 Kč
C/47	267	2.03	vitřinový stůl	rozměry celku (šxvxh): 2200x1000x2200, rozměry soklů: 200(300)x630x200	ks	1	vitřina je 4 dílná, prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do 5- ti soklů viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.39, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	298 000,00 Kč	357 600,00 Kč	298 000,00 Kč	357 600,00 Kč
C/48	231	2.19	velkoprostorová vitřina	rozměry vitřiny(šxvxh): 7490x2300x4270, rozměry soklu:7490x150x4430	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu, jednotlivé sekce jsou děleny uvnitř přepážkujícím sklem viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.35, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	586 500,00 Kč	703 800,00 Kč	586 500,00 Kč	703 800,00 Kč
C/49	107, 112, 127, 130, 135	2.42, 2.41, 2.35, 2.36, 2.37, 2.34	infopanel	rozměry skla(šxv): 1000x2350, rozměry soklu:1000x150x600	ks	5	sklo float 2 x tl. 6 mm kotvené přes ocelový plech do soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.50	30 850,00 Kč	37 020,00 Kč	154 250,00 Kč	185 100,00 Kč
C/50	117, 122	2.40, 2.39	infopanel	rozměry skla(šxv): 1000x2350, rozměry soklu:1000x150x600	ks	2	sklo float 2 x tl. 6 mm kotvené přes ocelový plech do soklu, včetně příslušenství pro uchycení AV viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.51	31 800,00 Kč	38 160,00 Kč	63 600,00 Kč	76 320,00 Kč
C/51	222, 223, 224, 225, 226, 227, 228	2.19	AV infopoint 2	rozměry skla(šxv): 450x2100	ks	7	sklo float 2 x tl. 6 mm kotvené přes ocelový plech do ocelové konstrukce soklu vitřiny 178 viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.53	19 800,00 Kč	23 760,00 Kč	138 600,00 Kč	166 320,00 Kč
C/52	186	2.28	vitřinový panel 5	rozměry vitřiny(šxvxh): 1140x350x250, rozměry skla(šxv): 200x350	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí, součástí je sklo pro zakrytí AV a osazovací trn pro uchycení sluchátek viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.31, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	33 850,00 Kč	40 620,00 Kč	33 850,00 Kč	40 620,00 Kč
C/53	196	2.27	panelová vestavba - vitřina 1	rozměry vitřiny (šxvxh): 700x350x300	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená k dřevěné kci viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.32, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	28 900,00 Kč	34 680,00 Kč	28 900,00 Kč	34 680,00 Kč
			panelová vestavba - vitřina 2	rozměry vitřiny(šxvxh): 800x350x300, rozměry skla(šxv): 200x350	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená k dřevěné kci, součástí je sklo pro zakrytí AV a osazovací trn pro uchycení sluchátek viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.32, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	31 500,00 Kč	37 800,00 Kč	31 500,00 Kč	37 800,00 Kč
C/54	178	2.26	velkoprostorová vitřina	rozměry vitřiny(šxvxh): 2400x2160x700	ks	1	vitřina je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.33, cena zahrnuje osvětlení vitřiny	134 200,00 Kč	161 040,00 Kč	134 200,00 Kč	161 040,00 Kč

C/55	180	2.26	prkenný panel s vitrinou	rozměry vitríny(šxvxh): 2100x720x300	ks	1	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.33, cena zahrnuje osvětlení vitríny	59 800,00 Kč	71 760,00 Kč	59 800,00 Kč	71 760,00 Kč
C/56	202	2.20	panel s vitrinou a zásuvkami	rozměry vitríny (šxvxh): 1400x1400x700	ks	1	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.34, cena zahrnuje osvětlení vitríny	52 600,00 Kč	63 120,00 Kč	52 600,00 Kč	63 120,00 Kč
C/57	215	2.19	solitérní vitrina	rozměry vitríny(šxvxh): 350x2050x350, rozměry soklu: 1300x400x1140	ks	1	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, kotvená do soklu viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.36	43 500,00 Kč	52 200,00 Kč	43 500,00 Kč	52 200,00 Kč
C/58	243, 246	2.18	panel s vitrinou	rozměry vitríny(šxvxh): 3050x2355x700	ks	2	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.37, cena zahrnuje osvětlení vitríny	151 200,00 Kč	181 440,00 Kč	302 400,00 Kč	362 880,00 Kč
C/59	247	2.18	panel s vitrinou	rozměry vitríny(šxvxh): 3400x2355x700	ks	1	vitrína je prachotěsná, otevíratelná a uzamykatelná, s pomocnou ocelovou konstrukcí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.38, cena zahrnuje osvětlení vitríny	154 000,00 Kč	184 800,00 Kč	154 000,00 Kč	184 800,00 Kč
C/60	134	2.21	interaktivní infopoint	rozměry skla(šxv): 800x2200, rozměry soklu: 600x150x250	ks	1	sklo na ocelové konstrukci kotvené do soklu, součástí je osazovací trn pro uchycení sluchátek viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.55	26 500,00 Kč	31 800,00 Kč	26 500,00 Kč	31 800,00 Kč
C/61	170	2.29	interaktivní pult	rozměry skla(šxh): 1000x700	ks	1	sklo tl. 6 mm položené přes pryžové podložky na kci pultu, včetně vykrytí tmavou fólií viz část C - skleněné konstrukce - výkres č.54	2 450,00 Kč	2 940,00 Kč	2 450,00 Kč	2 940,00 Kč
C/62			dílenská dokumentace skleněných konstrukcí, včetně vzorků materiálů		soubor	1		10 000,00 Kč	12 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 000,00 Kč
CELKEM	CELKOVÁ CENA ZAHNÚJE CENU ZA OSVĚTLENÍ VITRÍN, MONTÁŽ, DOPRAVU, LIKVIDACI OBALŮ A CELKOVÝ ÚKLID PŘED PŘEDÁNÍM A PŘEVZETÍM DÍLA !!!									6 644 860,00 Kč	7 973 832,00 Kč

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ

DZS

pořad. číslo	označení	číslo místnosti	popis položky	vnější rozměry (mm)	měrná jednotka	počet mj	technická poznámka	cena bez DPH/mj	cena včetně DPH/mj	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně DPH
D/1	004, 007,008, 010, 011, 013, 016	0.11, 0.12	panel s vitrinou	2200x1300 (2,86m²)	m²	20,02	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	19 219,20 Kč	23 063,04 Kč
D/2	015, 018	0.12	panel s bezpečnostní vitrinou	2200x1300 (2,86m²)	m²	5,72	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	5 491,20 Kč	6 589,44 Kč
D/3	014	0.15	panel s bezpečnostní vitrinou v nise	2200x1200 (2,64m²)	m²	2,64	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	2 534,40 Kč	3 041,28 Kč
D/4	044, 046	0.22	instalační panely	800x2100 (1,68m²)	m²	3,36	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	3 225,60 Kč	3 870,72 Kč
D/5	001	0.05	posuvný panel 1	1800x2350 (4,23m²)	m²	4,23	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	4 060,80 Kč	4 872,96 Kč
D/6	051	0.22b	posuvný panel 2	1900x2700 (5,13m²)	m²	5,13	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	4 924,80 Kč	5 909,76 Kč
D/7	152, 160	2.31, 2.30	infopanel	600x2100 (1,26m²)	m²	2,52	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	2 419,20 Kč	2 903,04 Kč
D/8	003, 101, 104	0.05, 2.01, 2.42	infopanel 1	2200x1300 (2,86m²)	m²	8,58	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	8 236,80 Kč	9 884,16 Kč
D/9	019, 021	0.15	infopanel 2	2200x1200 (2,64m²)	m²	5,28	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	5 068,80 Kč	6 082,56 Kč
D/10	023, 024	0.16	infopanel 3	1850x1200 (2,22m²)	m²	4,44	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	4 262,40 Kč	5 114,88 Kč
D/11	030, 031, 041, 042, 056, 057, 060, 252	0.18, 0.23, 2.16	infopanel 4	2200x800 (1,76 m²)	m²	14,08	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	13 516,80 Kč	16 220,16 Kč
D/12	032	0.18	infopanel 5	2200x1500 (3,3 m²)	m²	3,3	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	3 168,00 Kč	3 801,60 Kč
D/13	107, 112, 117, 122,127, 130, 135	2.42, 2.41, 2.40, 2.39, 2.35, 2.37, 2.36, 2.34	infopanel	800x1200 (0,96 m²)	m²	6,72	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	6 451,20 Kč	7 741,44 Kč
D/14	020, 053, 147, 141, 198, 206, 238	0.15, 0.23c, 2.21, 2.20, 2.18	AV infopoint	2200x800 (1,76 m²)	m²	12,32	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	11 827,20 Kč	14 192,64 Kč
D/15	222, 223, 224, 225, 226, 227, 228	2.19	AV infopoint 2	1800x450 (0,81 m²)	m²	5,67	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	5 443,20 Kč	6 531,84 Kč
D/16	134	2.21	interaktivní infopoint	2200x800 (1,76 m²)	m²	1,76	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na rubovou stranu skla	960,00 Kč	1 152,00 Kč	1 689,60 Kč	2 027,52 Kč
D/17	044	0.22	instalační panel 1	2000x2100	m²	4,2	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	5 859,00 Kč	7 030,80 Kč

D/18	046	0.22	instalační panel 2	4300x2100	m²	9,03	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	12 596,85 Kč	15 116,22 Kč
D/19	052	0.23c	panel s grafikou 1		m²	8,9	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	12 415,50 Kč	14 898,60 Kč
D/20	054	0.23b	panel s grafikou 2		m²	7,8	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	10 881,00 Kč	13 057,20 Kč
D/21	062	0.23	panel s grafikou 3		m²	6	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	8 370,00 Kč	10 044,00 Kč
D/22	063	0.23	vitrinový panel		m²	12,8	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	17 856,00 Kč	21 427,20 Kč
D/23	055	0.23b	segmentový vitrinový panel s projekci 1	vnitřní oblouk 5710 x 2300	m²	12,3	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	17 158,50 Kč	20 590,20 Kč
D/24	058	0.23a	segmentový vitrinový panel s projekci 2	vnitřní oblouk 5860 x 2300	m²	12,5	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	17 437,50 Kč	20 925,00 Kč
D/25	061	0.23	segmentový vitrinový panel 1	vnitřní oblouk 6000 x 2300	m²	13,5	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	18 832,50 Kč	22 599,00 Kč
D/26	109	2.41	instalační panel s podstavci a vitrinou		m²	17,18	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	23 966,10 Kč	28 759,32 Kč
D/27	126	2.37, 2.36	instalační panel		m²	16,25	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	22 668,75 Kč	27 202,50 Kč
D/28	102	2.42	otočný panel s grafikou		m²	6,7	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	9 346,50 Kč	11 215,80 Kč
D/29	163	2.29	instalační paneláž		m²	34,6	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	48 267,00 Kč	57 920,40 Kč
D/30	173	2.29	vitrinový panel 4		m²	16,9	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	23 575,50 Kč	28 290,60 Kč
D/31	186	2.28	vitrinový panel 5		m²	6,06	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	8 453,70 Kč	10 144,44 Kč
D/32	193	2.28	instalační paneláž s audiem		m²	30,06	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	41 933,70 Kč	50 320,44 Kč
D/33	196	2.27	panelová vestavba		m²	6,8	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	9 486,00 Kč	11 383,20 Kč
D/34	139	2.21	panely s grafikou		m²	50,38	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	70 280,10 Kč	84 336,12 Kč
D/35	145	2.21	panely s grafikou		m²	31,8	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	44 361,00 Kč	53 233,20 Kč
D/36	184	2.26	panel s grafikou		m²	10,1	velkoformátový tisk, grafika na textilií	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	14 089,50 Kč	16 907,40 Kč

D/37	199	2.20	panel s grafikou		m²	12,7	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	17 716,50 Kč	21 259,80 Kč
D/38	197	2.20	panel s grafikou		m²	14,5	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	20 227,50 Kč	24 273,00 Kč
D/39	201	2.20	panel s grafikou		m²	20,1	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	28 039,50 Kč	33 647,40 Kč
D/40	202	2.20	panel s vitrinou a zásuvkami		m²	5,14	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	7 170,30 Kč	8 604,36 Kč
D/41	216	2.19	panel s grafikou		m²	28,47	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	39 715,65 Kč	47 658,78 Kč
D/42	232	2.19	panel s grafikou		m²	59,97	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	83 658,15 Kč	100 389,78 Kč
D/43	234	2.18	instalační paneláž s grafikou		m²	21,24	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	29 629,80 Kč	35 555,76 Kč
D/44	247	2.18	panel s vitrinou		m²	16,33	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	22 780,35 Kč	27 336,42 Kč
D/45	250	2.15	panel s grafikou		m²	18	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	25 110,00 Kč	30 132,00 Kč
D/46	313	2.14	panel s grafikou	1200x2350	m²	2,82	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	3 933,90 Kč	4 720,68 Kč
D/47	308	2.14	panel s grafikou	2000x1600	m²	3,2	velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	1 395,00 Kč	1 674,00 Kč	4 464,00 Kč	5 356,80 Kč
D/48			popisky exponátů		ks	500	tisk na fólii a plastové podložky do vitrín (100ks jednotlivých, 80ks sdružených) - celkem 500 ks popisek	175,00 Kč	210,00 Kč	87 500,00 Kč	105 000,00 Kč
D/49 ¹			předpokládaný rozsah tiskové přípravy (DTP)		soubor	1	scany (do panelů s texty - A4 tisková kvalita 300 DPI, na pozadí - A4 900 DPI), sazba a zlom, korektury a retuše, výjezdy na korektury (2x-grafika a text), příprava do tisku, 500 x scan, 200 x tiskoviny (2 paré, 4 vydání), náhledy velkoplošné grafiky	151 300,00 Kč	181 560,00 Kč	151 300,00 Kč	181 560,00 Kč
							předpokládaný rozsah ostatních prací - 140 hodin	78 500,00 Kč	94 200,00 Kč	78 500,00 Kč	94 200,00 Kč
D/50 ³			návrh a zpracování podkladů pro výrobu grafiky		soubor	1	Zpracování finálních návrhů pro všechny expoziční prvky a popisky exponátů, včetně výběru písma a barevnosti, zajištění autorských práv k fotopodkladům, příprava podkladů pro DTP zpracování, supervize výstupů DTP	200 000,00 Kč	240 000,00 Kč	200 000,00 Kč	240 000,00 Kč

D/51 ²			venkovní a orientační grafika		kmplt	1	orientační systém budovy pro veřejnost (označení místností, šatny apod.), tisk ve fotokvalitě, hliníkové nosiče, montáž na distanční podložku, gravírování, 30 ks formát DL, 20 ks formát 2DL	145 000,00 Kč	174 000,00 Kč	145 000,00 Kč	174 000,00 Kč
							mobilní informační systém 10 ks, tisk ve fotokvalitě, hliníkové nosiče, montáž na distanční podložku, gravírování, formát 2DL	64 500,00 Kč	77 400,00 Kč	64 500,00 Kč	77 400,00 Kč
							opláštění venkovních nosičů 2ks, formát grafiky 800 x 2150, tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na sklo	29 800,00 Kč	35 760,00 Kč	29 800,00 Kč	35 760,00 Kč
							mobilní venkovní nosič, formát grafiky 800 x 2150, přenositelný stojan, opláštění elox s polepem	32 500,00 Kč	39 000,00 Kč	32 500,00 Kč	39 000,00 Kč
							označení budovy, formát 800 x 2150, sklo s řezanou grafikou, předsazeno před objekt, kotvení v koordinaci se stavbou, osazeno na pomocné konstrukci	22 000,00 Kč	26 400,00 Kč	22 000,00 Kč	26 400,00 Kč
							zpracování orientačního systému, podklady pro výrobu	52 000,00 Kč	62 400,00 Kč	52 000,00 Kč	62 400,00 Kč
							montáž venkovní a orientační grafiky - instalace grafiky na nosiče	32 000,00 Kč	38 400,00 Kč	32 000,00 Kč	38 400,00 Kč
							návrh a zpracování podkladů - návrh mapy celého objektu, návrh hierarchie systému označování, návrh nosičů orientačního systému, návrh označení budovy, návrh infopanelů, příprava podkladů pro DTP zpracování, supervize výstupů DTP	195 600,00 Kč	234 720,00 Kč	195 600,00 Kč	234 720,00 Kč
CELKEM										1 912 519,55 Kč	2 295 023,46 Kč

¹ předpokládaný rozsah 280 000,-Kč bez DPH

² předpokládaný rozsah 530 000,-Kč bez DPH

³ předpokládaný rozsah 240 000,-Kč bez DPH

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ

DZS

E /AV - EXPOZICE

pořad. číslo	označení	číslo místnosti	řešení	akce	popis položky	měrná jednotka	počet mj	cena bez DPH/mj	cena včetně DPH/mj	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně DPH
E/1	020	0.15	infopont	obraz i zvuk	infopoint s PC (dotyková obrazovka 22")	ks	1	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč
E/2	026	0.16	projektor na válcovou stěnu 120°	obraz i zvuk, ovládací panel	projektor s korekcí	ks	1	341 200,00 Kč	409 440,00 Kč	341 200,00 Kč	409 440,00 Kč
E/3	068	0.19	audio MP3 IR, 4 repro	zvuk	prostorové ozvučení MP3 4 repro	ks	1	49 800,00 Kč	59 760,00 Kč	49 800,00 Kč	59 760,00 Kč
E/4	058	0.23	AV projekce smyčka	obraz i zvuk	LCD 46"	ks	1	83 500,00 Kč	100 200,00 Kč	83 500,00 Kč	100 200,00 Kč
E/5	055	0.23	AV projekce smyčka, projekce 120°	obraz, ovládací panel, PIR	projektor s korekcí	ks	1	341 200,00 Kč	409 440,00 Kč	341 200,00 Kč	409 440,00 Kč
E/6	053	0.23	AV infopont se sluchátky -film	obraz i zvuk do sluchátek	infopoint s PC (dotyková obrazovka 22")	ks	1	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč
E/7	267	2.03	prostorové audio - Beethoven, PIR + ovládací panel	zvuk	prostorové ozvučení MP3 repro	ks	1	53 600,00 Kč	64 320,00 Kč	53 600,00 Kč	64 320,00 Kč
E/8		2.07	prostorové audio, Marlen Dietrich, PIR	zvuk	prostorové ozvučení MP3 repro	ks	1	53 600,00 Kč	64 320,00 Kč	53 600,00 Kč	64 320,00 Kč
E/9		2.13	prostorové audio, tikot hodin	zvuk	prostorové ozvučení MP3 repro	ks	1	53 600,00 Kč	64 320,00 Kč	53 600,00 Kč	64 320,00 Kč
E/10	314	2.14	AV, smyčka, němé dokumenty, vzpomínky, PIR	obraz i zvuk	projekce z repliky	ks	1	84 500,00 Kč	101 400,00 Kč	84 500,00 Kč	101 400,00 Kč
E/11	238	2.18	video dokument ČT čas zaniklých řemesel	obraz i zvuk sluchátka	INFOPOINT S LCD 22"	ks	1	51 800,00 Kč	62 160,00 Kč	51 800,00 Kč	62 160,00 Kč
E/12	222,223,2 24,225,22 6,227,228	2.19	zvuk do sluchátek - 7 ks	zvuk	7x náslechový bod	soubor	1	175 600,00 Kč	210 720,00 Kč	175 600,00 Kč	210 720,00 Kč
E/13	198	2.20	infopoint oblasti chrán.území	obraz i zvuk sluchátka	infopoint s PC (dotyková obrazovka 22")	ks	1	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč
E/14	200	2.20	prostorové audio MP3, zpěv ptáků, pákové ovladače	zvuk -zpěv ptáků	smyčka PIR	ks	1	73 500,00 Kč	88 200,00 Kč	73 500,00 Kč	88 200,00 Kč
E/15	206	2.20	dokument o přírodě Třebíčska	obraz	INFOPOINT S LCD 22"	ks	1	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč
E/16	208	2.20	monokular antivandal provedení v kovovém tubusu na stativu, pevné ohnisko	pohled na krajinu	dalekohled	ks	1	85 500,00 Kč	102 600,00 Kč	85 500,00 Kč	102 600,00 Kč
E/17	147	2.21	Infopoint k betlémům	obraz	infopoint s PC (dotyková obrazovka 22")	ks	1	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč
E/18	141	2.21	infopint sbírky malby a grafiky	obraz	infopoint s PC (dotyková obrazovka 22")	ks	1	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč	52 500,00 Kč	63 000,00 Kč
E/19	134	2.21	infopoint mapa míst Třebíčska	zvuk sluchátka	INFOPOINT S LCD 22"	ks	1	51 800,00 Kč	62 160,00 Kč	51 800,00 Kč	62 160,00 Kč
E/20		2.26	prostorové audio MP3, čapková sbírka NpM, PIR	zvuk	prostorové ozvučení MP3 repro	ks	1	45 600,00 Kč	54 720,00 Kč	45 600,00 Kč	54 720,00 Kč
E/21	196	2.27	audio MP3, hlas Zahradníčka, Fučíka, PIR	zvuk	náslechový bod	ks	1	45 600,00 Kč	54 720,00 Kč	45 600,00 Kč	54 720,00 Kč
E/22	186	2.28	MP3 sluchátka, recitace	zvuk interakce	náslechový bod	ks	1	45 600,00 Kč	54 720,00 Kč	45 600,00 Kč	54 720,00 Kč
E/23		2.28	prostorové audio, V+W střídání socialistikou písní, PIR	zvuk	prostorové ozvučení MP3 repro	ks	1	42 500,00 Kč	51 000,00 Kč	42 500,00 Kč	51 000,00 Kč
E/24	170	2.29	interaktivní pult s katastrální mapou města, stavební etapy, památky, vývoj architektury	stůl s obrazovkou pod sklem, dotykové ovládání	LCD 32" PC, kapacitní folie profil grafický počítač	ks	1	80 500,00 Kč 34 500,00 Kč 34 500,00 Kč	96 600,00 Kč	80 500,00 Kč	96 600,00 Kč
E/25	166	2.29	monokular antivandal provedení v kovovém tubusu na stativu, pevné ohnisko	pohled na město	dalekohled	ks	1	68 500,00 Kč	82 200,00 Kč	68 500,00 Kč	82 200,00 Kč
E/26		2.36	prostorové audio židovské motivy		prostorové ozvučení MP3 repro	ks	1	42 500,00 Kč	51 000,00 Kč	42 500,00 Kč	51 000,00 Kč
E/27	122	2.39	audio barokní hudba	zvuk	náslechový bod	ks	1	42 500,00 Kč	51 000,00 Kč	42 500,00 Kč	51 000,00 Kč
E/28	117	2.40	audio - 7skladeb	zvuk	náslechový bod	ks	1	42 500,00 Kč	51 000,00 Kč	42 500,00 Kč	51 000,00 Kč
E/29		2.41	audio gregoriánský chorál	zvuk	prostorové ozvučení MP3 repro	ks	1	42 500,00 Kč	51 000,00 Kč	42 500,00 Kč	51 000,00 Kč
E/30			instalace		V ceně instalace je zahrnuta likvidace obalů a celkový úklid před předáním a převzetím díla	soubor	1	75 600,00 Kč	90 720,00 Kč	75 600,00 Kč	90 720,00 Kč

E/31		doprava		soubor	1	45 000,00 Kč	54 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 000,00 Kč
E/32		dílečná dokumentace		soubor	1	60 000,00 Kč	72 000,00 Kč	60 000,00 Kč	72 000,00 Kč
CELKEM								2 493 100,00 Kč	2 991 720,00 Kč

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ

DZS

F / OSVĚTLENÍ

pořad. číslo	označení	popis položky	měrná jednotka	počet mj	cena bez DPH/mj	cena včetně DPH/mj	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně DPH
F/1	S1	Atypické na míru konstruované vnitřní osvětlení vitrín a podobných konstrukčních prvků či exponátů. Poloha svítidla je schematicky zakreslena ve výkresech skleněných konstrukcí. Pro většinu vitrín je použit systém s horním osvětlením rámem nebo asymetrickým svítidlem s výkonovou LED (960lm/m,24W/m) a s vodorovnou difúzní linkou pod každou polici se středně výkonou LED (212lm/m, 7,4W/m). Šířka vyzařovaného svazku a clonění bude vždy vyrobeno a upraveno na míru dle konečného rozměru vitrín a dle typu vystavovaného osvětlovaného exponátu. Intenzita regulovatelná. Cena zahrnuje napájecí drivery a systém PWM stmívání. Svítidla S1 se krom skleněných konstrukcí nachází ještě ve výkresech osvětlení v místnosti 0,23 kde budou použity stranou svítící LED a v místnostech 0,18 a 0,19 kde jsou výkonové LED pro osvětlení náhrobků a 0,21 kde jsou umístěny středně výkonné LED v zábradlí pro osvětlení rampy pro imobilní.	m	40,40	4 030,00 Kč	4 836,00 Kč	162 812,00 Kč	195 374,40 Kč
F/2	D1	Regulovatelná svítidla s digitálním multiwattovým 28/54W předřadníkem DALI umístěna převážně za okraj panelů, případně v nikách pro podsvětlování panelů a difúzní osvětlení prostoru.	ks	20	3 200,00 Kč	3 840,00 Kč	64 000,00 Kč	76 800,00 Kč
F/3	D2	Regulovatelná svítidla s digitálním multiwattovým 35/80W předřadníkem DALI umístěna převážně za okraj panelů, případně v nikách pro podsvětlování panelů a difúzní osvětlení prostoru.	ks	32	3 400,00 Kč	4 080,00 Kč	108 800,00 Kč	130 560,00 Kč
F/4	D3	Regulovatelná svítidla s digitálním multiwattovým 21/39W předřadníkem DALI umístěna převážně za okraj panelů, případně v nikách pro podsvětlování panelů a difúzní osvětlení prostoru.	ks	21	3 300,00 Kč	3 960,00 Kč	69 300,00 Kč	83 160,00 Kč
F/5	D4	Regulovatelná svítidla s digitálním multiwattovým 14/24W předřadníkem DALI umístěna převážně za okraj panelů, případně v nikách pro podsvětlování panelů a difúzní osvětlení prostoru.	ks	9	3 500,00 Kč	4 200,00 Kč	31 500,00 Kč	37 800,00 Kč
F/6	E2	Nástěnná svítidla T16 - 39W s elektronickým předřadníkem, určená pro celkové přímo nepřímé osvětlení prostorů.	ks	5	14 500,00 Kč	17 400,00 Kč	72 500,00 Kč	87 000,00 Kč
F/7	S6	Nosný a napájecí systém určený pro reflektory směrového osvětlení expozice. Systém sestává z přísazených či zavěšených či podhledových tříkruhových lišt určených pro více reflektorů a samostatných bází určených pro jeden reflektor. Lišty v různých délkách (1m, 2m, 3m a 4m) budou zakráceny na míru zvolenému umístění. Cena zahrnuje všechny potřebné komponenty systému (koncovky, spojky, rohy, křížení, závěsy, napájení a příchytky).	ks	23	980,00 Kč	1 176,00 Kč	22 540,00 Kč	27 048,00 Kč
			m	146	2 080,00 Kč	2 496,00 Kč	303 680,00 Kč	364 416,00 Kč
F/8	S7	Stmívatelný směrový reflektor určený pro osvětlení expozice. Předpoklad: každý reflektor bude osazen v průměru jedním (někde více najednou) příslušenstvím upravujícím charakter vyzařovaného svazku (Fresnelova čočka, IRC nebo UV filtr, difúzní filtr, barevný filtr, konverzní filtr, vnější či vnitřní či boční clona). Cena zahrnuje svítidlo včetně všech potřebných příslušenství a světelných zdrojů.	ks	196	7 800,00 Kč	9 360,00 Kč	1 528 800,00 Kč	1 834 560,00 Kč
F/9	S9	Bodové směrovatelné zemní LED svítidlo určené pro osvětlení architektonických detailů historické části stavby. Ke svítidlu přísluší nosné zemní pouzdro zvolené z nabízených variant, dle finálního průzkumu podmínek umístění.	ks	14	12 300,00 Kč	14 760,00 Kč	172 200,00 Kč	206 640,00 Kč
F/10	S15	Vicereflektorové svítidlo určené pro osvětlení expozice umístěné na stěně. Součástí ceny svítidla jsou světelné zdroje a jedno příslušenství pro úpravu vyzařovaného svazku.	ks	6	17 500,00 Kč	21 000,00 Kč	105 000,00 Kč	126 000,00 Kč
F/11	S21	Směrovatelný LED reflektor se světelným tokem 155 lumen. Šířka vyzařovaného svazku a clonění bude vždy zvolena na míru dle konečného rozměru vitrín a dle typu vystavovaného osvětlovaného exponátu. Použité LED budou mít výrobcem deklarovaný index barevného podání Ra>80 a světelný tok dle architektem požadovaných osvětleností. V univerzálních vitrínách bude teple bílá. Intenzita regulovatelná. Cena zahrnuje napájecí drivery a systém PWM stmívání.	ks	11	2 450,00 Kč	2 940,00 Kč	26 950,00 Kč	32 340,00 Kč
F/12	S22	Atypické zavěšené kruhové svítidlo osazené 14 ks (22 ks) LED směrovatelnými reflektory á 2,5W. Návrh sestává z 5 svítidel o průměru 1,3m a 3 svítidel o průměru 1,8m.	ks	8	71 300,00 Kč	85 560,00 Kč	570 400,00 Kč	684 480,00 Kč
F/13	S23	Nepřímé stmívatelné svítidlo s DALI řízením 2x26W ve stropě soklu vitríny.	ks	1	8 200,00 Kč	9 840,00 Kč	8 200,00 Kč	9 840,00 Kč
F/14	S11	Historizující lustr velký, střední a malý. Typ podléhá schválení zástupců památkové péče.	ks	8	84 200,00 Kč	101 040,00 Kč	673 600,00 Kč	808 320,00 Kč

F/15	S12	Nástěnné svítidlo k historizujícímu lustru. Typ podléhá schválení zástupců památkové péče.	ks	5	24 500,00 Kč	29 400,00 Kč	122 500,00 Kč	147 000,00 Kč
CELKEM	CELKOVÁ CENA Zahrnuje cenu za montáž, dopravu a likvidaci obalů a celkový uklid před předáním a převzetím díla!!!						4 042 782,00 Kč	4 851 338,40 Kč

Náplň AV techniky

pořadové číslo	číslo prvku	číslo místnosti	popis položky	měrná jednotka	počet	výroba (cena bez DPH)	výroba (cena včetně DPH)	autorská práva (cena bez DPH)	autorská práva (cena včetně DPH)
1	020	0.15	Infopoint minerály	ks	1	96 000	115 200	4 000	4 800
2	026	0.16	Smyčka minerály	ks	1	98 500	118 200	4 000	4 800
3	068	0.18, 0.19, 0.22	Audioprostor klášter	ks	1	40 000	48 000	250	300
4	058	0.23a	Třebíč - digitální model vývoje kláštera	ks	1	98 500	118 200	1 500	1 800
5	055	0.23b	Projekce - 50. léta - klášter	ks	1	40 000	48 000	250	300
6	053	0.23c	Audioprogram - sluchátka, klášter	ks	1	40 000	48 000	250	300
7	267	2.03	Audioprostor zámek - Beethoven	ks	1	40 000	48 000	250	300
8	prostorové ozvučení MP3 repro	2.07	Audioprostor zámek - Dietrich	ks	1	38 500	46 200	250	300
9	314 a 310	2.14	Projekce zámek	ks	1	85 000	102 000	2 000	2 400
10	prostorové ozvučení MP3 repro	2.13	Audioprostor zámek - hodiny	ks	1	35 000	42 000	200	240
11	314	2.14	Audioprostor zámek - vzpomínky odsun	ks	1	35 000	42 000	250	300
12	prostorové ozvučení MP3 repro	2.41	Audioprostor muzeum - svátek sv. Václava	ks	1	35 000	42 000	250	300
13	prostorové ozvučení MP3 repro	2.36-2.37	Audioprostor muzeum - Synagogue chants	ks	1	35 000	42 000	250	300
14	117	2.40	Sluchátka muzeum - Písně Jednoty bratrské	ks	1	35 000	42 000	250	300
15	122	2.39	Sluchátka muzeum - Rovenský, Václav, Michna	ks	1	35 000	42 000	250	300
16	147	2.21	Infopoint betlémy	ks	1	96 000	115 200	1 500	1 800
17	141	2.21	Infopoint umění	ks	1	96 800	116 160	1 500	1 800
18	134	2.21	Audioprogram muzeum - zvony, mapa	ks	1	50 000	60 000	1 500	1 800
19	170	2.29	Muzeum architektura - interaktivní PC program	ks	1	62 000	74 400	1 000	1 200
20	193	2.28	Audioprostor muzeum - V + W, písně přelomu 40. a 50. let	ks	1	30 000	36 000	250	300
21	186	2.28	Sluchátka muzeum - recitace básní, Edison	ks	1	35 000	42 000	250	300
22	196	2.27	Sluchátka muzeum - Zahradníček, Fučík	ks	1	35 000	42 000	250	300
23	200	2.20	Audioprogram muzeum - strom	ks	1	35 000	42 000	250	300
24	206	2.20	Smyčka příroda - Mohelno včetně dotáček v rozsahu cca 5 hodin	ks	1	35 000	42 000	200	240
25	198	2.20	Infopoint příroda	ks	1	98 500	118 200	2 000	2 400
26	prostorové audio	2.19	Audioprostor muzeum - militaria	ks	1	35 000	42 000	250	300
27	222 - 228	2.19	Sluchátka muzeum - militaria	ks	7	35 000	42 000	250	300
28	238	2.18	Projekce muzeum - výběr z cyklu dokumentů	ks	1	40 000	48 000	500	600
29	prostorové ozvučení MP3 repro	2.26	Audioprostor muzeum - Čapkovy nahrávky etnické hudby	ks	1	35 000	42 000	250	300
CELKEM						1 504 800	1 805 760	24 150	28 980

Celkem výroba a autorská práva (v Kč bez DPH)
 Celkem výroba a autorská práva (v Kč s DPH 20 %)

1 528 950
 1 834 740

ZÁMEK TŘEBÍČ - MODERNIZACE ZÁMKU A ZPŘÍSTUPNĚNÍ NOVÝCH EXPOZIC

SO 03 Veřejný interiér

č. prvku	název dle DZS	vnější rozměry (šxv)xh	m.j.	počet	cena za měrnou jednotku	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH	technická poznámka
----------	---------------	------------------------	------	-------	-------------------------	--------------	---------	------------	--------------------

OBJEKT č. 1.01 - VSTUPNÍ HALA

VEM									
1.01/1	infopanel	1000 x 2350 x 200	ks	1	34 500 Kč	34 500 Kč	6 900 Kč	41 400 Kč	panel se sklem na soklu, grafika lepená
VOM									
1.01/1	volné sezení 1	1500 x 450 x 450	ks	0	22 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	modulový čalouněný sedací blok, povrch kůže, nosná ocelová konstrukce

OBJEKT č. 1.02a - RECEPCE MUZEA, ŠATNA 1, VESTAVĚNÁ SKLENĚNÁ VITRINA

VEM									
1.02/1	recepce s šatnou a vestavěnou vitrinou	viz. výkresy 3.04 a 3.05	ks	1	1 185 600 Kč	1 185 601 Kč	237 120 Kč	1 422 721 Kč	atypický volně stojící objekt
VOM									
1.02/1	volné sezení 1	1500 x 450 x 450	ks	2	22 450 Kč	44 900 Kč	8 980 Kč	53 880 Kč	modulový čalouněný sedací blok, povrch kůže, nosná ocelová konstrukce
1.02/3	kontejner šatní	1200 x 570 x 500	ks	3	42 500 Kč	127 500 Kč	25 500 Kč	153 000 Kč	tvarovaná konstrukce z kompaktního materiálu, kolečka
1.02/4	židle kancelářská	630 x 1160 x 520	ks	2	10 350 Kč	20 700 Kč	4 140 Kč	24 840 Kč	pracovní židle ergonomicky nastavitelná s kolečky, včetně područek

OBJEKT č. 1.02b - MUZEJNÍ KAVÁRNA

VEM									
1.02/2	systém instalačních rámu	700 x 1000	ks	7	1 980 Kč	1 987 Kč	397 Kč	2 384 Kč	ALU rámy se sklem závěsné
VOM									
1.02/5	židle kavárenská	590 x 820 x 400	ks	35 (18 ks bílá, 17 ks oranžová)	2 950 Kč	103 250 Kč	20 650 Kč	123 900 Kč	plastový sedák, chrom nohy
1.02/6	stůl kavárenský	700 x 720	ks	9	6 450 Kč	58 050 Kč	11 610 Kč	69 660 Kč	kruhový stůl s ocelovou nohou, deska kompaktní
1.02/7	věšák na šaty	400 x 1800	ks	1	4 200 Kč	4 200 Kč	840 Kč	5 040 Kč	stojanový věšák na oděvy z masivního dřeva ohýbaného, moření černé
1.02/9	koš odpadkový	350 x 290	ks	2	395 Kč	790 Kč	158 Kč	948 Kč	kovové pletivo s úpravou práškovým nátěrkem

OBJEKT č. 1.05a - ŠATNA 2

VEM									
1.05/1	šatní skříň otočná	1400 x 1975 x 600	ks	4	79 600 Kč	318 400 Kč	63 680 Kč	382 080 Kč	tvarovaná konstrukce z kompaktního materiálu otočná, uzamykatelná
VOM									
1.05/1	kontejner šatní	1200 x 570 x 500	ks	0	31 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	tvarovaná konstrukce z kompaktního materiálu otočná

OBJEKT č. 1.05b - SALÓNEK

VOM									
1.05/3	židle kavárenská	590 x 820 x 400	ks	8	2 950 Kč	23 600 Kč	4 720 Kč	28 320 Kč	plastový sedák, chrom nohy
1.05/4	stůl kavárenský	700 x 720	ks	2	6 450 Kč	12 900 Kč	2 580 Kč	15 480 Kč	kruhový stůl s ocelovou nohou, deska kompaktní
1.05/5	věšák na šaty	400 x 1800	ks	1	4 200 Kč	4 200 Kč	840 Kč	5 040 Kč	stojanový věšák na oděvy z masivního dřeva ohýbaného, moření černé

OBJEKT č. 1.08 - BAR

VEM									
1.08/1	barová sestava	viz výkresy 3.07 a 3.08	ks	1	468 500 Kč	468 500 Kč	93 700 Kč	562 200 Kč	atypický objekt
	zápultí baru		ks	1	49 500 Kč	49 500 Kč	9 900 Kč	59 400 Kč	

	osvětlení baru		ks	1	21 500 Kč	21 500 Kč	4 300 Kč	25 800 Kč	
	1. Nerez dřez pro spodní zabudování včetně sifonu		ks	1	14 500 Kč	14 500 Kč	2 900 Kč	17 400 Kč	
	2. Páková baterie, chrom		ks	1	12 000 Kč	12 000 Kč	2 400 Kč	14 400 Kč	
1.08/3	skleněný obklad s otvácím křídlem		ks	1	36 800 Kč	36 800 Kč	7 360 Kč	44 160 Kč	rámová kce se skleněným obkladem otvíratelná

OBJEKT Č. 1.10 - MULTIFUNKČNÍ SÁL (SEDLÁRNA)

VEM									
1.10/3	závěs na tyči	délka tyče:cca 3500 mm výška závěsu: cca 3500 mm	ks	3	18 500 Kč	55 500 Kč	11 100 Kč	66 600 Kč	textilie interiérová bavlna/polyester barva: šedo-bílo- béžová tyč nerez
VOM									
1.10/1	židle stohovatelná	435 x 790 x 525	ks	12	3 750 Kč	45 000 Kč	9 000 Kč	54 000 Kč	sedák polyuretanový měkký tvarovaný, nohy ocel/ALU, stohovatelná
1.10/2	stůl konferenční	750 x 720 x 750	ks	12	8 800 Kč	105 600 Kč	21 120 Kč	126 720 Kč	stůl s ocelovými /ALU nohami a čtvercovou kompaktní deskou
1.10/3	PC stůl	1200 x 720x 600	ks	2	5 400 Kč	10 800 Kč	2 160 Kč	12 960 Kč	stůl - ocelový rám, A nohy, deska dřevotřísková, melaminová fólie
1.10/5	koš odpadkový	350 x 290	ks	1	395 Kč	395 Kč	79 Kč	474 Kč	kovové pleťivo s úpravou práškovou barvou

OBJEKT Č. 1.11 - SÁL KRÁTKODOBÝCH VÝSTAV (KONÍRNA)

VEM									
1.11/1	expoziční systém nástěnný	18022 x 2500 x 419	kpl	1	545 000 Kč	545 000 Kč	109 000 Kč	654 000 Kč	nástěnné panely se soklem a otevíravými panely
1.11/2	stínící roleta		ks	7	7 800 Kč	54 600 Kč	10 920 Kč	65 520 Kč	roleta látková stínící ovládání manuální
VOM									
1.11/1	expoziční systém mobilní	2000 x 2500 x 1000	ks	7	87 500 Kč	612 500 Kč	122 500 Kč	735 000 Kč	panely vetknuté do roznašecích bází, báze jsou podsvícené
1.11/2	mobilní recepcie	635 x 1150 x 500	ks	1	69 500 Kč	69 500 Kč	13 900 Kč	83 400 Kč	samostatný objekt z kompaktního materiálu podsvícený, kolečka s brzdou
1.11/5	věšák na šaty	400 x 1800	ks	1	4 200 Kč	4 200 Kč	840 Kč	5 040 Kč	stojanový věšák na oděvy z masivního dřeva ohýbeného, moření černé
1.11/6	koš odpadkový	350 x 290	ks	1	395 Kč	395 Kč	79 Kč	474 Kč	kovové pleťivo s úpravou práškovou barvou

OBJEKT Č. 1.19 - ZÁZEMÍ PRO MATKY S DĚTMI

VEM									
1.19/1	přebalovací pult	viz výkres 3.13	ks	1	28 500 Kč	28 500 Kč	5 700 Kč	34 200 Kč	spolu s umyvadlem je součástí desky ve tvaru L z kompaktního materiálu
1.19/3	kuchyňská linka	2400 x 2000 x 600	ks	1	97 500 Kč	97 500 Kč	19 500 Kč	117 000 Kč	zavěšená, povrch dýha/compactní materiál, včetně skleněného obkladu příčky
	1. Nerez dřez pro spodní zabudování včetně nerez odpadu		ks	1	8 900 Kč	8 900 Kč	1 780 Kč	10 680 Kč	
	2. Páková baterie , chrom		ks	1	11 000 Kč	11 000 Kč	2 200 Kč	13 200 Kč	
1.19/4	gastro vybavení kuch. linky		ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	1. Odpadkový koš s víkem	250 x 300 x 170	ks	1	420 Kč	420 Kč	84 Kč	504 Kč	
	2. chladnička vestavná MINI	480 x 510 x 430	ks	1	4 100 Kč	4 100 Kč	820 Kč	4 920 Kč	
	3. Mikrovlnná trouba	462 X 280 X 320	ks	1	3 800 Kč	3 800 Kč	760 Kč	4 560 Kč	
VOM									
1.19/1	židle stohovatelná	435 x 790 x 525	ks	4	3 750 Kč	15 000 Kč	3 000 Kč	18 000 Kč	sedák polyuretanový měkký tvarovaný, nohy ocel/ALU stohovatelná
1.19/3	stůl jídelní	700 x 720	ks	1	4 850 Kč	4 850 Kč	970 Kč	5 820 Kč	kruhový stůl se čtyřmi nohami, deska compactní, barva černá
1.19/4	židle dětská	390 x 670 x 260	ks	4	480 Kč	1 920 Kč	384 Kč	2 304 Kč	židle dětská plast/dřevo
1.19/5	stolek dětský	850 x 480 x 850	ks	1	780 Kč	780 Kč	156 Kč	936 Kč	stolek dětský plast/dřevo
1.19/6	židle jídelní dětská	580 x 1020 x 880	ks	1	1 850 Kč	1 850 Kč	370 Kč	2 220 Kč	skladací, plast, kov, bezpečnostní pás, táč, polohovatelná opěrka, pro děti ve věku od 6 měsíců
DOPLŇKY									

D 1	zásobník papírových ručníků	300 x 304 x 134	ks	1	2 600 Kč	2 600 Kč	520 Kč	3 120 Kč	nástěnný, nerez provedení
D 2	dávkovač tekutého mýdla	100 x 304 x 134	ks	1	2 900 Kč	2 900 Kč	580 Kč	3 480 Kč	nástěnný, nerez provedení
D 4	odpadkový koš - malý	356 x 457 x 152	ks	1	2 400 Kč	2 400 Kč	480 Kč	2 880 Kč	nástěnný, nerez provedení

OBJEKT č. 1.20 - VEŘEJNÁ STUDOVNA

VEM									
1.20/1	vestavěná knihovna 1	950 x 1650 x 408	ks	1	17 500	17 500 Kč	3 500 Kč	21 000 Kč	závěsná knihovni vitrína
1.20/2	vestavěná knihovna 2	1130 x 1650 x 408	ks	1	19 850	19 850 Kč	3 970 Kč	23 820 Kč	závěsná knihovni vitrína
VOM									
1.20/1	židle stohovatelná	435 x 790 x 525	ks	12	3 700	44 400 Kč	8 880 Kč	53 280 Kč	sedák polyuretanový měkký tvarovaný, nohy ocel/ALU stohovatelná
1.20/2	stůl pracovní	1600 x 720 x 600	ks	6	4 600	27 600 Kč	5 520 Kč	33 120 Kč	stůl, deska dřevotřísková, melaminová folie, nohy ocel
1.20/3	židle dětská polohovatelná	480 x 840 x 500	ks	4	2 100	8 400 Kč	1 680 Kč	10 080 Kč	židle dětská polohovatelná dřevo masiv
1.20/4	stolek dětský polohovatelný	1000 x 650-930 x 590	ks	1	1 950	1 950 Kč	390 Kč	2 340 Kč	stolek dětský polohovatelný dřevo masiv
1.20/7	koš odpadkový	350 x 290	ks	1	3 700 Kč	3 700 Kč	740 Kč	4 440 Kč	kovové pletivo s úpravou práškovou barvou

2.NP

OBJEKT č. 2.02 - KAMENNÝ SÁL

VOM									
2.02 /1	židle čalouněná stohovatelná do kamenného sálu	500 x 950 x 460	ks	150	8 000 Kč	1 200 000 Kč	240 000 Kč	1 440 000 Kč	dřevěná židle čalouněná, stohovatelná do historického interiéru

OBJEKT č.2.16- ZÁZEMÍ KAMENNÉHO SÁLU

VEM									
2.16 /1	zrcadlo	500 x 1800	ks	2	2 400 Kč	4 800 Kč	960 Kč	5 760 Kč	zrcadlo lepené
2.16/2	posuvné panely	viz výkres 3.16	ks	1	147 500 Kč	147 500 Kč	29 500 Kč	177 000 Kč	voštinová kce, nástřik RAL 9011, na pojezdech, uzamykatelné
VOM									
2.16 /4	stojan mobilní	1000-1800 x 1200 - 2000	ks	3	14 200 Kč	42 600 Kč	8 520 Kč	51 120 Kč	kovová konstrukce z oválných trubek, 4 kolečka (2 z nich opatřena brzdou)
2.16 /5	volné sezení 1	1500 x 450 x 450	ks	2	22 500 Kč	45 000 Kč	9 000 Kč	54 000 Kč	modulový čalouněný sedací blok, povrch kůže, nosná ocelová konstrukce
2.16/6	paravan	800(x2) x 1800	ks	1	4 200 Kč	4 200 Kč	840 Kč	5 040 Kč	paravan dřevěný skládací přemístitelný, jilm, bříza, výplň textil
2.16 /10	koš odpadkový	350 x 290	ks	1	370 Kč	370 Kč	74 Kč	444 Kč	kovové pletivo s úpravou práškovou barvou

Montáž+doprava+likvidace obalů a celkový úklid před předáním a převzetím díla + zakrytí a ochrana památky proti poškození po dobu instalace veřejných interiérů ZAHRNUTA V CENĚ VÝROBKU									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CELKEM

5 801 258 Kč

1 160 252 Kč

6 961 510 Kč

Harmonogram prací Třebíč

fakturace		2 0 1 2 2 0 1 3															
část projektu	rozsah	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
vstupní hala	montáže																
	volný																
recepce	zabudovaný nábytek																
	volný nábytek																
kavárna	zabudovaný nábytek																
	volný nábytek																
kuchyňka ,přebalovací pult	zabudovaný																
šatna	zabudovaný nábytek																
salonek	nábytek																
bar	zabudovaný nábytek																
	zapojení																
multifunkční sál	sedací nábytek																
	ostatní																
konírna	expoziční systémy																
	instalace																
zázemí	zabudovaný nábytek																
	volný mobiliář																
veřejná studovna	pevný nábytek																
	volný mobiliář																
kamenný sál	volný mobiliář																
	instalace ostatní																
stavba	projekt																
	realizace																
Avprogram	příprava koncept																
	realIZACE																
AV technika expozice	koncept																
	dodávka																
svítidla	koncept																
	dodávka																
skleněné konstrukce	koncept																
	realizace																
grafické prvky	návrh realizace instalace																
fakturace																	

smlouva

Vysvětlivky:

* Počet sloupců jednotlivých měsíců je roven počtu týdnů

* fakturace na jednotlivé části měsíčně dle objemu prací na základě dohody se zadavatelem

X označení fakturace

NÁPLNĚ AV TECHNIKY – PODKLADY PRO VÝROBU

Specifikace předmětu zakázky

Obecné požadavky

Pro všechny infopointy:

Prvotní naplnění obsahu zajistí dodavatel, obsah bude uložen ve formátu, který umožní pozdější doplnění a editaci obsahu zadavatelem, což bude zajištěno pomocí uživatelsky přívětivého administrátorského přístupu pro zadavatele. Předpoklad je zajištění cca 2000 nových snímků (v období cca 8/2012 až 7/2013) v digitálním formátu optimalizovaných pro zobrazení na zařízeních o nativním rozlišení Full HD 1920x1080 bodů. Bližší upřesnění je v konkrétním zadání pro jednotlivé expozice.

Infopointy budou připraveny pro budoucí doplnění dalších jazykových mutací obsahu. Záměrem je připojit infopointy do počítačové sítě LAN, přes kterou je bude možné spravovat a administrovat.

U všech dodávek, u kterých je mluvený komentář, bude součástí dodávky i tento komentář zpracovaný v textové podobě.

Veškerý nově pořizovaný video obsah bude zpracován ve Full HD, rozlišení 1920x1080 bodů v běžně editovatelném kodeku a formátu (například MPEG2). Starší použitý video obsah a fotografie budou optimalizovány pro rozlišení Full HD, 1920x1080 bodů. Veškerý nově pořizovaný audio obsah, bude dodán ve formátu MP3 (minimální kvalita 192kbit, 44100Hz).

Publicita:

vzhledem k podpoře projektu z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod je nutno uvést informaci o podpoře projektu zařazenou v závěru vizuálních prezentací a logo ROP Jihovýchod a vlajku EU s 3 větami (dle Pravidel pro publicitu – verze 1.3) na úvodní dotykové obrazovky PC, na kterých si návštěvníci budou volit konkrétní zvukové / obrazové výstupy.

Konkrétní zadání pro jednotlivé části expozice

I.

EXPOZICE MINERALOGICKÁ

Místnost č. 0.15 a 0.16 Svět neživé přírody

Vltavíny – Infopoint Minerály (pro prvek č. 020)

Kombinace obrazu, zvuku, souběžně obraz i zvuk (100% překryv); obraz převážně v podobě slide-show. Infopoint tematicky sleduje a rozšiřuje expozici vltavínů (podrobnější rozsah textů, mapky, snímky lokalit, snímky reálných přírodnin). Jedná se o:

PC program – kapacitně umožňující řádné fungování při vložení 75 normostran textu dodaných zadavatelem a 400 snímků. Dodavatel připraví prostředí, strukturu i datové úložiště, zapracuje dodaná data od zadavatele a předá zadavateli v otevřené podobě v rozsahu cca 75 normostran textu, a 160 snímků (dodaných dodavatelem) s přístupovými právy tak, aby se daly další informace postupně vkládat i v budoucnosti.

Infopoint bude připraven tak, že na obrazovce poběží smyčka cca 40 vybraných snímků z mineralogické sbírky a při dotyku na displej by se objevilo menu, viz struktura níže, zbývajících 120 snímků (přibližně 5 map, 20 snímků z terénu, zbytek z muzejních sbírek) zajistí dodavatel, jednotlivé úrovně jsou propojené, odkaz na tentýž snímek se objeví v několika úrovních.

Od druhé úrovně (A, B, C) má každá položka uvedená v menu svůj minimální obsah (nejedná se tedy pouze o mezikrok). Obsah je ve formě vzájemné provázanosti textu se snímky.

STRUKTURA INFOPOINTU MINERÁLY

Členění položek menu – viz příloha A – Infopoint minerály.

1) Skla

- A. Podstata skla
- B. Rozdělení skel
- C. Přírodní skla
 - I. Sopečná skla
 - II. Skla impaktového původu
 - 1. Tektity

- a. historie objevu
- b. vlastnosti
 - i. morfologie
 - ii. fyzikální vlastnosti
 - iii. vnitřní struktura
 - iv. chemické složení
- c. druhy
 - i. vltavíny
 - ii. australsko – asijské
 - iii. severoamerické
 - iv. ivority
 - v. irgizity
 - vi. urengoity
 - vii. haitská skla

2. Impaktová skla (vzniklá v místě dopadu)

III. Fulgurity

IV. Ostatní

D. Antropogenní

- I. Sklářství
- II. Vedlejší produkty – struska
- III. Pseudofulgurity
- IV. Skla jaderných testů

2) Tektity

A. Historie objevu

B. Vlastnosti

- I. Morfologie
- II. Fyzikální vlastnosti
- III. Vnitřní struktura
- IV. Chemické složení

C. Druhy

- I. vltavíny
- II. australsko – asijské
- III. severoamerické
- IV. ivority
- V. irgizity
- VI. urengoity

VII. VII. haitská skla

D. Vznik

3) Vltavíny

A. Vznik vltavínů

I. Kráter Ries

II. Transport do sedimentů

III. Skulptace

B. Naleziště vltavínů (řešit mapou - mapa s možností zobrazení v různém měřítku, kterou vytvoří dodavatel po konzultaci se zadavatelem)

I. Kráter Ries

II. Jihočeské

III. Moravské

IV. Chebské

V. Rakousko

VI. Lužice

C. Sběratelství a využití

I. Pravěké využití

II. Sběratelství

III. Šperkové využití

IV. Těžba (včetně nelegální)

Smyčka minerály (pro prvek č. 026)

Jedná se o prezentaci ve filmové podobě, animované, slide-show atd., tyto formy budou kombinovány (ve vyváženém a divácky atraktivním poměru podléhajícím souhlasu zadavatele). Bude zvolena forma animovaného filmu, který bude „prolínán“ záběry na reálné geologické děje (např. sopečná činnost) a reálný materiál (vrásky, vzorky hornin apod.). Prezentace je rozdělena do čtyř relativně samostatných celků. Tyto celky musí být technicky pojaty odlišně tak, aby bylo možno je prezentovat odděleně. Délka „prezentace“ je celkem do 16 minut.

Animovaný film (v Full HD kvalitě, rozlišení 1920x1080), prolínání animace a reálných záběrů, 4 x od 2 do 4 minut, celkem maximálně 16 minut s tím, že délka jednotlivých dílů může být různá. Mluvený komentář na profesionální úrovni, text komentáře dodá zadavatel.

Musí obsahovat animaci i reálné scény z následujících tematických okruhů:

A. Geologická historie Země

1. Vznik sluneční soustavy

- mlhovina, její smršťování, protoslunce, Slunce, planetesimály, sluneční soustava, planety, asteroidy, komety,
- meteority (reálný materiál).

2. Prekambrium – hadean

- akrece zemského tělesa, bombardování z vesmíru, roztavení zemského tělesa, vznik zemských vrstev
- vznik Měsíce,
- prvotní oceány a atmosféra,
- nejstarší horniny (reálný materiál),
- vznik života, chemické fosilie.

3. Prekambrium – archaikum

- rozvoj života, růst obsahu kyslíku v atmosféře (eukaryota, mnohobuněčné organismy),
- stromatolity (reálný materiál),
- vznik ozonové vrstvy,
- vznik prvotních kontinentů, vznik superkontinentu Rodinia,
- Země jako „snowball“,
- vznik Gondwany,
- ediakarská fauna.

4. Paleozoikum

- kambrická exploze a další vývoj života (strunatci, rostliny na souši, ryby, suchozemští živočichové, hmyz, první „čtyřnožci“, permokarbonské pralesy, plazi, ...),
- typické zkameněliny (reálný materiál),
- velká vymírání (devonské, permské),
- změny Gondwany, Pangea.

5. Mezozoikum

- rozvoj nových organismů (jehličnany, cykasy, kvetoucí rostliny, dinosauři, primitivní savci, ptáci),
- typické zkameněliny (reálný materiál),
- vymírání křída/terciér,
- rozpad Pangey, vznik oceánu Thetys.

6. Kenozoikum

- vznik moderních forem života (savci, hominidi),
- typické zkameněliny (reálný materiál),
- pohyby zemských desek, vznik dnešních oceánů a mladých pohoří,
- kvartérní zalednění (reálné záběry, lokalita bude upřesněna dle záměru scénáristy filmu a bude konzultována se zadavatelem).

B. Globální tektonika

1. Zemské desky

- rozdělení,
- příčiny pohybu.

2. Desková tektonika

- typy rozhraní desek,
- geologické děje na kontaktech desek,
- důsledky pohybu desek (reálné záběry, lokalita bude upřesněna dle záměru scénáristy filmu a bude konzultována se zadavatelem).

3. Sopečná činnost, zemětřesení, vrásnění jako důsledek deskové tektoniky

- výskyty zemětřesení a aktivních sopek ve světě (reálné záběry, lokalita bude upřesněna dle záměru scénáristy filmu a bude konzultována se zadavatelem).

C. Geologie Třebíčska

1. Geologický vývoj

- prekambrium (dodavatel bude mít k dispozici ke snímání reálný materiál z muzejních sbírek),
- paleozoikum (dodavatel bude mít k dispozici ke snímání reálný materiál z muzejních sbírek),
- jura a křída (dodavatel bude mít k dispozici ke snímání reálný materiál z muzejních sbírek),
- mezozoikum a kvartér (dodavatel bude mít k dispozici ke snímání reálný materiál z muzejních sbírek),
- projevy kadomského, variského a alpinského vrásnění (dodavatel bude mít k dispozici ke snímání reálný materiál z muzejních sbírek)

2. Regionální geologie

- pozice v Evropě a Českém masivu,
- regionálně-geologické jednotky a jejich charakteristika (dodavatel bude mít k dispozici ke snímání reálný materiál z muzejních sbírek).

3. Nerostné suroviny (reálné záběry z muzejních sbírek, záběry z lokalit, mikroskopické záběry)

- zlato (Želetavsko, Předínsko),
- stříbro a polymetaly (Jemnice, Jasenice, Měřín),
- železné rudy (Krahulov, Domamil, ...),
- uran (Jasenice),
- nerudy (grafit, živec, kámen, kamenivo etc.).

D. Významné geologické lokality na Třebíčsku (reálné záběry z muzejních sbírek, záběry z lokalit)

Výběr celkem 10 lokalit (Jemnice, Bítovánky, Pokojovice, Pocoucov, Kamenná, Březník – Lamberk, Mohelno, Rouchovany, Vícenice, Bochovice).

II.

EXPOZICE KLÁŠTERNÍ

Místnost č. 0.18, 0.19, 0.22 Vstupní prostor

Prostorové audio (pro prvek č. 068)

zvuková smyčka sestavená z následující hudby ve formátu MP3

délka: 24:08

Úvod:

Officium Svatého Prokopa, opata

Antiphona Letare Bohemia 1:49

Hymnus Confessor Dei lucidus 2:17

Responsorium O Procopi vir Dei 1:47

Antiphona Pium patrem 2:28

Prostor Dějiny řádů

Alovisi: Litaniae B Mariae Virginis à 7, 9:03

Alovisi: Salve Regina à 3, 4:14

Cochi: Domine ad adiuvandum me à 5, 2:30

Místnost č. 0.23a Třebíč – digitální model vývoje kláštera (pro prvek č. 058)

Režimy:

- režim prezentace - filmová smyčka bez zásahu návštěvníka, celkový rozsah od 6 do 7 min. (sestává ze 4 fází nestejně dlouhých)
- režim interaktivní, řídí návštěvník (má možnost otáčet si virtuální model ve formátu 3D)

Vstupní podklady (nákrety, skicy, poskytnutí reálné trojrozměrné makety zámku k zaměření) dodá zadavatel. Od dodavatele se předpokládá aktivní použití modelování objektů v CAD. Oba režimy vycházejí ze 4 stavebních fází:

Fáze 1 – středověk (13. století)

- 1) kostel – první etapa – stavba chóru a založení dvouvěžového průčelí
- 2) kostel – 2. fáze – stavba hlavní lodi
- 3) stavba kláštera – vznik ambitu s přilehlým dvoupodlažním klášteřem; přízemí kláštera je napojeno na kostel, patro je od něj odsazeno; arkády jsou vyšší než klenby přízemí, nad nimi je pultová střecha
- 4) výstavba křídla opatského paláce

Fáze 2 – pozdní gotika a renesance (15. - 16. století)

- 1) Zřízení jižního křídla kláštera
- 2) poboření opatského paláce
- 3) ubourání severního křídla křížové chodby
- 4) zboření jižní věže kostela
- 5) posunutí stěny jižního křídla – obestavění bývalé stěny ambitu
- 6) nástavba chodby nad ambitem a mírné zvednutí úrovně prvního patra
- 7) výstavba renesanční síně na základě opatského křídla

Fáze 3 – baroko (závěr 17. století, první polovina 18. století)

- 1) nástavba celého komplexu o jedno podlaží
- 2) barokně-gotická obnova kostela a výstavba jižní věže

Fáze 4 – 19. a 20. století

- 1) neogotická obnova kostela
- 2) památková obnova zámku

Místnost č. 0.23 b, c Prostor Církev a Vysočina v 50. letech

1) Pro prvek č. 055 - Číhošť, Babice, Děda Mráz – Zápotocký,

Filmová smyčka tří týdeníků: rok 1950 Číhošť, 1951 Babice, 1953 Děda Mráz, vždy cca 3 minuty smyčka z daného roku, celková délka smyčky 10 minut.

2) Pro prvek č. 053 - Audio do sluchátek,

- výběr vzpomínek a výpovědí pamětníků, týkající se perzekucí v 50. letech na Vysočině, celkem 10 výpovědí po cca 2 minutách, 20 minut obrazu,
- ve stejném infopointu možnost volby výběru rozhlasových reportáží 1948 – 1953 – 8 reportáží po maximálně 4 minutách, vždy na výběr návštěvníka, celkově 24 minut.

III.

EXPOZICE ZÁMECKÁ

Vstupní místnost č. 2.03 (pro prvek č. 267)

Prostorové audio – Beethoven, klavírní koncert

L. van Beethoven - Sonata in C, Op. 53 "Waldstein", Mvt. 1

Hudba proniká i do místnosti č. 2.05 Jídelna.

Hudební smyčka v délce 8 minut, formát audio MP3.

Pánský salon, místnost č. 2.07

Prostorové audio – Marlene Dietrich

Marlene Dietrich - Sei lieb zu mir

Hudební smyčka v délce 3:14 minut, formát audio MP3.

Knihovna, místnost č. 2.13

Prostorové audio – tikající hodiny

Audiosmyčka jedné minuty tikotu.

Pokoj odchodu, místnost č. 2.14 (pro prvek č. 314)

Projekce – filmová smyčka z týdeníků –z období po roce 1945 do roku 1948, o délce 4 minut,

Prostorové audio – do 1 minuty výpovědi, vzpomínka hraběnky Valdštejnové na odchod.

IV.

EXPOZICE MUZEJNÍ

Člověk vzývající

Místnost č. 2.41

Prostorové audio:

hudební nahrávka v délce 17,5 minuty zpracována ve formátu MP3 z následující hudby:

Svátek svatého Václava, knížete a mučedníka

Cantio Svatý Václave 1:15

Introitus In virtute tua 3:18

Kyrie Fons bonitatis 3:46

Sequentia Salve pater optime 2:08

Lectio Sancti Evangelii Si quis vult - tonus solemnis 2:32

Hymnus Dies venit victorie 1:50

Cantio Wenceslao duci claro 2:31

Místnost č. 2.40 – (pro prvek č. 117)

audiodoprovod umístěný do sluchátek:

hudební nahrávka v délce 13:26 minut zpracována ve formátu MP3 z následující hudby:

Písňe Jednoty bratrské z kancionálů 15. až 17. století

Studně nepřevážená, 2:03

Kdož chtěl by erbován býti, 1:56

Ach smutku můj, 1:40.

Pánu všichni prozpěvujte, 1:34

Soudce všeho světa, Bože, 1:45

Ó milé dítky, 2:32

Voláme z hlubokosti, 1:56

Místnost č. 2.39 – (pro prvek č. 122)

audiodoprovod umístěný do sluchátek:

hudební nahrávka v délce 24:18 minut zpracována ve formátu MP3 z následující hudby:

Holan Rovenský, Karel Václav: Čas jako hlas

Spívejte angelové, 2:22

Kde jste kde, Císařové, 2:02

Stála matka plesající, 1:32

Ó překrásný Ježíši, 3:34

Adam Michna: Loutna česká

Smutek bláznivých Panen, 3:12

Povolání Duchovné Nevěsty, 5:59

Duchovní Svádební Lázeň, 5:28

Místnost č. 2.36-2.37

Prostorové audio :

hudební nahrávka v délce 14:04 minut zpracována ve formátu MP3 z následující hudby:

Synagogue chants

Shema Yisrael, 1:53

Avinu Malkeinu, 6:33

Kol Nidrei, 5:38

Chodba místnost č. 2.21

Audioprogram – zvony regionu:

vytvoření PC programu, který umožní volit si na mapě třebíčského regionu, kterou vytvoří dodavatel, zvuky zvonů.

Dodavatel dále zajistí nahrávku těchto zvuků zvonů - výběr 14 zvonů regionu provedených zadavatelem, vždy po půlminutě audio, celkem maximálně 7,5 minuty.

Infopoint Betlémy (pro prvek č. 147)

Jedná se o:

PC program – kapacitně umožňující řádné fungování při vložení 60 normostran textu a 500 snímků. Dodavatel připraví prostředí, strukturu i datové úložiště, zpracuje dodaná data od zadavatele a předá zadavateli v otevřené podobě v rozsahu cca 60 normostran textu a 150 snímků (dodaných dodavatelem) s přístupovými právy tak, aby se daly další informace postupně vkládat i v budoucnosti.

Na obrazovce poběží ve smyčce cca 40 snímků betlémů, figurek, materiálů. Po dotyku obrazovky se objeví menu (viz struktura níže). Možnost administrace sekcí osobnosti, katalog sbírky a výstavy přímo zadavatelem - průběžné doplňování databáze zadavatelem.

Od druhé úrovně (A, B, C) má každá položka uvedená v menu svůj obsah (nejedná se tedy pouze o mezikrok). Obsah je ve formě vzájemné provázanosti textu se snímky.

STRUKTURA INFOPOINTU BETLÉMY

Členění položek menu – viz příloha B – Infopoint Betlémy

1) Obecná historie

- 2) Josefinská reforma
- 3) Formy a materiály
- 4) Jiná centra
 - A. Čechy a Morava
 - B. Vysočina
 - C. Ústí nad Orlicí
- 5) Třebíčské betlémy
 - A. Vznik a vývoj
 - B. Vrcholná forma
 - C. Stavěcí a skříňový betlém
 - D. Součásti betlémů
 - I. Figurky
 - II. Stavby
 - III. Kostra
 - IV. Další

E. Osobnosti

Katalog cca 50 jmen, dodavatel vytvoří uživatelský software, zadavatel dodá odborná data (obsah), která dodavatel zformátuje. Dodavatel připraví prostředí, strukturu i datové úložiště, zpracuje dodaná data od zadavatele a předá zadavateli v otevřené podobě s přístupovými právy tak, aby se daly další informace postupně vkládat i v budoucnosti.

F. Sbírka

I. Katalog - dodavatel vytvoří uživatelský software, zadavatel dodá data, která dodavatel upraví. Dodavatel připraví prostředí, strukturu i datové úložiště, do kterého se informace dají následně zadavatelem vkládat.

II. Výstavy - dodavatel vytvoří uživatelský software, zadavatel dodá data, která dodavatel upraví. Dodavatel připraví prostředí, strukturu i datové úložiště, do kterého se informace dají následně zadavatelem vkládat.

G. Jiné instalace betlémů (např. v domácnostech, kostelech).

Člověk objevující

Místnost č. 2.26

Prostorové audio – sestříhaná smyčka z Čapkových nahrávek etnické hudby. Stopáž smyčky v rozsahu od 10 do 15 minut ve formátu MP3.

Člověk tvořící

Chodba místnost č. 2.21

Infopoint Umění (pro prvek č. 141)

PC program – kapacitně umožňující řádné fungování při vložení 30 normostran textu a 1000 snímků. Dodavatel připraví prostředí, strukturu i datové úložiště, zpracuje dodaná data od zadavatele a předá zadavateli v otevřené podobě v rozsahu cca 30 normostran textu a 500 snímků (dodaných dodavatelem) s přístupovými právy tak, aby se daly další informace postupně vkládat i v budoucnosti.

Od druhé úrovně (A, B, C) má každá položka uvedená v menu svůj obsah (nejedná se tedy pouze o mezikrok). Obsah je ve formě vzájemné provázanosti textu se snímky.

Na obrazovce poběží smyčka snímků výtvarných děl, které by návštěvníka upoutaly. Bude zde možnost zastavit na snímku, který návštěvníka zaujal a kde by se už ukázaly další informace k předmětu. U každého předmětu bude kromě popisu i odkaz na umístění daného předmětu. V základní nabídce bude pouze výběr nejzajímavějších předmětů z výtvarné sbírky - snímky, resp. více snímků s popisem (autor, název, technika, datace, rozměry, umístění apod.). V další úrovni se návštěvník dostane k většině ostatních předmětů ze sbírky.

Filtrovat dle zařazení ve sbírce (malba, grafika, plastika), námětu, časového období, autora, techniky, zajímavých celků apod., s tím, že se návštěvníkovi u jednotlivých filtrů objevuje roleta, z které je možno si vybrat a kromě toho i vyhledávat přes klíčová slova.

STRUKTURA INFOPOINTU UMĚNÍ

Členění položek menu – viz příloha C – Infopoint Umění.

1) Díla podle období

A. do 17. století

I. katalog

B. 18. století

I. katalog

C. 19. století

I. katalog

D. 20. století

I. katalog

2) Díla podle autorů

A. do 17. století

- I. výběr ze jmen autorů (5)
 - 1. katalog
- B. 18. století
 - I. výběr ze jmen autorů (5)
 - 1. katalog
- C. 19. století
 - I. výběr ze jmen autorů (10)
 - 1. katalog
- D. 20. století
 - I. výběr ze jmen autorů (50)
 - 1. katalog
- 3) Díla podle technik a materiálů
 - A. Malba
 - I. Olejomalba
 - 1. katalog
 - II. Tempera
 - 1. katalog
 - III. Akvarel, kvaš
 - 1. katalog
 - IV. Kombinovaná technika
 - 1. katalog
 - B. Grafika
 - I. Tisk z výšky (dřevořez, dřevoryt, linoryt)
 - 1. katalog
 - II. Tisk z hloubky (rytina, lept, suchá jehla, oceloryt)
 - 1. katalog
 - III. Tisk z plochy (litografie)
 - 1. katalog
 - IV. Kombinovaná technika
 - 1. katalog
 - C. Kresba
 - I. Kresba tužkou
 - 1. katalog
 - II. Pastel, kresba pastelkami
 - 1. katalog
 - III. Kresba rudkou, uhlem

- 1. katalog
- IV. Kresba tuší, perokresba
 - 1. katalog
- V. Kombinovaná technika
 - 1. katalog
- D. Sochy
 - I. Plastiky (bronz, keramika)
 - 1. katalog
 - II. Skulptury (kámen, dřevo)
 - 1. katalog
- 4) Díla podle námětů
 - A. Náboženské
 - I. Starý zákon
 - 1. katalog
 - II. Nový zákon
 - 1. katalog
 - III. Světci
 - 1. katalog
 - B. Figurální
 - I. katalog
 - C. Krajina, zátiší
 - I. katalog
 - D. Historické, žánrové
 - I. katalog
 - E. Fauna, flóra
 - I. katalog
 - F. Alegorické
 - I. katalog
 - G. Abstraktní
 - I. katalog
- 5) Třebíč v umění
 - A. katalog

Místnost č. 2.29 Architektura - Vývoj města (pro prvek č. 170)

Interaktivní PC program (virtuální mapa), která představí vývoj města v jednotlivých urbanistických etapách. Na základě volby návštěvníka bude možno sledovat plynulý urbanisticko-architektonický vývoj města od jeho počátků až po současnost, architektonické zásahy a soubory z jednotlivých období či vývoj jednotlivých čtvrtí.

Interaktivní PC program bude obsahovat následující podklady: mapy, snímky, nákresy, plány, které budou dodavateli dodány zadavatelem v papírové formě dle níže uvedené struktury, snímky současného stavu budov pořídí dodavatel; ovládání bude na dotyk.

Jednotlivé vývojové etapy a prezentované památky:

1. Morfologie krajiny

Urbanismus: reliéf terénu, vodní toky

2. XII. století

Urbanismus: založení kláštera, průběh hlavních cest, založení osady pod klášterem, předlokační osady na protějším břehu a jejich souvislosti s cestami

3. XIII. století

Urbanismus: Založení první trhové osady Stařečka, lokace města Třebíče

Stavby: Klášterní basilika Panny Marie; farní kostel sv. Martina

4. XIV.-XV. století

Urbanismus: Vytyčení hradeb - vymezení vlastního města; zničení kláštera a města roku 1468

Architektura: Hradby; Věž při kostele sv. Martina; brány kláštera

5. XVI. století

Urbanismus: růst předměstí a židovské čtvrti

Architektura: Renesanční domy ve městě; přestavba kláštera na zámek; kostel nejsvětější Trojice

6. XVII. a XVIII. století:

Urbanismus: rozšíření židovské čtvrti

Architektura: Kapucínský klášter, přestavba farního kostela, barokně-gotická přestavba klášterní basiliky; významné stavby ghetta (16-19. století - návaznost na další epochy)

7. XIX. století:

Urbanismus: požáry z let 1821/22 a jejich vliv na podobu města; mapa stabilního katastru 1835; železnice; zástavba mezi nádražím a městem; pravidelná šachovnicová uliční síť jižně od nádraží; zakládání městských sadů

Architektura: soubor veřejných reprezentativních budov na jižním okraji centra města; pivovar (bývalá dominanta Komenského nám).

8. 1918-1939

Urbanismus: Zastavovací plán z roku 1932 - vizualizace nerealizovaných nových čtvrtí; Baťova čtvrť; nové čtvrti nad židovským městem a v Nových dvorech; okolí Gorazdova nám.

Architektura: Rondokubistická budova UP závodů; Stavby Bohuslava Fuchse (spořitelna, lázně); Baťovy domky

9. 50. léta

Urbanismus - první sídliště; sorela na Václavském náměstí

10. 60.-80. léta

Urbanismus: sídlištní zástavba; dopravní průtah městem a s ním spojené demolice

Architektura: OV KSČ, divadlo, autobusové nádraží atd.

11. Současnost:

Urbanismus - hlavní tendence a případné plánované zásahy; kritická analýza současného stavu centra města

Architektura - vybrané novostavby posledních 20 let.

Místnost č. 2.28 Nezval a Václavek

Prostorové audio V+W (pro prvek č. 193):

hudební smyčka spouštěná pohybovým čidlem ve formátu MP3 v délce do 20 min obsahující následující hudební díla:

Nebe na zemi - 2:33

Klobouk ve křoví - 4:33

Život je jen náhoda - 3:14

kombinováno s písněmi přelomu 40. a 50. let (3 ukázky, každá v délce 2-3 minut, české budovatelské písně, pochody)

Náslechové audio (pro prvek č. 186)

zvuková nahrávka ve formátu MP3

Recitace přímo Vítězslava Nezvala - 7:14 min.
Ukázka ze skladby Edison – Signál času - 6:03 min.

Místnost č. 2.27 Zahradníček, Fučík

Náslechové audio (pro prvek č. 196) ve formátu MP3 celkem 10 minut – zvuková nahrávka hlasu Jana Zahradníčka a hlasu Bedřicha Fučíka.

Hlas Jana Zahradníčka – 5 minut.

Hlas Bedřicha Fučíka – 5 minut.

Příroda a člověk – Člověk a příroda

Místnost č. 2.20

Prostorové audio (pro prvek č. 200)

- ve formátu MP3, zvuky přírody, dle volby v audioprogramu

Atmosféra místnosti je tvořena prostorovým audiem, v němž zní reálné zvuky z přírody. Návštěvník bude mít dále možnost zvolit si zvuky jednotlivých živočichů prezentovaných na prvku č. 200. Volba je aktivována mechanickým ovladačem (například pákovým) v antivandalském provedení, který je umístěn do interaktivního stromu (prvek č. 200).

Seznamy živočichů a biotopů dodá zadavatel. Audio nahrávky zvuků živočichů zajistí dodavatel. Finální prostorové audio bude zhotoveno v rozsahu od 20 do 30 min.

Infopoint Příroda Třebíčska (pro prvek č. 198)

PC program - kapacitně umožňující řádné fungování při vložení cca 150 normostran textu dodaných zadavatelem a 1 000 snímků. Dodavatel připraví prostředí, dle níže uvedené struktury i datové úložiště, zapracuje dodaná data od zadavatele a předá zadavateli v otevřené podobě v rozsahu cca 150 normostran textu a 350 snímků (dodaných dodavatelem) s přístupovými právy tak, aby se daly další informace postupně vkládat i v budoucnosti.

Jedná se o dotykový systém, jehož podklady jsou tvořeny mapami (s možností zobrazení v různém měřítku, kterou vytvoří dodavatel po konzultaci se zadavatelem) a snímky.

Na obrazovce poběží smyčka 40 snímků (slide-show), dotykem z tohoto lze vyskočit a objeví se úvodní obrazovka s menu dle struktury viz níže.

STRUKTURA INFOPOINTU PŘÍRODA TŘEBÍČSKA

Členění položek menu – viz příloha D – Infopoint Příroda Třebíčska

I. Chráněná území Třebíčska (Po zvolení sekce Chráněná území Třebíčska se objeví mapa trebičského regionu s lokací míst. Dotykem lze volit konkrétní místo, a to jak přímo z mapy, tak i výběrem ze strukturovaného menu.)

Chráněná území – struktura v návrhu

A. Přírodní parky

1. Třebíčsko
2. Rokytňá
3. Želetavka
4. Střední Pojhlaví

B. Národní přírodní rezervace

1. Mohelenská hadcová step

C. Přírodní rezervace

1. Blatná hráz
2. Dukovanský mlýn
3. Habrová seč
4. Hošťanka.
5. Mohelníčka
6. Na Podlesích
7. Opatovské zákopy.
8. Suchá hora
9. Suché skály
10. U hájenky
11. U Římské studánky
12. U Trojáku
13. Údolí Oslavy a Chvojnice
14. V Jedlí
15. Velká skála

D. Přírodní památka

1. Černá blata
2. Habří

3. Hájky
4. Hluboček
5. Jalovec
6. Kamenný vrch
7. Klučovský kopec
8. Kobylínek
9. Kozének
10. Na Kopaninách
11. Na skaličce.
12. Obora
13. Pazderna
14. Ptáčovský kopeček
15. Syenitové skály u Pocoucova
16. Špilberk
17. U Lusthausu
18. Urbánkův palouk

E. Památné stromy

1. Kapistránská lípa
2. Platan u Panského dvorka
3. Valíčkův dub
4. Velký javor
5. Žižkův dub

Rozsah každé sekce v rámci Chráněných území

- i. Základní text dodaný zadavatelem (charakteristika, význam území, vznik/vyhlášení, způsob ochrany, geografické zakotvení místa /DPS, katastr, nadmořská výška, rozloha/. Květena území (text dodá zadavatel + snímky zhotoví dodavatel ve vyváženém a divácky atraktivním poměru)
Zvířena území (text dodá zadavatel + snímky zhotoví dodavatel ve vyváženém a divácky atraktivním poměru)
Další informace (literatura, poznámky, historie, atp.) dodá zadavatel (informace jsou součástí výše uvedených 150 stran textu).
- ii. snímek
- iii. mapa

II. Vzácné druhy Třebíčska

- 1) Rostliny
 - Katalog (každá položka)
Název, snímek, popis, ohrožení, výskyt, lokality, mapa
- 2) Zvířena
 - Katalog
Název, snímek, popis, ohrožení, výskyt, lokality, mapa
- 3) Houby (nebo pod rostliny)
 - Katalog
Název, snímek, popis, ohrožení, výskyt, lokality, mapa

III. Přírodovědecká sbírka MVT

- 1) Botanika
(snímky, text charakteristiky, historie sbírky, počet předmětů)
- 2) Entomologie
(snímky, text charakteristiky, historie sbírky, počet předmětů)
- 3) Zoologie
(snímky, text charakteristiky, historie sbírky, počet předmětů)
- 4) Mykologie
(snímky, text charakteristiky, historie sbírky, počet předmětů)

IV. Významní přírodovědci Třebíčska

Katalog – jedná se o databázi, kterou dodavatel naplní dodaným textem.

Projekce filmu, smyčka, (pro prvek č. 206)

- celá se záběry Mohelna, projekce bude bez zvuku a bude dokreslovat charakter expozice. Filmová smyčka v rozlišení Full HD 1920x1080 bodů v rozsahu od 10 do 15 minut na základě podkladů (snímky, literatura, poznámky) dodaných zadavatelem. Předpokladem pro řádné zhotovení filmové smyčky jsou základní dotáčky v terénu v rozsahu cca 5 hodin, s profesionální technikou, minimálním štábem, včetně potřeb světelné techniky, či dalších technologických doplňků. Součástí je i doprava na místo natáčení.

Člověk bojující

Místnost č. 2.19

Prostorové audio – zvuková smyčka ve formátu MP3 v rozsahu od 20 do 30 minut (střídání vybraných jednotlivých motivů z následujícího náslechového audia, kromě textu Palackého).

Č. prvků 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 vždy náslechové audio u každého z témat (celkem cca 50 minut), zvuková smyčka ve formátu MP3.

- **Husité** – chorál „Ktož sú boží bojovníci“, 4.20
- **Matyáš Korvín** – načtený text Palackého líčení dobytí Třebíče, 6.00
- **Třicetiletá válka** - Koch Schwann, 6.34
- **Pruská sedmiletá válka** – Píseň, kterou složil pruský granátník Gleim „Siegelied nach der Schlacht bei Lobositz“ (Vítězná píseň o bitvě u Lovosic), 4.36
- **Napoleonská válka** – Byla vojna u Slavkova, 5.13
- **Prusko-rakouská válka 1866** – dobová vojenská píseň – Tam u Králového Hradce, 3.50
- **První světová válka** – Karel Hašler – Hoši od Zborova (legionáři), Wacht am Rhein (rakouští vojáci), 4.25, stopáž 5.15 a **Druhá světová válka** – Škoda lásky v jazykových variacích, cca 4 x 4 minuty.


Člověk pracující


Místnost č. 2.18

Filmová smyčka v rozlišení Full HD 1920x1080 bodů v rozsahu od 24 do 32 minut (pro prvek č. 238) – výběr z cyklu dokumentů „Za svědky minulosti“ (1984). 3 – 4 minutový výběr z každého z 8 dílů.

Součástí dokumentu Náplně AV techniky – podklady pro výrobu jsou 4 přílohy:

- Příloha A – infopoint Minerály
- Příloha B – infopoint Betlémy
- Příloha C – infopoint Umění
- Příloha D – infopoint Příroda Třebíčska





Infopoint - umění

Díla podle období

katalog do 17. století

katalog 18. století

katalog 19. století

katalog 20. století

Díla podle autorů

katalog výběr ze jmen autorů do 17. století

katalog výběr ze jmen autorů 18. století

katalog výběr ze jmen autorů 19. století

katalog výběr ze jmen autorů 20. století

katalog Třebíč v umění

Díla podle technik a materiálů

Malba

Olejomalba katalog

Tempera katalog

Akvarel, kvaš katalog

Kombinovaná technika katalog

Grafika

Tisk z výšky (dřevořez, dřevoryt, linoryt) katalog

Tisk z hloubky (rytina, lept, suchá jehla, oceloryt) katalog

Tisk z plochy (litografie) katalog

Kombinovaná technika katalog

Kresba

Kresba tužkou katalog

Kresba rudkou, uhlím katalog

Kresba tuší, perokresba katalog

Pastel, kresba pastelkami katalog

Kombinovaná technika katalog

Sochy

Plastiky (bronz, keramika) katalog

Skulptury (kámen, dřevo) katalog

Díla podle námětů

Náboženské

Starý zákon katalog

Nový zákon katalog

Světcí katalog

Figurální katalog


Krajina, zátiší katalog

Historické, žánrové katalog

Fauna, flóra katalog

Alegorické katalog

Abstraktní katalog



Příloha č. 3 smlouvy o dílo

M>T

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ
PROJEKT STÁLÉ EXPOZICE

Místo stavby:

Zámek 1
Třebíč
674 01

Rép.:

"Zámek Třebíč - modernizace zámku
a zpřístupnění nových expozic"
CZ.1.11./2.1.00/08.01115

Investor:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

Zástupce investora:

PhDr. Katina Lisá
vedoucí odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysočina

Stupeň PD:

DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY (DZS)

Část:

EXPOZICE
VEŘEJNÝ INTERIÉR

Datum:

03/2012

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	RNDr. Marie Kružíková				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OPKŽU				
Počet vyhotovení:	2				
Adresát:	A.M.O.S. DESIGN s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	35812367.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu				
Podpis zajistit do:	29.1.2013				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		OKPPCR/Prokešová	29.1.2013	Prokešová
Projednáno s:		OKPPCR/Lisá	29.1.2013	Lisá
Právní kontrola:		OKPPCR/Jiráková	24.1.2013	Jiráková
Předkládá:		OKPPCR/Prokešová	29.1.2013	Prokešová
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		OKPPCR/Lisá	24.1.2013	Lisá
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OKPPCR/Lisá	29.1.2013	Lisá
	Správce rozpočtu:	OE/Zemanová	25.1.2013	Zemanová

Poznámka:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - realizace a dodávka stálé expozice a veřejných interiérů.
Jedná se o akci realizovanou v rámci projektu "Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic" - CZ.1.11/2.1.00/08.01115.
Dodatek je uzavírán z důvodu změny právních předpisů upravujících sazby DPH, úpravy harmonogramu plnění a doplnění ustanovení o respektování povinností kontrolované osoby dodavatele prací.

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysočina



KUJIP00X7S0Y

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami

8/90/12
S. 646

Kraj Vysočina

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiří Běhounek, hejtmanem kraje
RNDr. Marie Kružíková, člen rady kraje
70890749
CZ70890749
Volksbank CZ, a.s. Jihlava
4200160699/6800

/dále jen „objednatel“/

a

A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Krajským soudem oddíl C, vl. 20782
se sídlem: Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. arch. Vladimírem Ambrozem
IČO: 63479982
DIČ: CZ63479982
bankovní spojení: KB Brno-venkov
č.ú: 1118930267/0100

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 9. 2012 (dále jen „smlouva“):

1. Do článku III. odst. 1 se vkládají následující body:


- zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15. 5. 2013 instalovat tapety v místnostech číslo 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14.
- zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15. 5. 2013 zrealizovat panelové vestavby včetně podhledů v místnostech číslo 2.15, 2.18, 2.19, 2.21, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31.

2. Článek IV. odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým článkem IV. odst. 1, který zní:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 35 812 367 Kč včetně DPH 21 % (slovy: třicet pět milionů osm set dvanáct tisíc tři sta šedesát sedm korun českých) při splnění podmínek uvedených v tomto článku jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době vystavení daňového dokladu.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysocina

Cena celkem bez DPH:	29 596 997,55 Kč
DPH 15 %:	
DPH 21 %:	6 215 369,50 Kč
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH:	35 812 367,00 Kč

3. Do článku XXV. se vkládá nový odstavec 14., který zní:

14. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z ROP NUTS II JV v rozsahu daném řídicím orgánem programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Účastníci dodatku č. 1 Smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetli, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 28 -01- 2013

V Brně dne 30.1.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Kraj Vysocina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


RNDr. Marie Kružíková
radní kraje

10



A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.
Beethovenova 641/9, 601 05 Brno
TEL.: 542 212 898, 542 216 618
FAX: 542 214 439, DIČ: CZ63479982
Ing. Arch Vladimír Ambroz
jednatel společnosti
A.M.O.S. DESIGN s.r.o.








ke mlu. 8490/12 5646



69493

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	RNDr. Marie Kružiková				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OPKŽU				
Počet vyhotovení:	2				
Adresát:	A.M.O.S. DESIGN s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	0.00 187 084.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu				
Podpis zajistit do:	27.6.2013				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		OKPPCR/Prokešová	26.6.2013	
Projednáno s:		OKPPCR/Lisá	27-06-2013	
Právní kontrola:		OKPPCR/Herzánová	26.6.2013	
Předkládá:		OKPPCR/Prokešová	26.6.2013	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		OKPPCR/Lisá	27-06-2013	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OKPPCR/Lisá	27-06-2013	
	Správce rozpočtu:	OE/Zemanová	24.6.2013	

Poznámka:

Je subjekt se kterým je uzavírána smlouva nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH - Ne

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - realizace a dodávka stálé expozice a veřejných interiérů.

Jedná se o akci realizovanou v rámci projektu "Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic" - CZ.1.11/2.1.00/08.01115.

Dodatek je uzavírán z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací a dodávek. Současně se v rámci tohoto dodatku zohledňují i méněpráce, které nebude zhotovitel provádět.

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.


3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP00X9PBM



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysočina

*he mul. 8490/12
s. 646*

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami

Kraj Vysočina

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
RNDr. Marie Kružíková, členka rady kraje
70890749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s. Jihlava
4200160699/6800

/dále jen „objednatel“/

a

A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Krajským soudem oddíl C, vl. 20782
se sídlem: Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. arch. Vladimírem Ambrozem, jednatelem
IČO: 63479982
DIČ: CZ63479982
bankovní spojení: KB Brno-venkov
č.ú.: 1118930267/0100


/dále jen „zhotovitel“/

I.

Předmět dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2013 (dále jen „smlouva“) je provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původních prací a zdárné dokončení celého díla. Současně s rozšířením předmětu smlouvy o tyto dodatečné stavební práce a dodávky se v rámci tohoto dodatku zohledňují i méněpráce, které nebude zhotovitel provádět.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly v souladu s článkem XXV. odst. 7 smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění a doplňují některá ustanovení smlouvy takto:



1. Článek II. odst. 1. se mění takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených a specifikovaných v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a v dokumentaci zadání stavby pro změny č. 2 a 5, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.

2. Do článku III. odst. 1 se vkládá následující bod:

- zhotovitel se zavazuje vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku zrealizovat nejpozději do 30. 6. 2013, vyjma změn č. 2 a č. 6, které budou dokončeny nejpozději do 15. 8. 2013.

3. Článek IV. odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým článkem IV. odst. 1, který zní:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 35 853 874,80 Kč včetně DPH 21 % (slovy: třicet pět milionu osm set padesát tři tisíce osm set sedmdesát čtyři koruny, 80/100 Kč) při splnění podmínek uvedených v tomto článku jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době vystavení daňového dokladu.

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 a před uzavřením dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH:	29 596 997,55 Kč
DPH 15 %:	
DPH 21 %:	6 215 369,50 Kč
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH:	35 812 367,00 Kč

Cena víceprací dodatku č. 2:

Cena víceprací bez DPH:	187 084,00 Kč
DPH 15 %:	
DPH 21 %:	39 287,60 Kč
Cena víceprací včetně DPH:	226 371,60 Kč

Cena méněprací dodatku č. 2:


Cena méněprací bez DPH:	-152 780,00 Kč
DPH 15 %:	
DPH 21 %:	-32 083,80 Kč
Cena méněprací včetně DPH:	-184 863,80 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH:	29 631 301,55 Kč
DPH 15 %:	
DPH 21 %:	6 222 573,30 Kč
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH:	35 853 874,80 Kč



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysočina

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání shora citované smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li podepsán téhož dne, nabývá platnosti dnem podpisu později uvedeného.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 – Dokumentace zadání stavby – pro změny č. 2 a 5

V Jihlavě dne 26-06-2013

V Brně dne 26-06-2013

Za objednatele:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

10

RNDr. Marie Kružiková
členka rady kraje

Za zhotovitele:

Ing. Arch. Vladimír Ambroz
jednatel společnosti
A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.
Beethovenova 641/9, 601 05 Brno
TEL. 542 212 898, 542 216 618
FAX: 542 214 439, DIČ: CZ63479982



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysočina


Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Stavba: Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč


Objekt: zámek Třebíč

pořad. číslo	označení	číslo místnosti	popis položky	vnější rozměry (mm)	technická poznámka	měrná jednotka	počet mj	cena bez DPH/mj	cena celkem bez DPH	DPH samostatně	cena celkem včetně DPH			
Změna č. 1 - Změna řešení konstrukce podhledu - položka B/84/316														
Změna č. 1 - Méněpráce														
B/84	316	2.18	podhled	6980x5820	dřevěný pohled na ocelových táhlech, pohledové hrany zaklopeny, polovina patinovaný nátěr RAL, polovina patinovaný TiZn, výtvarně dotvořený	m²	-40,7	1 200,00 Kč	-48 840,00 Kč	-10 256,40 Kč	-59 096,40 Kč			
Změna č. 1 - Vícepráce														
B/84	316	2.18	podhled	6980x5820	SDK podhled, samonosná konstrukce z hliníkových UW a CW profilů, pohledové hrany zaklopeny, polovina patinovaný nátěr RAL, polovina patinovaný TiZn, výtvarně dotvořený	m²	40,7	2 420,00 Kč	98 494,00 Kč	20 683,70 Kč	119 177,70 Kč			
Změna č. 2 - Zrušení instalačního panelu - položka B/35/132														
Změna č. 2 - Méněpráce														
B/35	132	2.34	instalační panel s vitrínou	3660x4450	dřevěná kce opláštěná 2xDTD, povrch dýhovaný, tmelený, broušený, nátěr RAL, otvor pro vitrínu	m²	-15	2 760,00 Kč	-41 400,00 Kč	-8 694,00 Kč	-50 094,00 Kč			
Změna č. 2 - Vícepráce														
		2.34	podstavec	2800x750x1000	opláštění ocelové konstrukce DTD, povrchová úprava - černý umakart (lesk nebo pololesk)	ks	1		29 400,00 Kč	6 174,00 Kč	35 574,00 Kč			
Změna č. 3 - Způsob osazení dřezu v barové sestavě														
Změna č. 3 - Méněpráce														
		1.08	dřez		nerez dřez pro spodní zabudování, včetně sifonu	ks	-1	14 500,00 Kč	-14 500,00 Kč	-3 045,00 Kč	-17 545,00 Kč			
Změna č. 3 - Vícepráce														
		1.08	dřez		nerez dřez pro horní zabudování, včetně odkapávače a sifonu	ks	1	7 250,00 Kč	7 250,00 Kč	1 522,50 Kč	8 772,50 Kč			
Změna č. 4 - Záměna posuvných dvířek barové sestavy za otvíravá														
Změna č. 4 - Méněpráce														
		1.08	barová dvířka	700x700	zamykací výsuvná skleněná dvířka, číré lepené dvojsklo 2x6 mm	ks	-1	7 000,00 Kč	-7 000,00 Kč	-1 470,00 Kč	-8 470,00 Kč			
Změna č. 4 - Vícepráce														
		1.08	barová dvířka	700x700	uzamykatelná otvíravá skleněná dvířka, sklo tvrzené číré tl. 10 mm	ks	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč			
Změna č. 5 - Prvek č. 126 - Instalační panel - s vitrínami 129 a 318														
Změna č. 5 - Méněpráce														
B/34	126	2.35	instalační panel	3780x4450	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl. 5 mm (podklad pro grafiku), otvory pro vitríny	m²	-13,2	2 450,00 Kč	-32 340,00 Kč	-6 791,40 Kč	-39 131,40 Kč			
Změna č. 5 - Vícepráce														
B/34	126	2.35	instalační panel	3780x4450	dřevěná kce opláštěná 2xDTD s plastem tl. 5 mm (podklad pro grafiku), otvory pro vitríny	m²	14,8	2 450,00 Kč	36 240,00 Kč	7 610,40 Kč	43 850,40 Kč			
Změna č. 6 - Otočný panel č. 102 - zrušení plastové podložky pod grafiku														
Změna č. 6 - Méněpráce														
D/28	102	2.42	otočný panel s grafikou		velkoformátový tisk ve fotokvalitě, fólie lepená na plast tl. 5 mm (viz stavba), UV laminace	m²	-6,7		-3 700,00 Kč	-777,00 Kč	-4 477,00 Kč			
Změna č. 6 - Vícepráce														
D/28	102	2.42	otočný panel s grafikou		Přetmelení, přebroušení DTD	m²	6,7		3 700,00 Kč	777,00 Kč	4 477,00 Kč			
Změna č. 7 - VEM 1.19/3 - Zkrácení horní skříňky kuchyňské linky														
Změna č. 7 - Méněpráce														
VEM 1.19/3	Kuchyňská linka		d x v x š = 2400x2000x600	zavěšená, povrch dýha/kompaktní materiál, včetně skleněného obkladu příčky, horní skříňky zkráceny o 525 mm (jednu skříňku)		ks	-1		-5 000,00 Kč	-1 050,00 Kč	-6 050,00 Kč			
Změna č. 7 - Vícepráce														
VEM 1.19/3	Kuchyňská linka		d x v x š = 2400x2000x600	zavěšená, povrch dýha/kompaktní materiál, včetně skleněného obkladu příčky, provedení ukončení se zaoblenými rohy podobně jako na druhé straně		ks	1		5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč			
									Méněpráce celkem:			-152 780,00 Kč	-32 083,80 Kč	-184 863,80 Kč
									Vícepráce celkem:			187 084,00 Kč	39 287,60 Kč	226 371,60 Kč

POHLED

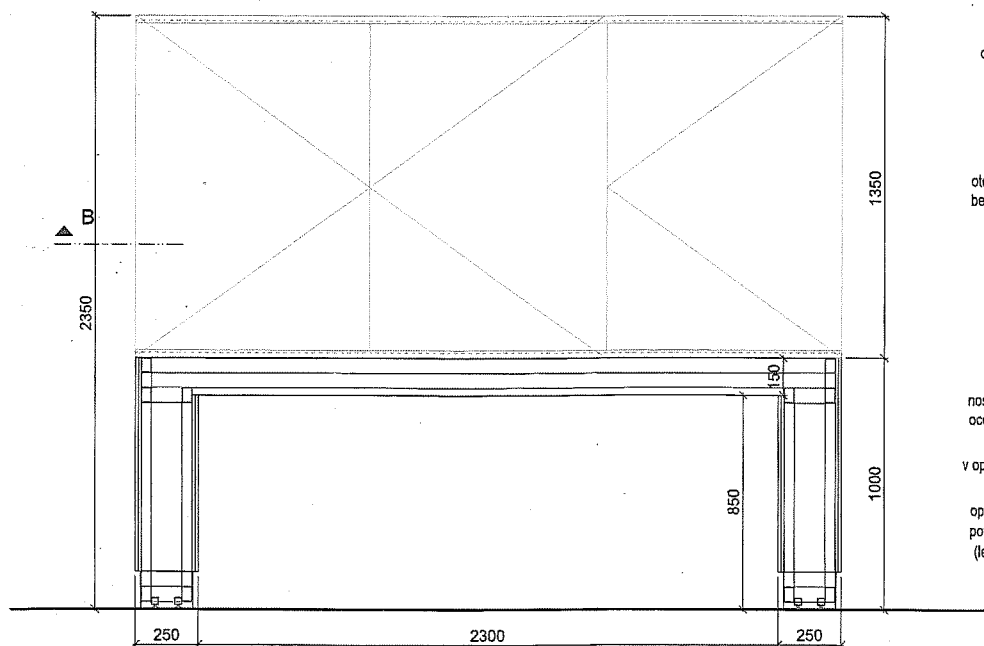

ŘEZA

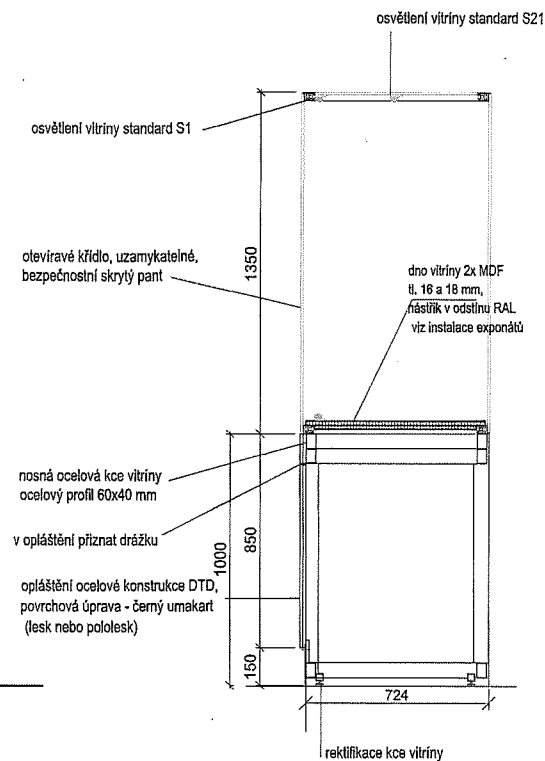

C

Skleněné KCE:
rozměry vitríny (šxvxh): 2800x1350x750 mm

mat vitríny: sklo float 8 mm
(tloušťka skla a standard bude upřesněna v dílenské dokumentaci)

vitřina je prachotěsná a uzamykatelná, otevíratelná bezpečnostní skrytý pant, ve spodní části dveří bezpečnostní zámek min. III. bezpečnostní třídy

stěny a strop vitríny jsou v matovém provedení

Instalace exponátů: Hartmannův betlém
Vitrínu nutné přizpůsobit při realizaci exponátů!!!

nosná konstrukce vitríny je tvořena ocelovými profily

Všechny pomocné konstrukce jsou opatřeny černým ochranným nátěrem.

Statika konstrukce viz dílenská dokumentace


D

Grafika:
popisky exponátů

F

Osvětlení:
Osvětlení vitríny je součástí dodávky vitríny a je zahrnuto do její ceny!!!
osvětlení vitríny standard S1 - regulovatelné LED osvětlení
osvětlení vitríny standard S21 - směrovatelný LED reflektor- 3 x

ŘEZ B

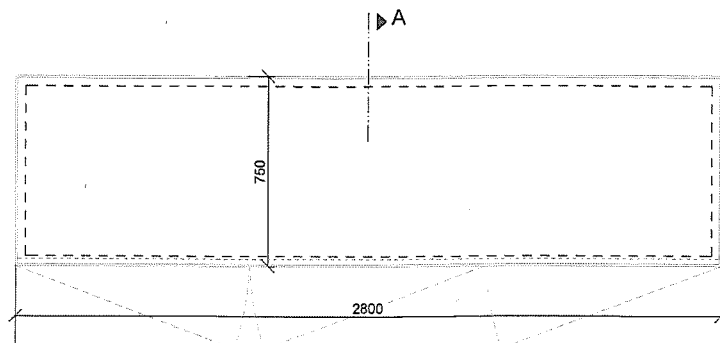


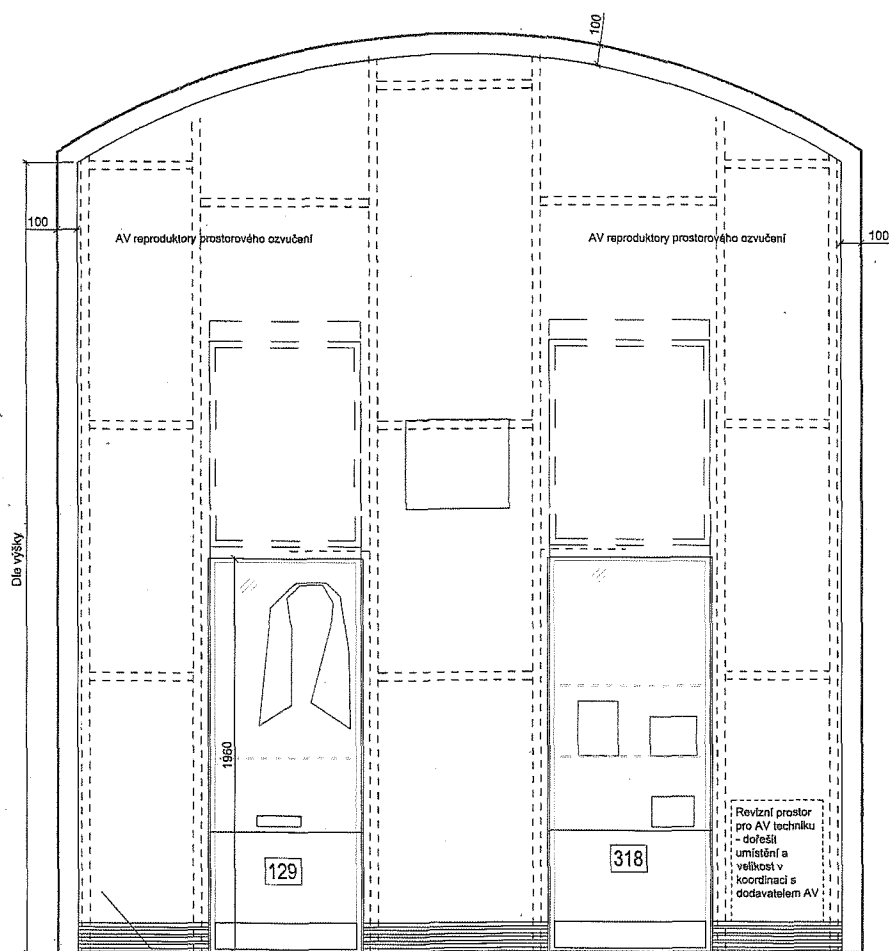
132 C D F

POZN.:


KAŽDÝ DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYHOTOVENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A JEJÍ PŘEDÁNÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA A ARCHITEKTOVI EXPOZICE K ODSOUHLASENÍ. SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.


 MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ PROJEKT STÁLÉ EXPOZICE	Stupeň PD: DZS		Název: 132 - instalační panel s vitrinou	
	Část: C - SKLENĚNÉ KONSTRUKCE			
Projektant:	Měřítko: 1:20	Datum: 01/2013	Paré:	Výkres.č.: 25



Koe panelu.
Dřevěná nosná koe z hranolů 70/40 mm osazených na 2x MDF tl. 16 mm.
Zakřepena 2x DTD tl. 12 mm - tmeřeny a broušeny + celoplošná grafika na 5 mm plastu.
Solí ze segmentů tvořící lamelový provětrávací prvek opatřený nátlakem práškové barvy černé polomat RAL 9005.
Panel fixován chemickými kotvami do stěny.

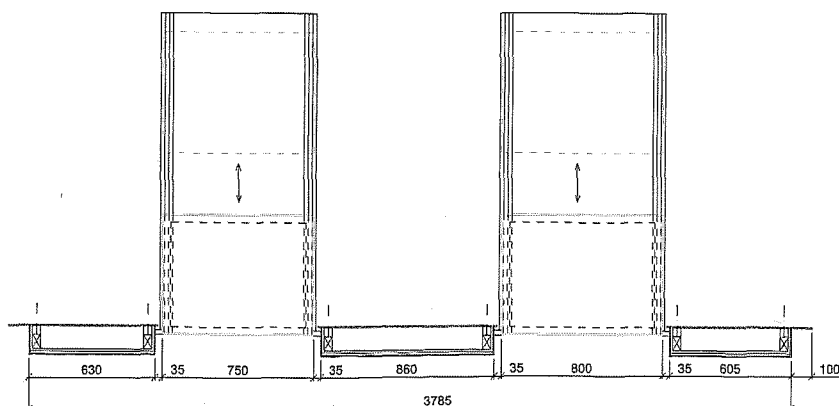

Instalační panel s vitrinami
- celoplošný potisk grafikou - grafika na
plastové podložce

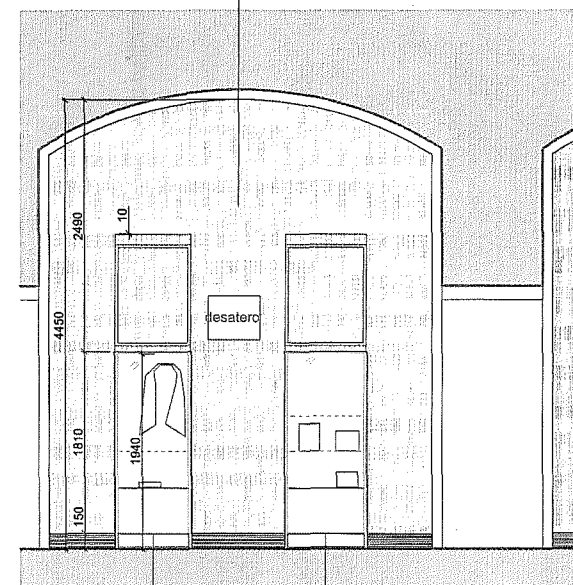

- mezuzah
- nůž na obřizku
- talit

- Paul Christian Kirchner,
Jüdisches Zeremoniel oder..
- fotografie třeblického gheta
- faksimile jednoho ze tří
svazků Židovské pozemkové
knihy
- obraz V. Nikodém, Židovské
město

POZN.:

KAŽDÝ DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYHOTOVENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A JEJÍ PŘEDÁNÍM KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA A ARCHITEKTOVI EXPOZICE K ODSOUHLASENÍ. SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.

PŘI STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ EXPOZICE, VČETNĚ INSTALACE EXPONÁTŮ.

M+T MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ PROJEKT STÁLÉ EXPOZICE	Stupeň PD: DZS		Název: panel 126 s vitrinami 129 a 318	
	Část: B - STAVBA EXPOZICE A INSTALAČNÍ CELKY		Paré:	
Projektant:	Měřítko: 1:50 a 1:25	Datum: 02/2013	Výkres.č.:	

ke sml. 8490/12 s. 646



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	RNDr. Marie Kružíková				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OPKŽU				
Počet vyhotovení:	2				
Adresát:	A.M.O.S. DESIGN s.r.o., Beethovenova 641/9, 602 00 Brno				
Smluvní částka: 1)	494289.60				
Odpovědný odbor: 2)	odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu				
Podpis zajistit do:	6.9.2013				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OKPPCR/Prokešová	4.9.2013	<i>[Signature]</i>
Projednáno s:	OKPPCR/Lisá	5.9.2013	<i>[Signature]</i>
Právní kontrola:	OKPPCR/Herzánová	5.9.2013	<i>[Signature]</i>
Předkládá:	OKPPCR/Prokešová	4.9.2013	<i>[Signature]</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OKPPCR/Lisá	5.9.2013	<i>[Signature]</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OKPPCR/Lisá	5.9.2013
	Správce rozpočtu:	OE/Zemanová	5.9.2013

Poznámka:

Subjekt (IČO: 63479982), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prokesova.a, datum ověření: 4.9.2013 07:31:14):

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - realizace a dodávka stálé expozice a veřejných interiérů.

Jedná se o akci realizovanou v rámci projektu "Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic" - CZ.1.11/2.1.00/08.01115.

Dodatek je uzavírán z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací a dodávek. Současně se v rámci tohoto dodatku zohledňují i méněpráce, které nebude zhotovitel provádět.

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysočina



KUJIP00X7QSS

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami

Kraj Vysočina

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmánem kraje
RNDr. Marie Kružíková, členka rady kraje
70890749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s. Jihlava
4200160699/6800

/dále jen „objednatel“/

a

A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Krajským soudem oddíl C, vl. 20782
se sídlem: Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. arch. Vladimírem Ambrozem, jednatelem
IČO: 63479982
DIČ: CZ63479982
bankovní spojení: KB Brno-venkov
č.ú.: 1118930267/0100

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Předmět dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2013 a dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2013 (dále jen „smlouva“) je provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původních prací a zdárné dokončení celého díla. Současně s rozšířením předmětu smlouvy o tyto dodatečné stavební práce a dodávky se v rámci tohoto dodatku zohledňují i méněpráce, které nebude zhotovitel provádět.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly v souladu s článkem XXV. odst. 7 smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění a doplňují některá ustanovení smlouvy takto:



1. Článek II. odst. 1. se mění takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených a specifikovaných v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a v dokumentaci zadání stavby pro změny č. Z1, Z9, Z10, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.

2. Článek IV. odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým článkem IV. odst. 1, který zní:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 36 219 347,80 Kč včetně DPH 21 % (slovy: třicet šest milionu dvě stě devatenáct tisíc třista čtyřicet sedm korun, 80/100 Kč) při splnění podmínek uvedených v tomto článku jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době vystavení daňového dokladu.

Cena díla po uzavření dodatku č. 2 a před uzavřením dodatku č. 3:

Cena celkem bez DPH:	29 631 301,55 Kč
DPH 15 %:	
DPH 21 %:	6 222 573,30 Kč
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH:	35 853 874,80 Kč

Cena víceprací dodatku č. 3:

Cena víceprací bez DPH:	408 503,80 Kč
DPH 15 %:	
DPH 21 %:	85 785,80 Kč
Cena víceprací včetně DPH:	494 289,60 Kč

Cena méněprací dodatku č. 3:

Cena méněprací bez DPH:	106 460,00 Kč
DPH 15 %:	
DPH 21 %:	22 356,60 Kč
Cena méněprací včetně DPH:	128 816,60 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 3:

Cena celkem bez DPH:	29 933 345,35 Kč
DPH 15 %:	
DPH 21 %:	6 286 002,50 Kč
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH:	36 219 347,80 Kč


II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání shora citované smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysočina

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li podepsán téhož dne, nabývá platnosti dnem podpisu později uvedeného.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 – Dokumentace zadání stavby – pro změny č. Z1, Z9, Z10


V Jihlavě dne - 9 -09- 2013

V Brně dne 10 -09- 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


RNDr. Marie Kružiková
členka rady kraje



Ing. arch. Vladimír Ambroz
jednatel společnosti
A.M.O.S. DESIGN s.r.o.



A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.
Beethovenova 641/9, 601 05 Brno
TEL. 542 212 898, 542 216 618
FAX 542 214 439, DIČ CZ6347998



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti




ROP
Jihovýchod


Kraj Vysočina



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysočina

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Stavba: Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč
Objekt: Zámek Třebíč

Pořad. číslo	označení	číslo místnosti	popis položky	vnější rozměry (mm)	technická poznámka	měrná jednotka	počet mj	cena bez DPH/mj	cena celkem bez DPH	DPH samostatně	cena celkem včetně DPH
Změna č. Z1 - Změna posuvného panelu 2 - položka C/20/051											
Změna č. Z1 - Méněpráce											
C/20	051	0.22	posuvný panel 2	rozměry celku (šxv): 1900x2700, rozměry otevíracího křídla: 1450x2350	sklo float tl. 8 mm na pomocné ocelové konstrukci s posuvnou otevíratelnou částí viz část C - skleněné konstrukce - výkres č. 19	ks	-1	44 890,00 Kč	-44 890,00 Kč	-9 426,90 Kč	-54 316,90 Kč
Změna č. Z1 - Méněpráce celkem:									-44 890,00 Kč	-9 426,90 Kč	-54 316,90 Kč
Změna č. Z1 - Vícepráce											
C/20	051	0.22	samonosný panel	1800x600x2970	sklo float tl. 8 mm, folie s grafikou, boky a záda zaklopeny DTD, nástřik RAL dle grafického řešení, roznášecí sokl - rám z Jackelů, opláštění MDF, lak černý RAL 9005 polomat	ks	1	44 890,00 Kč	44 890,00 Kč	9 426,90 Kč	54 316,90 Kč
Změna č. Z1 - Vícepráce celkem:									44 890,00 Kč	9 426,90 Kč	54 316,90 Kč
Změna č. Z2 - Instalační panel se soklem 1 - položka B/16/068											
Změna č. Z2 - Méněpráce											
B/16	068	0.22	instalační panel se soklem 1	panel: 1690x2370x18 sokl: 650x700x650	ocelová konstrukce soklu opláštěná MDF, na pozadí MDF panel	ks	-1	1 980,00 Kč	-1 980,00 Kč	-415,80 Kč	-2 395,80 Kč
Změna č. Z2 - Méněpráce celkem:									-1 980,00 Kč	-415,80 Kč	-2 395,80 Kč
Změna č. Z3 - Vitrinový panel 1 - položka B/22/063											
Změna č. Z3 - Méněpráce											
B/22	063	0.23	vitrinový panel 1	3540x3815(2235)x1580	nosná dřevěná konstrukce opláštěná 2x DTD a plastem tl. 5 mm (podklad pro grafiku), otvory pro vitríny	m ²	-1	5 491,00 Kč	-5 491,00 Kč	-1 153,11 Kč	-6 644,11 Kč
Změna č. Z3 - Méněpráce celkem:									-5 491,00 Kč	-1 153,11 Kč	-6 644,11 Kč
Změna č. Z4 - Šatní skříň otočná - prvek č. VEM 1.05/1 - zrušení led osvětlení											
Změna č. Z4 - Méněpráce											
VEM 1.05/1	1.05		šatní skříň otočná	1400x1975x600	tvarovaná konstrukce z kompaktního materiálu otočná, uzamykatelná	ks	-4	412,00 Kč	-1 648,00 Kč	-346,08 Kč	-1 994,08 Kč
Změna č. Z4 - Méněpráce celkem:									-1 648,00 Kč	-346,08 Kč	-1 994,08 Kč
Změna č. Z5 - Expoziční systém mobilní - prvek č. VOM 1.11/1 - zrušení podsvícení soklu											
Změna č. Z5 - Méněpráce											
VOM 1.11/1	1.11		expoziční systém mobilní	2000x2500x1000	panely vetknuté do roznášecích bází, báze jsou podsvícené	ks	-7	932,00 Kč	-6 524,00 Kč	-1 370,04 Kč	-7 894,04 Kč
Změna č. Z5 - Méněpráce celkem:									-6 524,00 Kč	-1 370,04 Kč	-7 894,04 Kč
Změna č. Z6 - Panelové vestavba - položka B/54/196 - opláštění historické obložkové zárubně											
Změna č. Z6 - Vícepráce											
B/54	196	2.20/2.27	panelová vestavba	4000x3200x2300	Dřevěná konstrukce opláštěná 2x DTD s patinovanou stěrkou na stěnách/s plastem tl. 5 mm (podklad pro grafiku), na podlaže 2x DTD a přírodní linoleum	ks	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	819,00 Kč	4 719,00 Kč
Změna č. Z6 - Vícepráce celkem:									3 900,00 Kč	819,00 Kč	4 719,00 Kč
Změna č. Z7 - Instalační panel s podstavci - položka B/30/109 - posunutí podstavců											
Změna č. Z7 - Vícepráce											
B/30	109	2.41	instalační panel s podstavci a vitríny	panel: 3995x4450, podstavec: 300x106x300	dřevěná konstrukce opláštěná 2x DTD povrch dýhovaný, tmelený, broušený, nátěr RAL, otvor pro vitríny	ks	2,0	1 180,00 Kč	2 360,00 Kč	495,60 Kč	2 855,60 Kč
Změna č. Z7 - Vícepráce celkem:									2 360,00 Kč	495,60 Kč	2 855,60 Kč
Změna č. Z8 - SDK příčka s bělinovým obkladem - položka B/94/288											
Změna č. Z8 - Vícepráce											
B/94	288	2.09	vložená dobová koupelna	původní výměra dle DZS 8725x1500	SDK panely s bělinovým obkladem, navýšení na skutečně provedenou plochu 33 m ² , navýšení o 19,9 m ² , vyztužení za umyvadlem	m ²	19,9	8 074,93 Kč	160 691,11 Kč	33 745,13 Kč	194 436,24 Kč
Změna č. Z8 - Vícepráce celkem:									160 691,11 Kč	33 745,13 Kč	194 436,24 Kč



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysočina

Změna č. Z9 - Infopanely Rajský dvůr

Změna č. Z9 - Vícepráce

		Rajský dvůr	Infopanel	600x1950	sklo alubond (float tl. 8 mm) kotvené k ocelové konstrukci, celoplošná grafika	ks	4,0	6 137,00 Kč	24 548,00 Kč	5 155,08 Kč	29 703,08 Kč
Změna č. 9 - Vícepráce celkem:									24 548,00 Kč	5 155,08 Kč	29 703,08 Kč

Změna č. Z10 - Sokl pod promítačku

Změna č. Z10 - Vícepráce

		2.14	Sokl pod promítačku	600x500x1200	kovová konstrukce opláštěná MDF	ks	1,0	31 485,00 Kč	31 485,00 Kč	6 611,85 Kč	38 096,85 Kč
Změna č. 10 - Vícepráce celkem:									31 485,00 Kč	6 611,85 Kč	38 096,85 Kč

Změna č. Z11 - Závěsy

Změna č. Z11 - Méněpráce

			Závěsy	celkem plocha dle DZS 306 m ²	úspora materiálu pro závěsy - skutečná plocha po zaměření = 281,70 m ²	m ²	-24,3	1 890,00 Kč	-45 927,00 Kč	-9 644,67 Kč	-55 571,67 Kč
Změna č. 11 - Méněpráce celkem:									-45 927,00 Kč	-9 644,67 Kč	-55 571,67 Kč

Změna č. Z11 - Vícepráce

VEM 1.10/3		1.10	Závěs na tyči	Dle DZS délka tyče 3500 mm, výška závěsu cca 3500 m, celkem plocha dle DZS 36,75 m ²	Textilie Interiérová, bavlna/polyester, barva šedo-bílo-béžová, tyč nerez; skutečná naměřená plocha závěsů 44,1 m ²	m ²	7,35	1 890,00 Kč	13 891,50 Kč	2 917,22 Kč	16 808,72 Kč
Změna č. 11 - Vícepráce celkem:									13 891,50 Kč	2 917,22 Kč	16 808,72 Kč
Změna č. 11 - Celkem:									-32 035,50 Kč	-6 727,46 Kč	-38 762,96 Kč

Změna č. Z12 - Zakrytí průhledů u podhledů

Změna č. Z12 - Vícepráce

B/56; B/59	137; 144	2.21	Podhled	8770x2565; 4300x2565	Zakrytí bočních průhledů a nová část stropu tvar do "U"	ks	1,0	31 304,22 Kč	31 304,22 Kč	6 573,89 Kč	37 878,11 Kč
B/56; B/59	137; 144	2.21	Podhled	8770x2565; 4300x2565	Zakrytí závěsů - spuštěný strop	ks	1,0	11 952,22 Kč	11 952,22 Kč	2 509,97 Kč	14 462,19 Kč
B/51	191	2.28	Podhled	2900x3900	Zakrytí závěsů - spuštěný strop	ks	1,0	7 456,42 Kč	7 456,42 Kč	1 565,85 Kč	9 022,27 Kč
B/42	151	2.31	Podhled	2950x2850	Zakrytí závěsů - spuštěný strop	ks	1,0	7 456,42 Kč	7 456,42 Kč	1 565,85 Kč	9 022,27 Kč
B/44	159	2.30	Podhled	3700x3600	Zakrytí závěsů - spuštěný strop	ks	1,0	7 456,42 Kč	7 456,42 Kč	1 565,85 Kč	9 022,27 Kč
B/46	172	2.29	Podhled	3700x5600	Zakrytí závěsů - spuštěný strop	ks	1,0	9 002,22 Kč	9 002,22 Kč	1 890,47 Kč	10 892,69 Kč
B/76	319	2.19	Podhled	7500x6300	Zakrytí závěsů - spuštěný strop	ks	1,0	10 890,22 Kč	10 890,22 Kč	2 286,95 Kč	13 177,17 Kč
Změna č. 12 - Vícepráce celkem:									85 518,14 Kč	17 958,81 Kč	103 476,95 Kč

Změna č. Z13 - Stínicí systém - skutečná spotřeba materiálu

Změna č. Z13 - Vícepráce

			Stínicí systém	skutečná celková zaměřená plocha = 217,71 m ²	celková plocha dle DZS = 203,6 m ²	m ²	14,1	1 955,00 Kč	27 585,05 Kč	5 792,86 Kč	33 377,91 Kč
Změna č. 13 - Vícepráce celkem:									27 585,05 Kč	5 792,86 Kč	33 377,91 Kč

Změna č. Z14 - Olověný plech pro podstavce pod náhrobky

Změna č. Z14 - Vícepráce

B/8	34	0.18	Podstavec pro náhrobky	2600x2350x520	nosná k-ce z ocelových profilů, opláštěná MDF a patinovaným olověným plechem - 1 ks	m ²	3,0	1 960,00 Kč	5 880,00 Kč	1 234,80 Kč	7 114,80 Kč
B/9	036, 037	0.19, 0.21	Podstavec pro náhrobky	1250x2350x520	nosná k-ce z ocelových profilů, opláštěná MDF a patinovaným olověným plechem - 2 ks	m ²	3,0	1 960,00 Kč	5 880,00 Kč	1 234,80 Kč	7 114,80 Kč
Změna č. 14 - Vícepráce celkem:									11 760,00 Kč	2 469,60 Kč	14 229,60 Kč


Změna č. Z15 - Revizní otvor pro přístup k elektroinstalaci

Změna č. Z15 - Vícepráce


B/39	133	2.34	Vitrína se soklem - vnitřní sokl	2200x800x550	MDF sokl, nosná k-ce dřevěné hranolky, broušený, tmelený, nástřik RAL - Vyřízení revizního otvoru pro přístup k elektroinstalaci vnitřní	ks	1,0	1 875,00 Kč	1 875,00 Kč	393,75 Kč	2 268,75 Kč
Změna č. 15 - Vícepráce celkem:									1 875,00 Kč	393,75 Kč	2 268,75 Kč

Méněpráce celkem:	-106 460,00 Kč	-22 356,60 Kč	-128 816,60 Kč
Vícepráce celkem:	408 503,80 Kč	85 785,80 Kč	494 289,60 Kč
	302 043,80 Kč	63 429,20 Kč	365 473,00 Kč

ŘEZ A

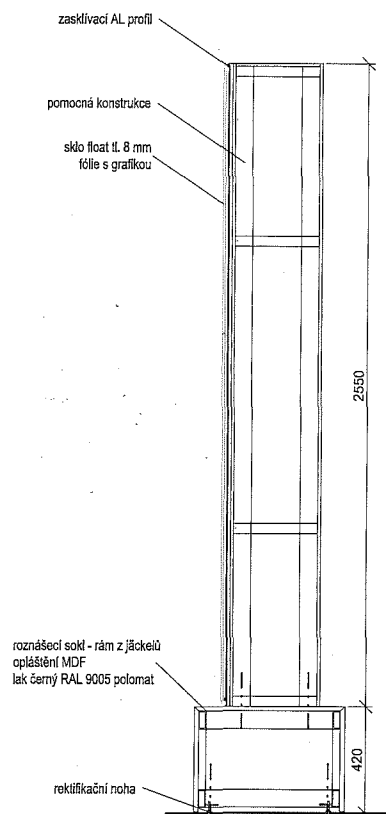


PŮDORYS

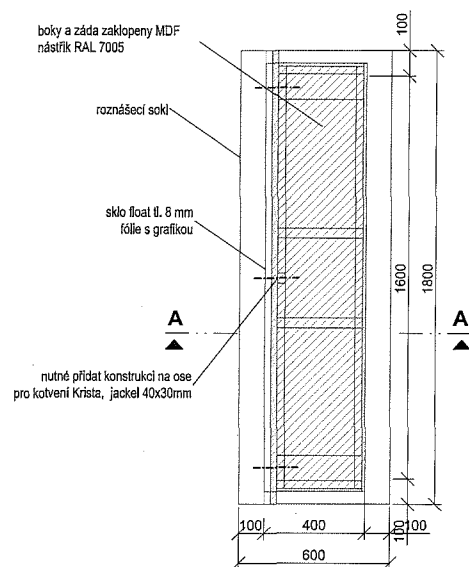

Při instalaci nutno posoudit stabilitu - varianta chemická kotva do spáry dlažby,
případně zadní kovová vzpěra

POHLED

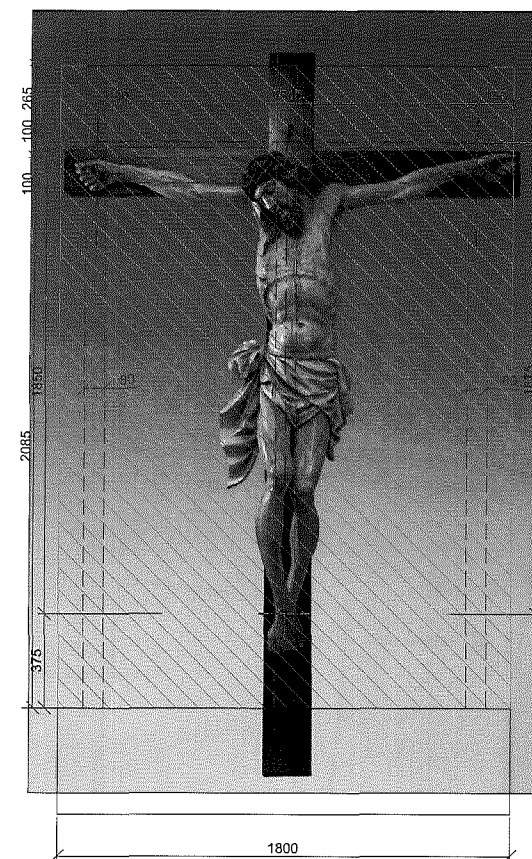


051 CD


POZN.:

KAŽDÝ DODAVATEL JE POVINEN OVĚRIT ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYHOTOVIT DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A JEJÍ PŘEDÁNÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA A
ARCHITEKTOVI EXPOZICE K ODSOUHLASENÍ. SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ , VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.

 MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ PROJEKT STÁLÉ EXPOZICE	Stupeň PD: DZS		Název: 051 - samonosný panel	
	Část: C - SKLENĚNÉ KONSTRUKCE			
Projektant:	Měřítko: 1:20	Datum: 08/2013	Paré:	Výkres.č.: 19

Venkovní poutač 1:20
čelní pohled

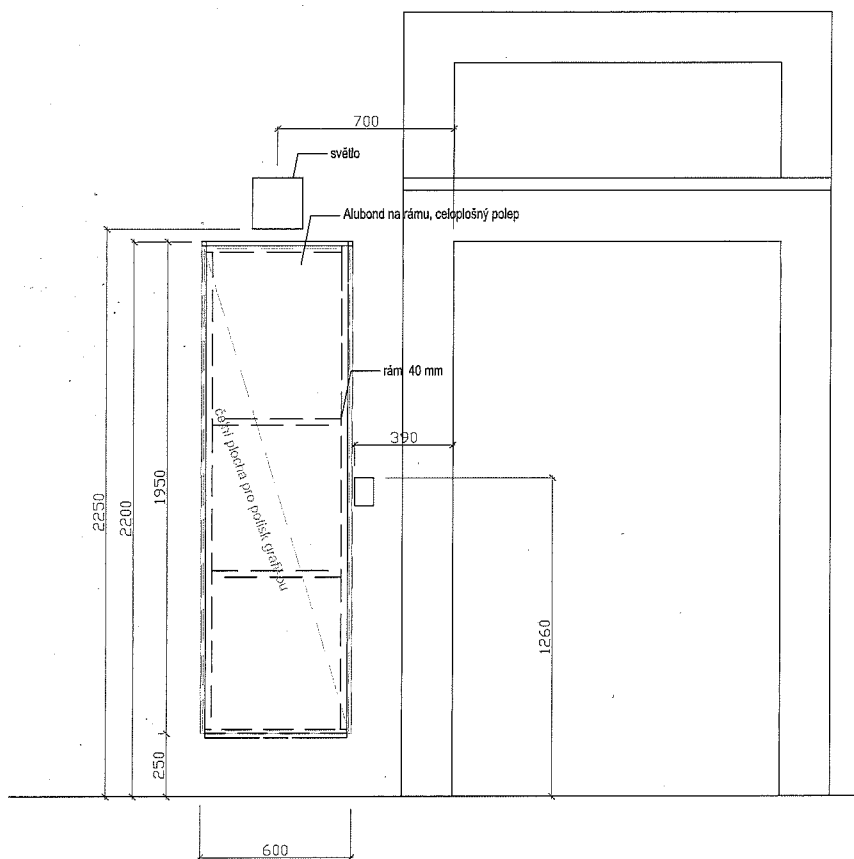

- Pozn.
- zavěšeno na Z profilu
- formát 1950x600x40 mm
- 3 kusy

Umístění - u vchodů po levé straně pod osvětlení


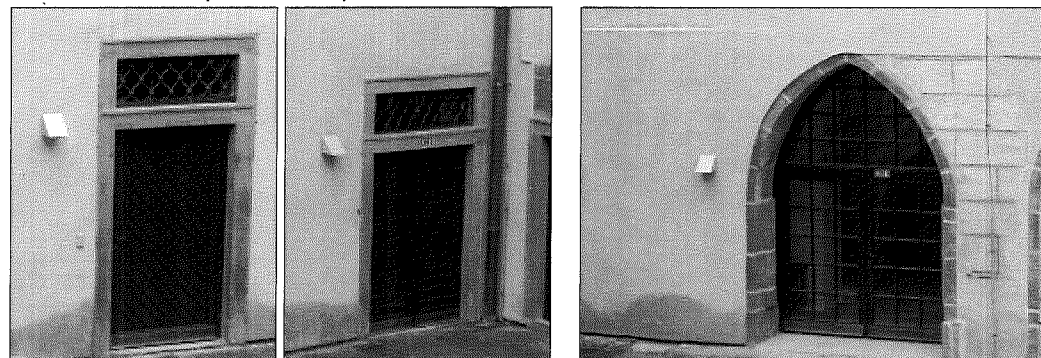



schéma umístění ve dvoře

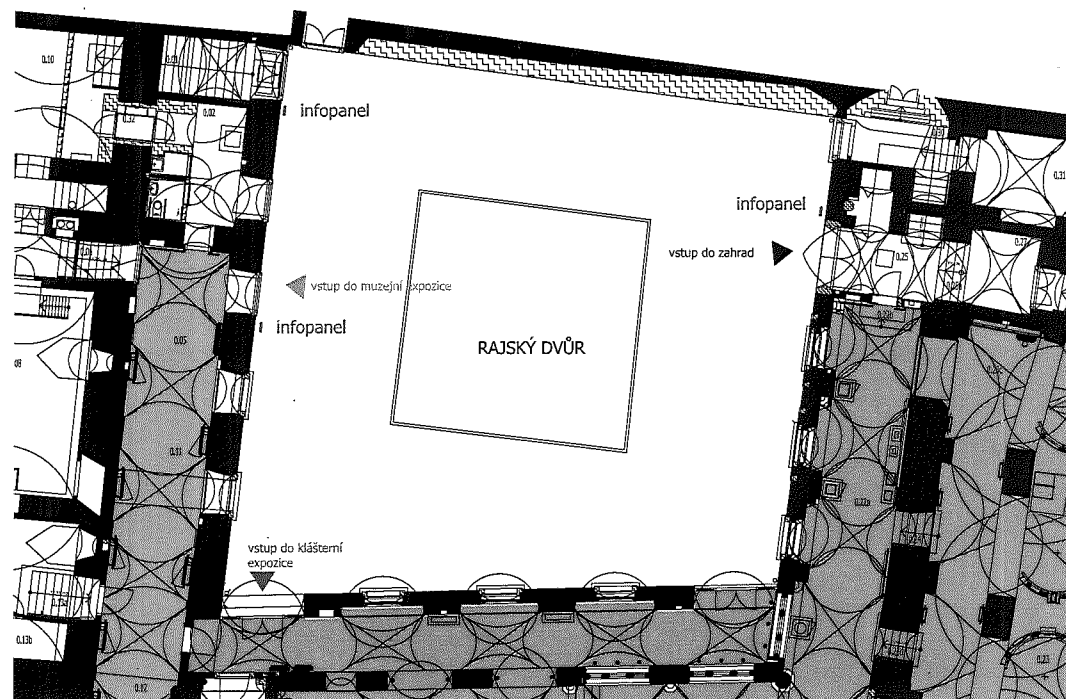


POZN.:
KAŽDÝ DODAVATEL JE POVINEN OVĚRIT ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYHOTOVENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A JEJÍ PŘEDÁNÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA A
ARCHITEKTOVI EXPOZICE K ODSOUHLASENÍ. SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.

MPT MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ PROJEKT STÁLÉ EXPOZICE	Stupeň PD: DZS		Název: xxx - venkovní poutač	
	Část:			
Projektant:	Měřítko: 1:20	Datum: 06/2013	Paré:	Výkres.č.: XX


pohled boční

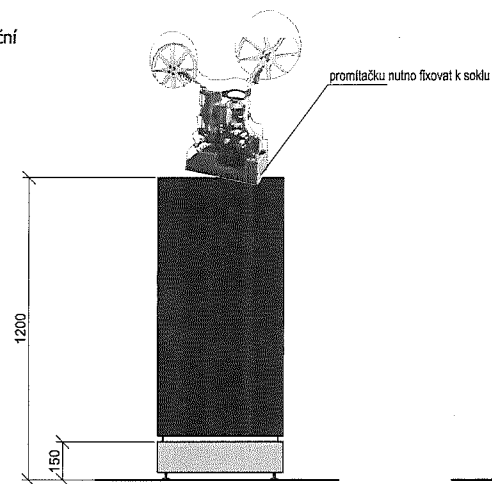


pohled přední

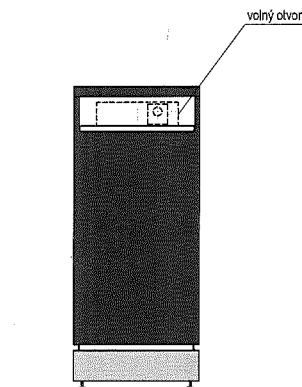


pohled zadní

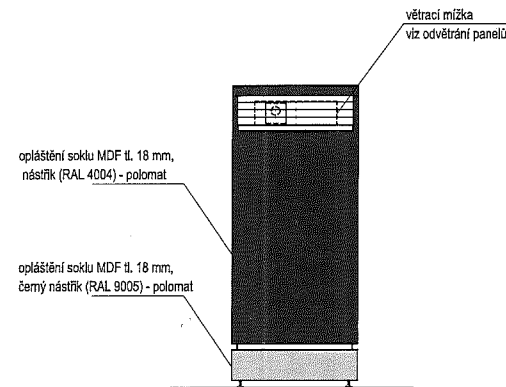

půdorys



řez



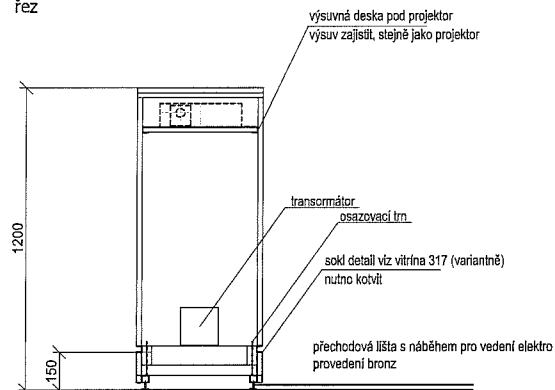






vzdálenost přední hrany soklu od projekční plochy 1775 mm
promítačka: OP 16 (rok výroby 1951), výrobce Meopta Přerov
digitální projektor: BENQ SP840

GL ARCHI TEKTI	MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ		VÝKRES	
	ZÁMECKÁ EXPOZICE		sokl pod promítačku	
	DATUM	MĚŘÍTKO	ČÍSLO MÍSTNOSTI	ČÍSLO VÝKRESU
	21/06/2013	1:20	2.14	

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OPKŽU				
Počet vyhotovení:	2				
Adresát:	A.M.O.S. DESIGN s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	446383.99				
Odpovědný odbor: 2)	odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu				
Podpis zajistit do:	bez prodlení				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		OKPPCR/Prokešová	27.9.2013	
Projednáno s:		OKPPCR/Lisá	27.9.2013	
Právní kontrola:		OKPPCR/Herzánová	27.9.2013	
Předkládá:		OKPPCR/Prokešová	27.9.2013	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		OKPPCR/Lisá	27.9.2013	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OKPPCR/Lisá	27.9.2013	
	Správce rozpočtu:	OE/Zemanová	27. 09. 2013	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 63479982), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prokesova.a, datum ověření: 26.9.2013 10:38:58):

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - realizace a dodávka stálé expozice a veřejných interiérů.

Jedná se o akci realizovanou v rámci projektu "Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic" - CZ.1.11/2.1.00/08.01115.

Dodatek je uzavírán z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací a dodávek. Současně se v rámci tohoto dodatku zohledňují i méněpráce, které nebude zhotovitel provádět.

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřený níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami

Kraj Vysočina

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
70890749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s. Jihlava
4200160699/6800

/dále jen „objednatel“/

a

A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Krajským soudem oddíl C, vl. 20782
se sídlem: Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. arch. Vladimírem Ambrozem, jednatelem
IČO: 63479982
DIČ: CZ63479982
bankovní spojení: KB Brno-venkov
č.ú: 1118930267/0100


/dále jen „zhotovitel“/

I.

Předmět dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2013, dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2013 a dodatku č. 3 ze dne 10. 9. 2013 (dále jen „smlouva“) je provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původních prací a zdárné dokončení celého díla. Současně s rozšířením předmětu smlouvy o tyto dodatečné stavební práce a dodávky se v rámci tohoto dodatku zohledňují i méněpráce, které nebude zhotovitel provádět.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly v souladu s článkem XXV. odst. 7 smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění a doplňují některá ustanovení smlouvy takto:



1. Článek II. odst. 1. se mění takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených a specifikovaných v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Článek IV. odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým článkem IV. odst. 1, který zní:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 36 268 297,60 včetně DPH 21 % (slovy: třicet šest milionu dvě stě šedesát osm tisíc dvě stě devadesát sedm korun, 60/100 Kč) při splnění podmínek uvedených v tomto článku jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době vystavení daňového dokladu.

Cena díla po uzavření dodatku č. 3 a před uzavřením dodatku č. 4:

Cena celkem bez DPH:	29 933 345,35 Kč
DPH 15 %:	
DPH 21 %:	6 286 002,50 Kč
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH:	36 219 347,80 Kč

Cena víceprací dodatku č. 4:

Cena víceprací bez DPH:	368 912,39 Kč
DPH 15 %:	
DPH 21 %:	77 471,60 Kč
Cena víceprací včetně DPH:	446 383,99 Kč

Cena méněprací dodatku č. 4:

Cena méněprací bez DPH:	328 458,00 Kč
DPH 15 %:	
DPH 21 %:	68 976,18 Kč
Cena méněprací včetně DPH:	397 434,18 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 4:

Cena celkem bez DPH:	29 973 799,74 Kč
DPH 15 %:	
DPH 21 %:	6 294 497,90 Kč
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH:	36 268 297,60 Kč


II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání shora citované smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysočina


2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li podepsán téhož dne, nabývá platnosti dnem podpisu později uvedeného.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

V Jihlavě dne 27-09-2013

V Brně dne 27-09-2013

Za objednatele:



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
10
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

Za zpracovatele


A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.
Beethovenova 641/9, 601 05 Brno
TEL.: 542 212 898, 542 216 618
FAX: 542 214 439, DIČ: CZ63479982
Ing. arch. Vladimír Ambroz
jednatel společnosti
A.M.O.S. DESIGN s.r.o.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod

Kraj Vysocina

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Položkový rozpočet změn z dodatku č. 3											
Stavba: Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč											
Objekt: Zámek Třebíč											
Pořad. číslo	označení	číslo místnosti	popis položky	vnější rozměry (mm)	technická poznámka	měrná jednotka	počet mj	cena bez DPH/mj	cena celkem bez DPH	DPH samostatně	cena celkem včetně DPH
Změna č. Z1 - Historizující tapety - snížení celkové nalepené plochy											
Změna č. Z1 - Méněpráce											
B/90	272,00	2.05	historizující tapety	rozvinutá délka 19200x4750 mm	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%, plocha dle DZS 88,2 m ²	m ²	-17,46	1 950,00	-34 047,00	-7 149,87	-41 196,87
B/91	278,00	2.06	historizující tapety	rozvinutá délka 17700x4750 mm	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%, plocha dle DZS 81,1 m ²	m ²	-15,78	1 950,00	-30 771,00	-6 461,91	-37 232,91
B/92	279,00	2.07	historizující tapety	rozvinutá délka 16700x4750 mm	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%, plocha dle DZS 76,5 m ²	m ²	-17,79	1 950,00	-34 690,50	-7 285,01	-41 975,51
B/93	284,00	2.08	historizující tapety	rozvinutá délka 20500x4750 mm	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%, plocha dle DZS 94,5 m ²	m ²	-18,89	1 950,00	-36 835,50	-7 735,46	-44 570,96
B/95	253,00	2.09	historizující tapety	rozvinutá délka 12700x4750 mm	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%, plocha dle DZS 60,1 m ²	m ²	-24,35	1 950,00	-47 482,50	-9 971,33	-57 453,83
B/96	292,00	2.11	historizující tapety	rozvinutá délka 20400x4750 mm	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%, plocha dle DZS 94 m ²	m ²	-20,39	1 950,00	-39 760,50	-8 349,71	-48 110,21
B/98	298,00	2.12	historizující tapety	rozvinutá délka 16100x4750 mm	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%, plocha dle DZS 73,5 m ²	m ²	-15,51	1 950,00	-30 244,50	-6 351,35	-36 595,85
B/100	302,00	2.13	historizující tapety	rozvinutá délka 18300x4750 mm	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%, plocha dle DZS 84 m ²	m ²	-19,40	1 950,00	-37 830,00	-7 944,30	-45 774,30
B/102	309,00	2.16	historizující tapety	rozvinutá délka 19200x4750 mm	do celkové plochy není zahrnut prořez tapet 5%, plocha dle DZS 88,2 m ²	m ²	-18,87	1 950,00	-36 796,50	-7 727,27	-44 523,77
							Změna č.1 - Méněpráce celkem:		-328 458,00	-68 976,18	-397 434,18
Změna č. Z2 - Polepy grafikou											
Změna č. Z2 - Vícepráce											
			velkoplošná grafika		Velkoformátový tisk ve fotokvalitě, folie lepená na plast tl. 5 mm	m ²	17,59	1 395,00	24 538,05	5 152,99	29 691,04
			polep bočnic		polep bočních částí panelů černou folií	m ²	15,54	351,00	5 454,54	1 145,45	6 599,99
			velkoplošná grafika		Velkoformátový tisk ve fotokvalitě, folie lepená na rubovou stranu skla	m ²	43,83	960,00	42 076,80	8 836,13	50 912,93
	063; 061; 055; 105		polep vitrín		Polep zadních stran vitrín pískovanou folií (proti odlesku zářivek)	ks	4,00	1 137,50	4 550,00	955,50	5 505,50
	055		plep zadních stran vitrín		Polep zadních vnějších částí zadních stran vitrín černou neprůsvitnou folií	kmplt	1,00	5 850,00	5 850,00	1 228,50	7 078,50
							Změna č. 2 - Vícepráce celkem:		82469,39	17318,57	99787,96
Změna č. Z3 - Polep skla vitríny č. 133											
Změna č. Z3 - Vícepráce											
C/28	133,00	2.34	vitrína se soklem	rozměry vitríny (šxvxh): 2400x2200x750 mm	polepení tří stěn vitríny translucentní fólií (boky a záda vitríny)	m ²	8,58	914,92	7 850,00	1 648,50	9 498,50
							Změna č. 3 - Vícepráce celkem:		7 850,00	1 648,50	9 498,50
Změna č. Z4 - Podstavce pod náhrobky											
Změna č. Z4 - Vícepráce											
B/9	036; 037	0.19	podstavec pro náhrobky	1250x2350x520 mm	Doplnění horního osvětlení atypickým stmívatelným LED svítidlem, včetně konstrukce o rozměru 25x480x920 mm	ks	2,00	12 181,00	24 362,00	5 116,02	29 478,02
B/8;B/9	034; 036; 037	0.18; 0.19	podstavec pro náhrobky	2600x2350x520 mm; 1250x2350x520 mm	Obložení soklové části okopovým plechem v barvě kovářské černí, plechy o rozměrech: 2600x420x150mm - 1 ks, 1250x420x150mm - 2 ks	kmplt	1,00	14 375,00	14 375,00	3 018,75	17 393,75
							Změna č. 4 - Vícepráce celkem:		38 737,00	8 134,77	46 871,77
Změna č. Z5 - Dokrytí mezer z boku panelů v chodbě 2.21											
Změna č. Z5 - Vícepráce											
B/55; B/58	139; 145	2.21	panely s grafikou	rozvinutá délka: 12600x3580 mm; 9400x3580 mm	Dokrytí mezer mezi panelů a stěnou v chodbě 2.21	ks	1,00	17 750,00	17 750,00	3 727,50	21 477,50
							Změna č. 5 - Vícepráce celkem:		17 750,00	3 727,50	21 477,50
Změna č. Z6 - Instalační doplňky											
Změna č. Z6 - Vícepráce											
B/106			Instalační doplňky		MDF podstavce, vyvýšovky, stojany na přílby, figuríny, speciální figuríny, stojan na šavle, stojánky na šperky	soubor	1,00	222 106,00	222 106,00	46 642,26	268 748,26
							Změna č. 6 - Vícepráce celkem:		222 106,00	46 642,26	268 748,26
							Méněpráce celkem:		-328 458,00 Kč	-68 976,18 Kč	-397 434,18 Kč
							Vícepráce celkem:		368 912,39 Kč	77 471,60 Kč	446 383,99 Kč
